

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
(PGAS)**

**PROYECTO
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA COLONIA LAS
BRISAS,
SOYAPANGO, SAN SALVADOR.**

COD. 11722

JUNIO 2023

Tabla de Contenidos

1.	Introducción.....	5
1.1.	Objetivo:.....	5
1.2.	Alcance	5
1.3.	Metodología aplicada:	6
2.	Marco Legal y Permisos	7
2.1.	Marco Legal.....	7
2.2.	Permisos y nivel de riesgo socio ambiental	12
3.	Evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.....	13
3.1.	Identificación de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales	13
3.4	Acciones y medidas ambientales y sociales a ser implementadas por el contratista	18
3.5	Procedimientos y Planes de Gestión.....	18
3.6	Acciones y medidas para la prevención, mitigación y/o compensación de los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales negativos generados por las actividades del proyecto	20
4	Mecanismos de comunicación para preocupaciones quejas, sugerencias y respuestas del proyecto y de los trabajadores	1
4.1	Mecanismo para las comunidades.....	1
4.2	Mecanismo para los Trabajadores.....	2
4.3	Medios de comunicación asociados al MAQR de MINEDUCYT y MOPT.....	3
4.4	Plazos de gestión de quejas y reclamos.....	4
5.	Arreglos de implementación.....	4
6.	Monitoreo y seguimiento	9
	ANEXOS	10
	Anexo 1 Análisis Ambiental y Social del Subproyecto	10
1.	Nombre y código del Centro Educativo	10
2.	Ubicación.....	10
2.1.	Descripción del Centro Educativo	11
2.2.	Necesidades del Centro Educativo.....	11
2.3.	Plano de ubicación de obras a intervenir	17
3.	Contexto ambiental y socioeconómico del Centro Educativo	18
3.1.	Aspectos Físicos	18
3.2.	Medio Socio-Económico	18

4.	Descripción del Proyecto	20
4.1.	Descripción de las Obras del Proyecto.....	20
4.2.	Inversión Estimada y Tiempos:	24
4.3.	Plano de las Obras de Mejoramiento	24
4.4.	Fichas de Evaluación Ambiental y Social.....	25
4.5.	Evaluación del Terreno	41
4.6.	Permisos y nivel de riesgo socio ambiental	41
4.7.	Utilización de recursos naturales durante la fase operacional.....	48
4.8.	Acciones y medidas para la recuperación de pasivos ambientales	48
4.9.	Reposición del Recurso Forestal	49
4.10.	Continuidad de las actividades educativas	49
4.11.	Procesos de participación de las partes interesadas.	49
	Anexo 2 – Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social	50
	Anexo 3 - Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT	59
	4 – Información complementaria de Consulta	71
1.	INTRODUCCIÓN.....	71
2.	OBJETIVO GENERAL.....	72
2.1.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	72
3.	METODOLOGÍA	72
3.1.	PARTICIPANTES IDENTIFICADOS PARA CONVOCATORIA A LA CONSULTA INFORMATIVA.....	72
3.2.	NIVEL DE PARTICIPACIÓN OBTENIDO	73
3.3.	Proceso de desarrollo de Consulta INFORMATIVA	74
3.3.1.	Palabras de bienvenida	74
3.3.2.	Propósito y desarrollo de la consulta informativa	74
3.3.3.	Exposición de las actividades que contempla el proyecto.....	74
3.3.4.	Espacio para preguntas.....	75
	LISTADO DE PARTICIPANTES A CONSULTA INFORMATIVA	77
	Anexo 5 – Plan de Reubicación Temporal.....	85
	Anexo 6 - Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista	91

Abreviaturas y Acrónimos:

ANDA	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
CASALCO	Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción.
CE	Centro Escolar.
CONAIPD	Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad.
DMR	Diseños arquitectónicos únicos como modelo de referencia
DNM	Dirección Nacional de Medicamentos.
EGPE	Estrategias de Gestión y Planes de Ejecución
EPI	Estudio de Pre-Inversión
EPP	Equipo de Protección Personal
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
LODT	Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MINEDUCYT	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
MPPI	Marco de Planificación para Pueblos Indígenas
MRI	Marco de Reasentamiento Involuntario
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social.
PGAS-C	Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista
PGMO	Procedimientos de Gestión de Mano de Obra
PNM	Política Nacional de las Mujeres
PNC	Policía Nacional Civil
PPPI	Plan de Participación de Partes Interesadas
SITRACOCS	Sindicato de Trabajadores de La Construcción y Conexos Salvadoreños.
UIP	Unidad de Implementación de Proyectos
UIE	Unidad de Infraestructura Educativa

1. Introducción

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) forma parte del Estudio de Pre-Inversión (EPI) que se ha desarrollado para el proyecto “Crecer y aprender juntos: Desarrollo integral de la primera infancia” (el Proyecto). El presente plan es necesario para aquellos subproyectos que tienen el potencial de generar riesgos e impactos ambientales y sociales en el medio ambiente, a la comunidad educativa y a la población aledaña al centro escolar durante la ejecución de las obras.

El componente 3 de dicho proyecto comprende la ejecución de obras de rehabilitación en los centros educativos, donde se construirán obras menores para garantizar los estándares de infraestructura educativa requeridos, requisitos esenciales y orientados a determinar las particularidades que los espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados óptimos en la formación de estudiantes y en la efectividad de la labor docente.

El proyecto beneficiara a centros educativos que cubren el nivel de atención de primera infancia.

El PGAS tiene por objeto el cumplimiento de la legislación ambiental nacional/regional y el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) desarrollado para el Proyecto para cumplir con la legislación nacional y los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial aplicables al Proyecto. Este PGAS contiene aspectos generales e información diagnóstica sobre características físico-naturales, ambientales y sociales del área de influencia del subproyecto, la identificación de los principales riesgos e impactos ambientales y sociales y una propuesta de las acciones y medidas de mitigación para dichos riesgos e impactos, así mismo se incluyen medidas para velar por la higiene y seguridad en la obra, para los trabajadores y la población circundante a las áreas de trabajo.

Adicionalmente, con este instrumento se gestionarán los respectivos permisos ambientales ante las autoridades competentes, en el caso que sea necesario.

1.1. Objetivo:

Determinar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, que generarán las actividades a desarrollarse en el subproyecto, en sus distintas etapas (diseño, construcción y operación), con el fin de identificar las acciones y medidas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos.

1.2. Alcance

El PGAS es aplicable a las obras de proyecto “Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador”. Este documento forma parte de los requisitos ambientales y sociales de los pliegos de licitación, y deberá ser utilizado por el contratista responsable de la ejecución de la obra para definir su PGAS de Contratista (PGAS-C). De la misma forma, la supervisión de las medidas incluidas en este documento formará parte del alcance del trabajo de la empresa de supervisión.

La preparación e implementación del PGAS-C será monitoreada y supervisada por el equipo de especialistas ambientales y sociales que conforman el personal de las empresas constructora y supervisora a través de los respectivos mecanismos establecidos en el proyecto, teniendo como base la

regulación ambiental nacional/regional, y los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto. De igual manera le darán seguimiento los especialistas ambiental y social que pertenecen tanto a la Unidad de Infraestructura Educativa (UIE) del Ministerio de Obras Públicas (MOPT), como a la Unidad de Implementación de Proyectos (UIP) del MINEDUCYT.

La elaboración de este PGAS se sustenta en la metodología desarrollado para los subproyectos del Proyecto, incluida en los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto publicados en la página web de MINEDUCYT¹, dichos Instrumentos incluyen: el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y su documento de Anexos, Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), el Marco de Reasentamiento Involuntario y los Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO). El término Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto hace referencia a estos documentos.

Para cada Centro Escolar (o subproyecto) a intervenir, en un estimado de 111 centros, el contratista deberá desarrollar todas las EGPE requeridas por este PGAS, incluyendo las que sean relevantes para la implementación del Plan de Reubicación Temporal (PRT). Las EGPE colectivamente componen el PGAS-C. El contratista será responsable de implementar el PGAS-C a lo largo de la obra. Por su vez, la empresa supervisora será responsable de verificar el cumplimiento y dar el visto bueno del PGAS-C preparado por el contratista. La Unidad de Infraestructura Educativa UIE – MOPT le dará seguimiento a la implementación de los PGAS-C durante la ejecución de obras, de igual manera la Dirección de Infraestructura y Ambiente Educativos (DIAE) y la Unidad de Implementación de Proyecto (UIP) del MINEDUCYT

1.3. Metodología aplicada:

El PGAS se desarrolló basado en la metodología señalada a continuación:

- ✓ Revisión de documentación secundaria desarrollada y actualizada para el proyecto, incluyendo los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto e información secundaria relacionada con el proyecto.
- ✓ Visita de campo para realizar proceso de consulta comunitaria y recopilación de información preliminar. En la reunión con la población se convoca en su mayoría a padres de familia, maestros y líderes comunales; además de la participación del equipo técnico del proyecto.
- ✓ Entrevista al personal encargado de la escuela, para la recopilación de información primaria de campo, con el fin de caracterizar los aspectos ambientales y sociales del sitio. Toma de fotografías y observación detallada de las principales limitantes del terreno.
- ✓ Aplicación de instrumentos internos para la recopilación de información preliminar: “Ficha socioambiental” del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), documento del proyecto y Plantilla del Plan de Reubicación Temporal.
- ✓ Aplicación de actas e instrumentos sociales como: Acta Social de la Asamblea de Información y Consulta, Acta de No Reubicación Temporal, Acta de Acuerdo Comunitario, Ficha de Evaluación

¹ Los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto se encuentran publicados en:
<https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/>

Ambiental y Social General, para implementación de medidas de gestión del riesgo y Carta de autorización para visitas a las comunidades.

- ✓ Recopilación de información general del municipio y de la zona de influencia para describir el sitio de proyecto. Se consultó documentación en línea sobre el municipio y áreas cercanas al centro escolar de interés para el estudio.
- ✓ Consulta con la autoridad ambiental nacional (MARN) sobre los requerimientos en cuanto a la legislación, basados en el alcance y magnitud de las obras a desarrollar, determinando su bajo nivel de riesgo socio ambiental.
- ✓ Elaboración de la evaluación ambiental requerida, incorporando la identificación de los impactos ambientales y sociales, negativos y positivos potenciales, directos e indirectos, que potencialmente generará el proyecto en sus distintas etapas.
- ✓ Propuesta de medidas de prevención, mitigación y/o compensación ambientales y sociales, para asegurar un adecuado manejo de los potenciales impactos negativos identificados para el subproyecto.
- ✓ Desarrollo del presupuesto estimado para la implementación de las medidas ambientales y sociales, así como la recuperación de pasivos ambientales en el caso que se requiera. Este presupuesto forma parte del presupuesto total de la obra.

2. Marco Legal y Permisos

2.1. Marco Legal

El Salvador cuenta con normativa que sirve de fundamento para llevar a cabo el subproyecto dentro del marco nacional de jurisprudencia. La legislación del país vigente procura el bienestar social y la conservación de los recursos naturales y patrimonio cultural. Así también, regula aspectos relacionados con la participación ciudadana y protección laboral. A continuación, en la siguiente **Tabla 1**, se describe el marco legal relevante aplicable a los subproyectos de infraestructura escolar en el marco del Proyecto:

Tabla 1: Resumen del marco legal aplicable a los subproyectos de infraestructura escolar

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA²	Esta Ley Primaria de la República de El Salvador se ha considerado porque determina la responsabilidad ambiental de todas las entidades nacionales e internacionales –privadas o públicas- con operaciones o intentando operar a través de empresas o proyectos en el país.
Ley del Medio Ambiente³	El Proyecto tiene un componente relacionado con infraestructura y modificación o mejora de los ambientes de aprendizaje. Esto implicará la periódica utilización de sustancias, la generación de residuos derivados de la construcción de obra física que podría afectar el medio ambiente, afectar la capa de ozono, a las personas de la comunidad, a los recursos naturales y a la sostenibilidad en el largo plazo. Esto obliga a considerar de manera significativa muchas de las

² Aprobada por Decreto Legislativo No. 38 de fecha 15 de diciembre 1983, publicada en el Diario Oficial No. 234, Tomo: 281 de fecha 16 de diciembre de 1983.

³ aprobada por Decreto legislativo Nº. 233 de fecha 2 de marzo 1998, publicada en el Diario oficial, Tomo Nº. 339, Número 79, de fecha 4 de mayo de 1998;

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
	<p>reglamentaciones específicas que aluden al manejo sanitario integral de los espacios, de los recursos, de los residuos; además, de asumir la exigencia de un código ético ambiental en el marco del proyecto. Este documento aún se encuentra en proceso de desarrollo.</p> <p>Esta Ley ha sido desarrollada en los Reglamentos siguientes: (i) Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente; (ii) Reglamento Especial de aguas residuales; (iii) Reglamento Especial sobre el control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. (iv) Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad Ambiental; (v) Reglamento Especial en materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos; (vi) Reglamento Especial sobre el manejo integral de los desechos sólidos; y (vii) Reglamento Especial para la Compensación Ambiental.</p>
Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres	Su objeto es prevenir, mitigar y atender en forma efectiva los desastres naturales y antrópicos en el país y además desplegar en su eventualidad, el servicio público de protección civil, el cual debe caracterizarse por su generalidad, obligatoriedad, continuidad y regularidad, para garantizar la vida e integridad física de las personas, así como la seguridad de los bienes privados y públicos.
Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (LODT)	Su objeto es desarrollar los principios Constitucionales relacionados con el ordenamiento y desarrollo territorial; establecer las disposiciones que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad que implementará la Ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación, programación, evaluación y de gestión territorial; así como, el régimen sancionatorio aplicable a la violación de sus disposiciones.
Ley de Urbanismo y Construcción	Su objeto es la formulación y dirección de la Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano; contiene las disposiciones de carácter general a que deben sujetarse las construcciones y acciones de rehabilitación de infraestructuras en todo el territorio de la República.
Ley de Desarrollo y Ordenamiento del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños.	<p>Esta Ley está desarrollada en el Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento del Área Metropolitana de San Salvador y Municipios Aledaños.</p> <p>Su objeto es regular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y rural del área metropolitana de San Salvador y los municipios aledaños, mediante el aprovechamiento de los recursos de las distintas zonas, y la plena utilización de los instrumentos de planeación.</p>
Ley Especial del Patrimonio Cultural	Esta Ley está desarrollada en el Reglamento de la Ley Especial del Patrimonio Cultural. En materia de construcción, rehabilitación, ampliación de edificaciones, también se aplica la legislación relacionada al Patrimonio Cultural; ésta es importante, pues algunos subproyectos pueden funcionar en inmuebles de valor patrimonial, en cuyo caso deben someterse a la normativa relacionada antes de su intervención, para protegerlo y conservarlo.
Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA	Su objeto es proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República de acueductos y alcantarillados, mediante la planificación, financiación, ejecución, operación, mantenimiento, administración y explotación de las obras necesarias y convenientes para la obtención de agua potable y su ulterior evacuación

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
Normas técnicas vinculantes relacionadas aplicables al proyecto	Norma Técnica de Accesibilidad Urbanística y Arquitectónica de Transporte y Comunicaciones. Institución Consejo Nacional de Atención Integral a la persona con discapacidad (CONAIPD) Norma Técnica Salvadoreña de Accesibilidad al medio físico. Urbanismo y Arquitectura. Requisitos. Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN). NTS 11.69.01:14
Normas Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillados de Aguas Negras	Estas Normas Técnicas están relacionadas con las disposiciones Generales Fundamentales contempladas en el Capítulo I de la Ley de Creación de la ANDA; ordenan un conjunto de requisitos que deben satisfacer los proyectos de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Negras, los puntos esenciales a incluir en su nivel de precisión, los valores de coeficientes y parámetros básicos, fórmulas, procesos de cálculo y diseño
Código de Salud	Su objeto es desarrollar los principios constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia social de los habitantes de la República y las normas para la organización funcionamiento y facultades del Consejo Superior de Salud Pública, entre otros.
Código Municipal	Con su aprobación los Municipios gozan formalmente de autonomía dentro de sus territorios. Esto les permite generar y gestionar su propio desarrollo social, económico y ambiental.
Reglamento especial sobre el manejo integral de los desechos sólidos y sus anexos	Objeto y Alcance Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el manejo de los desechos sólidos. El alcance del mismo será el manejo de desechos sólidos de origen domiciliario, comercial, de servicios o institucional; sean procedentes de la limpieza de áreas públicas, o industriales similares a domiciliarios, y de los sólidos sanitarios que no sean peligrosos. De aquí en adelante la Ley del Medio Ambiente será llamada La Ley y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio.
Guía manejo desechos sólidos vivienda	Uno de sus objetivos específicos es: Implementar estrategias educativas participativas que brinden alternativas de solución al manejo de los desechos sólidos.
Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia Decreto No. 431	El Proyecto utilizará este marco normativo para justificar su enfoque de atención a la niñez de primera infancia relativa a su educación integral y protección. La Ley CRECER JUNTOS tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de toda niña, niño y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se establece un Sistema Nacional de Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia con la participación de la familia, la sociedad y el Estado, fundamentado en la Constitución de la República y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en El Salvador, especialmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Decreto No. 391.	El Proyecto utilizará este marco para aplicar variados procesos no discriminatorios por la condición de género, entre ellos, la contratación de personal en las diferentes obras físicas, docentes, administrativas, etc. que se implicaren.

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
Ley Especial Integral Para Una Vida Libre De Violencia Para Las Mujeres (LEIV). Decreto No. 520.	<p>La presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad.</p>
Política Nacional de las Mujeres (PNM) (ISDEMU 29/06/2015)	<p>Es una política pública que orienta la igualdad real o sustantiva, con intervenciones temáticas y transversales orientadas a la solución de nudos críticos, que deben ser ejecutadas por las instancias competentes bajo la rectoría del ISDEMU.</p>
Ley General de Juventud Decreto No.910	<p>Artículo 2. Para los fines de la presente ley, se considera joven a la persona comprendida en el rango de edad de los 15 a los 29 años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión, discapacidad, situaciones de vulnerabilidad o cualquier otra condición particular. <i>Lo regulado en el inciso anterior no sustituye los límites establecidos en otras leyes, tratados o acuerdos internacionales ratificados por El Salvador, en los que se establecen garantías y responsabilidades civiles o penales y sistemas especiales de protección de derechos ciudadanos de la población comprendida en este rango de edad.</i></p>
Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Decreto No. 672	<p>El Proyecto asume este mandato y confirma su aplicación en procesos que garanticen la no discriminación por una condición de discapacidad. El Estado garantizará la eliminación de barreras que obstaculicen el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, asegurando los ajustes razonables y fomentando la implementación del diseño universal en todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como en las entidades de carácter privado.</p> <p>Adicionalmente, el Proyecto promoverá entre las entidades, empresas o corporaciones que le apoyen con servicios o bienes, el cumplimiento de esta normativa.</p>
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto No. 534	<p>La Ley de Acceso a la Información Pública de 2010 promueve el acceso a documentos, informes y presupuestos públicos por parte de la ciudadanía.</p> <p>La adecuada, oportuna y pertinente organización y manejo de la información pública que se va a generar a lo largo del Proyecto puede incidir de forma estratégica en la toma de decisiones de la gestión institucional, aumentando con ello, la probabilidad de certezas en los procesos a favor de las comunidades educativas y la niñez que pretende impactarse.</p>
Ley de Cultura Decreto No. 159 tomo 412 del 30/08/2016)	<p>Garantiza a los pueblos indígenas y a los grupos étnico-lingüísticos, el derecho a conservar enriquecer y difundir su cultura, identidad y su patrimonio cultural y a producir nuevos conocimientos a partir de sus sabidurías ancestrales y de los acervos contemporáneos (Art. 11). Se prohíbe toda forma de discriminación por motivos culturales (Art. 12). La ley reconoce como derechos culturales universales, indivisibles e independientes: la libertad de creación, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la historia y patrimonio cultural y el derecho a los saberes ancestrales, celebraciones y rituales. Respecto de los pueblos indígenas, el Capítulo III de la Ley (Artículos 27 al 34), indica que éstos tienen derecho individual y colectivo al disfrute pleno de los derechos humanos y las libertades</p>

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
	fundamentales reconocidas en la Constitución; indica la obligación del estado de adoptar políticas públicas orientadas al reconocimiento y visibilidad de los pueblos. Le reconoce el derecho a la práctica de sus tradiciones y a la no discriminación basada en su etnia, sexo, religión, costumbres, lengua, etc.
Código de Trabajo de la República de El Salvador. Decreto No. 15.	El Código tiene por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos, obligaciones y se funda en principios que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente en los establecidos en la Sección Segunda Capítulo II del Título II de la Constitución.
Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Decreto 486	Tiene por objeto establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo, sin perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad económica en particular.
4. Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Decreto 927.	Establece la regulación del Sistema de Ahorro para Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal, que en adelante se denominará el Sistema, el cual estará sujeto a la regulación, coordinación y control del Estado, de conformidad a las disposiciones de esta Ley. El Sistema comprende el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, mediante los cuales se administrarán los recursos destinados a pagar las prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados para cubrir los riesgos de Invalidez Común, Vejez y Muerte de acuerdo con esta Ley.
Ley del Seguro Social y sus Reglamentos - Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).	De acuerdo al Art. 186 de la Constitución se establece el Seguro Social obligatorio como una institución de Derecho Público, que realizará los fines de Seguridad Social que esta Asimismo, tendrá derecho a prestaciones por las causales a) y c) los beneficiarios de una pensión, y los familiares de los asegurados y de los pensionados que dependan económicamente de éstos, en la oportunidad, forma y condiciones que establezcan los Reglamentos.
Laudo Arbitral de El Salvador // Contrato Colectivo de Trabajo – Entre Sindicato de Trabajadores de La Construcción y Conexos Salvadoreños, SITRACOCS y La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASALCO.	<p>El Contrato Colectivo de Trabajo, se aplica en todo el territorio nacional en la construcción y obras, que por cualquier tipo de contrato tenga el patrono suscriptor de este y donde el sindicato tenga la titularidad, así también en proyectos del ámbito de la construcción en general.</p> <p>Es un mecanismo que tiene por objeto regular durante su vigencia, las condiciones que regirán los contratos individuales de trabajo de quienes laboran al servicio de las empresas constructoras en todo El Salvador; entre las regulaciones están: salarios, horarios, prestaciones, seguridad, indemnizaciones y otras. Así mismo, busca establecer los derechos y obligaciones de las partes contratantes, todo ello con el fin de armonizar y fortalecer las relaciones laborales entre los empresarios y sus trabajadores.</p>

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL	
Ley del Servicio Civil DECRETO No. 507 (Se retoma de la Guía sobre Derechos y Deberes Laborales de las Servidoras y Servidores Públicos)	Tiene por finalidad especial regular las relaciones del Estado y el Municipio con sus servidores públicos; garantizar la protección y estabilidad de éstos y la eficiencia de las Instituciones Públicas y organizar la carrera administrativa mediante la selección y promoción del personal sobre la base del mérito y la aptitud.
Ley De Adquisiciones Y Contrataciones De La Administración Pública. Decreto No. 868	La presente Ley tiene por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que deben celebrar las instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines; entendiéndose para los alcances y efectos de ésta, que la regulación comprende además los procesos enunciados en esta Ley.
Ley de Regulación del Teletrabajo. Decreto No. 600	Tiene por objeto: promover, armonizar, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las instituciones pública, privadas y autónomas, a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación.
Decreto No. 254 – Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.	El objeto de la presente ley es establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo, sin perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad económica en particular.

2.2. Permisos y nivel de riesgo socio ambiental

Los 111 centros educativos a ser beneficiados se han agrupado en tres paquetes y este modelo de PGAS se aplica al Paquete 1 lo cual consiste en el mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas, a ejecutar de acuerdo con normas y reglamentos de construcción. Para estas obras de mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas, no se requieren autorización previa, ya que pueden ser desarrollados bajo la responsabilidad de los propietarios de las obras, considerando lo siguiente:

- Son centros educativos con muchos años de estar en funcionamiento, cuyo uso actual del suelo se mantendrá.
- En su mayoría están ubicados dentro de áreas urbanas, delimitados en terrenos pequeños de poca área superficial y contruidos en prácticamente en su totalidad.
- Que las obras propuestas no serán de demolición de las edificaciones existente, excepto aquellas construcciones provisionales de materiales precarias en mal estado.
- Y cuando fuere necesario realizar alguna demolición, no deberá afectar la estabilidad del resto de las edificaciones o de construcciones aledañas.
- Las obras respetarán el alineamiento en lo relativo a acera, arriate, rodaje y zonas de retiro, en caso de intervenir las edificaciones existentes que se encuentran contiguo a vías de circulación.

- Que entre las obras mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas podrán intervenir: techo, tapias interiores y exteriores, fosas sépticas, cisternas, reparación de instalaciones de todo tipo, reparación de mampostería, recubrimientos, pisos, cielos, puertas, ventanas y todo elemento constructivo no estructural.
- En todo caso, el propietario del inmueble deberá notificar por escrito al municipio correspondiente, de la ejecución de las obras con una descripción de las mismas para el pago de los derechos municipales establecidos.

No obstante, para cada subproyecto se ingresará el Formulario Ambiental en la plataforma en línea del MARN tras lo cual se recibirá confirmación del nivel de riesgo ambiental del subproyecto y el tipo de documentación o evaluación ambiental a realizar a respecto. En el Anexo 1 (Análisis Ambiental y Social del Subproyecto) de este documento se identifican los permisos o autorizaciones específicas para el subproyecto relevante.

3. Evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales

3.1. Identificación de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales

Con la ejecución del Proyecto, se esperan lograr impactos positivos en la comunidad educativa de los Centros Escolares (CE's) y en la comunidad. Los CE's incluirán nuevos ambientes de aprendizaje modernos, accesibles, seguros, dotados de servicios de agua y saneamiento, incluyendo drenajes y canaletas para la evacuación de aguas lluvias para garantizar la evacuación de aguas lluvias, así como la remediación de pasivos ambientales donde los hubiera.

En general, las mejoras incorporadas en el diseño del CE podrán incluir sistemas para captación de lluvias en un tanque para suministro de agua al CE, la instalación de paneles solares y la siembra de vegetación en el centro. Además, podrán también incluir la instalación de trampa de grasa en la cocina, así como sistemas para el trato de aguas servidas (de ser necesario). Adicional a esto, las obras podrán ser fuente de empleo local en distintas especialidades, así como la prestación de servicios en función de la obra (ventas de comida temporal y otros servicios adicionales alrededor del subproyecto en su etapa de implementación). La información de las mejoras específicas para cada CE se incluye en el Anexo 1.

A continuación, en las **Tablas 2 y 3** se identifican los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales, generados por las distintas actividades a implementarse durante el desarrollo de cada una de las fases contempladas por los subproyectos de infraestructura educativa. Por su vez, en la **Tabla 4** se presentan las medidas para la prevención, mitigación o compensación de los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales identificados.

Tabla 2: Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales
1. Formulación y diseño	

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales
1.1 Gestión de permisos ambientales y sociales	1.1.1 Limitantes en la tramitación, aprobación y obtención de permisos ambientales u otros asociados
1.2 Incorporación de requisitos ambientales y sociales en los planes y Diseños de los subproyectos.	1.1.2 Falta de observancia o la no incorporación de los requisitos A&S en los diseños y planes de los subproyectos
2. Pre construcción	
2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra (Construcción de bodegas de materiales)	2.1.1 Tala de árboles
	2.1.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores
	2.1.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual
	2.1.4 Generación, remoción y disposición de desechos sólidos y líquidos
	2.1.5 Contaminación de suelo y agua por derrame e infiltración de sustancias peligrosas
	2.1.6 Accidentes viales del personal obrero y afectación a miembros de la comunidad durante el transporte de material y personal
	2.1.7 Incendio por el malo almacenamiento de material inflamable
	2.1.8 Afectación a Hallazgos Culturales Fortuitos
	2.1.9 Interrupción de servicios (agua y saneamiento, electricidad, comunicaciones (teléfono e internet),)
	2.1.10 Bloqueo temporal de accesos o cambios en los padrones de tráfico local
	2.1.11 Riesgos físicos para los estudiantes por las obras de construcción
2.2 Obras preliminares (preparación del terreno)	2.2.1 Tala de arboles
	2.2.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores
	2.2.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual
	2.2.4 Generación, remoción y disposición de desechos sólidos y líquidos
	2.2.5 Afectaciones a miembros de la comunidad
	2.2.6 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material y personal.
	2.3.1 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales
2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente	2.3.2 Generación, remoción, y disposición de escombros de desmontaje o demolición
	2.3.4 Presencia de pasivos ambientales que requieran aplicación de protocolo específico por la potencial presencia de materiales nocivos a la salud y al ambiente
	2.3.5 Acopio y traslado de materiales desmontados para reutilización
	2.3.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero
	2.3.7 Accidentes viales y afectación a miembros de la comunidad durante el transporte de material y personal.
	2.3.8 Afectación del patrimonio cultural/Daño o pérdida de elementos del patrimonio cultural/físico por desconocimiento sobre la gestión adecuada de hallazgos fortuitos realizados durante la realización de la obra.
3. Etapa de construcción	
3.1 Adquisición y suministro de material de construcción	3.1.1 Adquisición de material de construcción que no cuente con las medidas de certificación de sostenibilidad.
	3.1.2 Daño al suelo, vegetación y fauna asociada en el sitio usado como banco de material; y deslizamientos por taludes inestables generados por extracción de materiales como arena y grava
3.2 Movimiento de tierra	3.2.1 Posibles afectaciones estructurales a viviendas colindantes con la obra
	3.2.2 Emisiones de ruido, polvo, vibraciones e intrusión visual
	3.2.3 Erosión del suelo
	3.2.3 Emisión de partículas de polvo por el traslado y almacenamiento de materiales de construcción sin el uso de tapas / barreras que impidan la emisión de partículas de polvo
	3.2.4 Generación de material residual de excavación y movimiento de tierra
	3.2.5 Accidentes al personal obrero
	3.2.6 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material de excavación
	3.2.7 Estancamiento de agua pluvial y generación de vectores
3.3 Infraestructura vertical	3.3.1 Emisiones de ruido, polvo, vibraciones e intrusión visual
	3.3.2 Generación remoción y Disposición de desechos sólidos y líquidos

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales
(fundaciones, estructuras y acabados)	3.3.3 Generación de gases por soldadura, por pintura o aditivos
	3.3.4 Infiltración de residuos líquidos peligrosos, combustible, pintura o aditivos y contaminación del suelo y agua
	3.3.5 Estancamiento de agua pluvial y generación de vectores.
	3.3.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero
	3.3.7 Erosión del suelo por arrastre hídrico y sedimentación.
3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios	3.4.1 Emisiones de ruido, polvo y vibraciones
	3.4.2 Generación de desechos sólidos incluyendo los asociados a la limpieza de cisterna o equipo similar.
	3.4.3 Generación de desechos líquidos
	3.4.4 Contaminación del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de concreto y otros materiales
	3.4.5 Estancamiento de agua pluvial y generación de vectores
	3.4.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero (actividades en altura, excavaciones, actividades en espacios confinados, soldadura, entre otros)
3.5 Instalaciones Eléctricas	3.5.1 Emisiones de ruido, polvo y vibraciones
	3.5.2 Generación de desechos sólidos
	3.5.3 Accidentes del personal obrero (por la electricidad y trabajos en alturas)
3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.)	3.6.1 Emisiones de ruido y polvo
	3.6.2 Generación de desechos sólidos
	3.6.3 Generación de desechos líquidos
	3.6.4 Contaminación del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de concreto.
	3.6.5 Accidentes del personal obrero
4. ETAPA DE OPERACIÓN	
4.1 Funcionamiento del Centro Escolar	4.1.1 Contaminación de suelo y agua por vertido de desechos sólidos, líquidos y la generación de lixiviados

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales
	4.1.2 Incendios durante la operación de la cocina y bodega
	4.1.3 Accidentes por vicios ocultos y/o falta de mantenimiento de la infraestructura
	Herimientos a la comunidad educativa por mal almacenamiento de material (lena, pupitres, otros)
	Brote de enfermedad por falta de agua / malas prácticas de higiene en el centro escolar

Tabla 3: Potenciales Riesgos e Impactos Sociales

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Sociales
5. FORMULACIÓN Y DISEÑO	
5.1 Gestión de permisos	5.1.1 Limitantes en la tramitación, aprobación y obtención de permisos ambientales u otros asociados
5.2 Incorporación de requisitos ambientales y sociales en los planes y diseños de los subproyectos	5.2.1 Falta de observancia o la no incorporación de los requisitos A&S en los diseños y planes de los subproyectos
6. CONSTRUCCIÓN	
6.1 General durante la ejecución de la obra	6.1.1 Las obras físicas escolares (interna y externamente), no cuenten con un diseño adecuado de acceso universal (accesos, movilidad, comunicación, seguridad), que impiden el uso efectivo de los espacios al interior de la escuela o de los espacios donde se desarrollen los servicios.
	6.1.2 Emisiones de ruido, polvo e intrusión visual que resultan en molestia a los vecinos
	6.1.3 Falta de interés/poca participación de la comunidad en el proyecto/ poca participación de la mujer en cargos importantes dentro de las organizaciones
	6.1.4 Explotación, abuso y acoso sexual
	6.1.5 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material, desechos y personal
	6.1.6 Molestias y riesgo a la seguridad de la población en zonas cercanas al sitio de obra por obstrucción de entradas a domicilios y a la circulación; y por obstrucción de rutas de evacuación y de acceso a servicios de emergencia

Actividades	Potenciales Riesgos e Impactos Sociales
	6.1.7 Daño o pérdida de elementos del patrimonio cultural/físico por desconocimiento sobre la gestión adecuada de hallazgos fortuitos realizados durante la realización de la obra
	6.1.8 Potencial riesgo de enfermedades del personal obrero y comunidad educativa/vecina, incluyendo COVID-19
	6.1.9 Riesgos físicos para la comunidad educativa por las obras de construcción en los casos donde contratistas ingresan al CE antes de estar liberado
6.2 Presencia de personal de seguridad durante las obras	6.2.1 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad que consideren innecesaria y hasta atentatoria la participación de personas o empresas dedicadas a la seguridad de las obras.
	6.2.2 Posible interés de algunos miembros de la comunidad que forman parte de maras y pandillas en ser integrados a las labores de seguridad de la obra, aunque no estén certificados para ejercerla ni sea legal su incorporación.
	6.2.3 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad, ante el hecho de no otorgar opción preferencial en la contratación a gente de la comunidad donde se realizan las obras, primando criterios de existencia previa de competencias para realizar las tareas constructivas a requerir por cada subproyecto
6.3 Presencia de trabajadores provenientes de otras localidades durante la realización de las obras	6.3.1 Riesgos a la población de las comunidades aledañas a la obra Posibles muestras de molestia/descontento y hasta expresiones y acciones violentas de personas o entes de la comunidad que consideren una afrenta la incorporación de trabajadores de otras zonas geográficas. Estas agresiones o manifestaciones de violencia pueden suponerse dirigidas a quienes vinieran a trabajar y residen en otra zona de residencia.

3.4 Acciones y medidas ambientales y sociales a ser implementadas por el contratista

Conforme el contexto del centro educativo, el alcance de las obras propuestas, y la evaluación ambiental y social del subproyecto, se describen las medidas y acciones que serán responsabilidad del contratista. El contratista deberá tomar estos requisitos como base para el desarrollo de sus Estrategias de Gestión y Planes de Ejecución (EGPE) para gestionar los riesgos ambientales y sociales, que colectivamente conforman el Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C), conforme lo descrito en los Documentos de Licitación.

3.5 Procedimientos y Planes de Gestión

A continuación, se presenta un resumen de los Planes y Procedimientos que deberá preparar el contratista como parte de estos requisitos. Estos planes deberán incluir como mínimo las medidas descritas en esta sección del documento, y deberán tomar como referencia el contenido del documento de Anexos al MGAS del Proyecto, el cual contiene recomendaciones específicas para su desarrollo.⁴

⁴ Este documento se puede encontrar en: <https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/>

1. Procedimientos de Ruido y Vibraciones
2. Procedimientos de Hallazgos Culturales Fortuitos
3. Plan de Tala y Reforestación
4. Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular
5. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos
6. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos
7. Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular
8. Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria
9. Procedimientos de Calidad de Aire
10. Plan de Gestión de Fuerzas de Seguridad
11. Estrategia de Consulta con Partes Interesadas
12. Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencias
13. Plan de Gestión Laboral
14. Plan de Manejo y Protección de Materiales y Equipos de construcción
15. Plan de Capacitación Ambiental y Social

3.6 Acciones y medidas para la prevención, mitigación y/o compensación de los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales negativos generados por las actividades del proyecto

A continuación, se presentan los principales riesgos e impactos ambientales y sociales identificados durante la evaluación genérica de subproyectos llevada a cabo por MINEDUCYT y los planes que el contratista deberá preparar como parte de su PGAS-C, conforme los documentos de licitación, para abordar dichos riesgos e impactos. Estos planes deberán incluir como mínimo las medidas descritas en la **Tabla 4**, así como los mecanismos para verificar su cumplimiento, y deberán incluir los elementos que sean relevantes del documento de Anexos al MGAS del Proyecto, el cual contiene propuestas genéricas para cada uno de los planteamientos⁵.

El Cuadro 4 se ha desarrollado para exponer 4 etapas de los subproyectos:

1. Formulación y diseño
2. Pre-construcción
3. Construcción
4. Operación y Mantenimiento

Tabla 4: Medidas para la prevención, mitigación o compensación de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
Aspectos Generales	
1.1.1 Limitantes en la tramitación, aprobación y obtención de permisos ambientales u otros asociados.	<p>En la etapa 1 Formulación y Diseño se resaltan estas actividades:</p> <p>1.1 Gestión de permisos A&S y 1.2 Incorporación de requisitos ambientales y sociales en los planes y diseños de los subproyectos y 1.1.3 Mal diseño de las obras</p> <ul style="list-style-type: none">• Se garantizará la tramitación y aprobación de cada uno de los permisos necesarios para el éxito de la obra.

⁵ Este documento se puede encontrar en: <https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
1.1.2 Falta de observancia o la no incorporación de los requisitos A&S en los diseños y planes de los subproyectos.	<ul style="list-style-type: none"> Se promoverá que, en adelante, las obras de infraestructura para el sistema educativo se diseñen y construyan considerando las especificaciones técnicas de accesibilidad universal, inclusión, condiciones de bioseguridad, agua potable y saneamiento entre otros.
1.1.3 Las obras físicas escolares (interna y externamente), no cuenten con un diseño adecuado de acceso universal (accesos, movilidad, comunicación, seguridad), que impiden el uso efectivo de los espacios al interior de la escuela o de los espacios donde se desarrollen los servicios.	Se promoverá la gestión escolar para coadyuvar al mantenimiento del orden y aseo del centro educativo.
1. Procedimiento de Gestión de Ruido y Vibraciones	
2.1.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual.	<p>Cada una de las etapas de construcción contempla actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operación.</p> <p>✓</p> <p>En la etapa de pre - construcción se presentan las siguientes actividades:</p> <p>✓ <u>2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra, 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno) y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente.</u></p> <p>En la etapa de Construcción:</p>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>✓ <u>3.2 Movimiento de tierra 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios, 3.5 Instalaciones Eléctricas, 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.).</u></p> <p>En la etapa de Operación:</p> <p>✓ N/A</p> <p><u>Las medidas de mitigación para los procedimientos de gestión de ruidos y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Previo a la ejecución de la obra se deben inspeccionar los lugares de trabajo, máquinas y equipos para evitar emisiones y accidentes. • Desarrollar y aplicar los protocolos de emergencia y riesgos dirigidos hacia la comunidad y a los trabajadores de las obras. Esto implica equipar adecuadamente al personal y proteger las distintas áreas o espacios utilizados por la obra en proceso. • Implementación de medidas de control del ruido en origen (usando equipos con niveles más bajos de potencia acústica, instalando silenciadores en los ventiladores y que sean apropiados en los escapes de los motores y en los componentes del compresor. • Limitar las horas de funcionamiento de determinadas partes específicas de los equipos u operaciones, especialmente las fuentes móviles que funcionan a través de zonas comunitarias • Evitar que los niveles de ruido generados por la obra excedan los límites establecidos en la legislación aplicable y programar horarios para la realización de actividades generadoras de ruido (por ejemplo, entre 7:00 am y las 6:00 pm o en horarios acordados con la comunidad, si en caso el horario se extienda se informara a la comunidad). • Colocar señales preventivas y delimitar el área de trabajo. • Humedecer el suelo, según las especificaciones técnicas. • Cubrir con plástico el material particulado (tierra, arena) para evitar su dispersión por el viento.
2. Procedimiento de Hallazgos Culturales Fortuitos	
2.3.8 Afectación del patrimonio cultural/Daño o pérdida de elementos	<p>En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante etapa de Formulación y Diseño y la de operación.</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
<p>del patrimonio cultural/físico por desconocimiento sobre la gestión adecuada de hallazgos fortuitos realizados durante la realización de la obra.</p>	<p>✓ 2.3 Construcción de Bodega de materiales</p> <p>En la etapa de construcción se presenta la siguiente actividad:</p> <p>3.2 <u>Movimiento de tierra</u></p> <p>Operación:</p> <p>N/A</p> <p><u>Las medidas de mitigación para los procedimientos de Hallazgos Culturales y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <p><u>Procedimiento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar un Procedimiento de hallazgos culturales fortuitos con base en el modelo incluido en el anexo al MGAS del Proyecto. • Previo a la ejecución de las obras el constructor debe brindar capacitación al personal sobre las medidas detalladas en el plan y su aplicación en el caso de hallazgos fortuitos. • De encontrarse restos arqueológicos o bienes en el sitio se debe dar parte a las autoridades correspondientes, de acuerdo con la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, siguiendo los Procedimientos de hallazgos culturales fortuitos, desarrollados para el proyecto. • No remover ni eliminar ningún objeto encontrado o descubierto. Suspender los trabajos en la zona en particular hasta la visita de las autoridades correspondientes. • Cumplir con lo establecido en la Ley del patrimonio Arqueológico • Capacitar y supervisar al personal para el cumplimiento de los Procedimientos de hallazgos culturales fortuitos.
<p>3. Plan de Tala y Reforestación</p>	
<p>2.1.1 y 2.2.1 Tala de árboles.</p>	<p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno).</p> <p>En la etapa de construcción:</p> <p>N/A</p> <p>Operación:</p> <p>N/A</p>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p><u>Las medidas de mitigación para Plan de Tala y Reforestación y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con las autorizaciones establecidas en la legislación aplicable para la tala de árboles. • Reforestar como medida de compensación de acuerdo a lo establecido a las autorizaciones correspondientes o según sea el detalle, de acuerdo Guía Metodológica para el análisis, calculo y cumplimiento de compensación emitidas por el MARN • Asegurar el éxito de la reforestación, desarrollando planes de mantenimiento de la vegetación reforestada (riego, abono, protección, reemplazo de individuos muertos, etc.), por al menos dos años. • Si en caso no exista espacio para la compensación, se realizará a través de terceros autorizados por el MARN, según legislación Ambiental.
4. Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular	
<p>2.1 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material (excavación) y personal.</p>	<p>Aplica en las etapas de pre construcción y construcción:</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno).</p> <p>En la etapa de construcción:</p> <p>✓ 3.2 Movimiento de tierra</p> <p>Operación:</p> <p>N/A</p> <p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar y aplicar un Procedimiento de Gestión de Tráfico Vehicular, que incluya indicaciones sobre la velocidad dentro de la obra y en sus áreas de influencia directa e indirecta. Capacitar y supervisar a los trabajadores para su aplicación. • Señalizar las zonas de circulación para vehículos participantes en la obra y difundir aquellas externas al proyecto y autorizadas por las autoridades correspondientes. • Supervisar y capacitar a los trabajadores para el control de tráfico de maquinaria pesada. • Evitar superar la capacidad carga (tanto de material como de trabajadores que son trasladados del plantel - al CE - Plantel) con el fin de evitar cualquier tipo de accidente. • Estacionar los vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa contratista o de entidades vinculadas al proyecto en áreas que no representen obstrucción en las rutas de evacuación y vías de circulación del área de influencia directa. • Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicación del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	Realizar charlas sobre seguridad vial con los vecinos del centro escolar y monitorear los vehículos del contratista y demás proveedores de servicios del proyecto
2.2 Molestias y riesgo a la seguridad de la población en zonas cercanas al sitio de obra por obstrucción de entradas a domicilios y a la circulación; y por obstrucción de rutas de evacuación y de acceso a servicios de emergencia	<p>Son riesgos generales y aplican únicamente durante la construcción de las obras</p> <p>Las medidas de mitigación y que son de estricto cumplimiento dentro de esta línea son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resguardar de vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa contratista en las instalaciones provisionales o sitio de almacenamiento de materiales. Estacionar los vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa contratista o de entidades vinculadas al proyecto en áreas que no representen obstrucción en las rutas de evacuación y vías de circulación del área de influencia directa. <p>Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicación del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular.</p>
5. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos	
2.1.4 Generación y remoción de desechos sólidos.	Estos riesgos aplican a la tabla 2 (potenciales riesgos de impactos ambientales que se generan en las distintas actividades a desarrollarse en las distintas etapas). En cada una de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operación.
2..3.2 Generación y remoción de escombros de demolición que podrían incluir materiales nocivos a la salud y al ambiente y. Generación y remoción de material desmontado.	<p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ <u>2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra, 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente,</u></p> <p>En la etapa de construcción:</p> <p>✓ <u>3.2 Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical, (fundaciones, estructuras y acabados), 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas, Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios. 3.5 Instalaciones Eléctricas, 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.)</u></p>
3.2.4 Generación de material residual de excavación y movimiento de tierra.	<p><u>Operación:</u></p> <p>N/A</p>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
<p>3.3.1 - 3.4.2 - 3.5.2 – 3.6.2 Generación de Desechos Sólidos (en las 3 actividades se define de igual forma el riesgo).</p> <p>3.5 Instalaciones eléctricas</p> <p>3.6.4 Contaminación del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de concreto.</p>	<p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral que incluya aspectos de disposición final de residuos sólidos comunes, residuos de construcción que puedan contener materiales peligrosos (incluyendo asbestos, pintura, disolventes). • Incluir en el procedimiento la prohibición de quemar los desechos y residuos dentro o fuera de la obra. • Capacitar al personal para su aplicación, proporcionar el equipo de protección personal necesario y supervisar el cumplimiento del procedimiento. • Colocar en la obra, recipientes adecuados y señalados para el depósito de residuos comunes y residuos de construcción. • Asignar áreas especiales para escombros, con delimitación y señalización. Gestionar y almacenar temporalmente de forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que contienen materiales peligrosos (como asbestos o hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el medio ambiente ni para la salud y seguridad de los trabajadores. • Segregar desde su generación, clasificándolos de manera segura, utilizando el equipo de protección personal necesario, recolectar y almacenar en sitios designados y adaptados para residuos, dentro de la obra, hasta ser transportados para su disposición final en sitios autorizados. • Gestionar y almacenar temporalmente de forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que contienen materiales peligrosos (como asbestos o hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el medio ambiente ni para la salud, seguridad de los trabajadores y comunidades vecinas. • Gestionar y obtener los permisos y autorizaciones necesarias para el manejo y disposición final de los escombros, otorgados por la Alcaldía para este tipo de residuos. • Usar siempre las tapas de los contenedores y almacenar los residuos por un período no mayor a tres días para evitar o reducir la presencia de vectores y patógenos como roedores e insectos, que puedan generar riesgos a la salud humana. • Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldía y el MARN, para la disposición final de los residuos comunes e infecciosos. Solo se pueden utilizar sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua. • Utilizar vehículos de transporte que cumplan con lo establecido según MARN. A la hora del traslado de material de desechos y escombros se debe usar obligatoriamente carpas que eviten la dispersión de los mismos.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisar a los transportadores y participantes en la obra en toda la temática. • Capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos y del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular.
3.2.4 Generación de material residual de excavación y movimiento de tierra.	<p><u>Sumado a todo lo anterior, de manera complementaría también se tiene que cumplir con lo siguiente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldía y el MARN, para la disposición final del material residual de excavación y utilizar solamente sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua. • Trasladar material residual de excavación usando carpas que eviten la dispersión de los mismos. • Supervisar a los transportadores y participantes en la obra y capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos y del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular. • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral que incluya aspectos de disposición final de residuos de material de excavación; capacitar al personal participante en la obra para su aplicación y proporcionar el equipo de protección personal necesario. • Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldía y el MARN, para la disposición final del material residual de excavación y utilizar solamente sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua. •
3.2.4 Daño al suelo, vegetación y fauna asociada en el sitio usado como banco de material. Probabilidad de deslizamientos por taludes inestables generados por extracción de materiales como arena y grava. Alteración de la dinámica hidrológica de ríos utilizados como bancos de material sin autorización.	<ul style="list-style-type: none"> • Todo el material que sea necesario para la construcción deberá contar con la certificaciones y permisos que avalen que son sostenibles. • Utilizar únicamente materiales provenientes de bancos de extracción autorizados y conservar los comprobantes correspondientes
3.4.2 Generación de	<ul style="list-style-type: none"> • Recolección, traslado y disposición de los desechos, en el sitio acordado con la comunidad y Alcaldía Municipal.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
material residual de excavación y desechos sólidos de la limpieza de la cisterna.	
6. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos	
2.1.4 – 2.2.4- 3-3.2 Generación remoción y Disposición de desechos sólidos y líquidos.	<p>En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo:</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ <u>2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno).</u></p> <p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. • Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre. • Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este servicio en cuanto haya presencia de trabajadores en el sitio, • De haber conexión, asegurarse que el contratista tenga servicio de agua potable y que se mantenga la conexión a la red sanitaria. • Eliminar el agua de desechos de construcción a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible). Colocar contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolación de fluidos. • Aplicar el procedimiento de atención y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames / vertidos para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua. • Supervisar y capacitar a los trabajadores para la aplicación del procedimiento de gestión integral de residuos líquidos.
<p>En la etapa de construcción:</p> <p>✓ 3.2 Movimiento de tierra, <u>3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios. 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.)</u></p>	
3.2.7 Estancamiento de	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar drenajes temporales para evitar estancamientos en zonas de circulación y otras obras exteriores.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
agua pluvial y generación de vectores.	<ul style="list-style-type: none"> • Canalización de aguas lluvias hacia cunetas de vías, cajas tragante, pozos de absorción o hacia quebradas o ríos previo estudio hidrológico, para prevenir enfermedades, evitar estancamientos en zonas de circulación y otras obras exteriores. • Limpieza periódica de las zonas de circulación y otras obras externas para evitar o desalojar obstrucciones con hojas o desechos que propician encharcamientos. • Desarrollo y aplicación de un plan de seguridad de la obra que incluya procedimientos específicos para protección de excavaciones para evitar estancamiento o inundaciones y para promover la evacuación de agua. • Planificar las actividades de la obra y anticipar efectos nocivos como los encharcamientos y la proliferación de vectores que suele estar asociada.
3.3.7 Erosión del suelo por arrastre hídrico, estancamiento de aguas pluviales y sedimentación.	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar drenajes temporales que faciliten la canalización y achicamiento de escorrentías para prevenir enfermedades, evitar estancamientos en zonas de circulación y otras obras exteriores. • Instalar un sistema de drenaje provisional que evite la inundación del sitio y por otro lado evite la inundación de lotes vecinos aguas abajo del proyecto y contaminación de ríos o cualquier fuente de agua superficial. • Las aguas de escorrentía deben quedarse en el predio de la obra, se debe controlar el vertido con la construcción de barreras para retención, cunetas, trampas de sedimentación u otras soluciones antes de su descarga. • Limpieza periódica de las zonas de circulación y otras obras externas para evitar o desalojar obstrucciones con hojas o desechos que propician encharcamientos. • Desarrollo y aplicación de un plan de seguridad de la obra que incluya procedimientos específicos para protección de excavaciones para evitar inundaciones y la evacuación de agua en excavaciones como medida de seguridad para los trabajadores.
3.4.3 y 3.6.3 Generación de desechos líquidos	<p><u>Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. • Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre. • Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este servicio en cuanto haya presencia de trabajadores en el sitio. • De haber conexión, asegurarse que el contratista tenga servicio de agua potable y que se mantenga la conexión a la red sanitaria. • Eliminar el agua de desechos de construcción a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible). Colocar contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolación de fluidos.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<ul style="list-style-type: none"> Evitar la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, mezcla de concreto, combustibles y grasas en ríos o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán ser envasados y eliminados en el sitio autorizado para este fin. Aplicar el procedimiento de atención y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames / vertidos para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua.
Operación: En la etapa de operación se presenta en las siguientes actividades: 4.1 Funcionamiento del Centro Escolar.	
4.1.1 Contaminación de suelo y agua por vertido de desechos sólidos, líquidos y la generación de lixiviados.	Manejo adecuado de los desechos dentro del centro escolar con apoyo estudiantil y comunitario. Se recomienda seguir las recomendaciones del Manual Nueva Escuela MINEDUCYT.
7. Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria	
<p>2.1.6 - 2.2.6 – 2.3.6, 3-3.6 - 3.4.6 - 3.5.3 y 3.6.5</p> <p>Accidentes y enfermedades del personal obrero:</p> <p>✓ actividades en altura, excavaciones, actividades en espacios confinados).</p> <p>✓ Exposición a la electricidad y trabajos en alturas)</p>	<p>En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operación.</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p>✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra (construcción de bodega), y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente</p> <p>En la etapa de construcción:</p> <p>3.2 Movimiento de tierra, 3.3 infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios, 3.5 Accidentes del personal obrero (por la electricidad y trabajos en alturas) y 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.).</p> <p>Operación:</p> <p>N/A</p> <p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de y Salud Ocupacional y Comunitaria que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Acorde a la ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Prevención Social, en su artículo 68 establece que el contratista debe: Mantener botiquín de primeros auxilios según los requerimientos de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) dentro de la obra, para la atención de los trabajadores ante cortaduras, quemaduras o malestares

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>generales y tomándose en cuenta los enseres y medicamentos que determine la Dirección General de Previsión Social (el botiquín deberá ser tipo móvil, impermeable y un tamaño mínimo 30cm x 40 cm, Que contenga al menos 15 elementos, entre medicamentos y equipo de primeros auxilios, según Ley General de Riesgos en los Lugares de Trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tener a disposición ante emergencias laborales que no puedan ser satisfechas con la presencia y utilización del botiquín (Ej.: accidentes graves de los trabajadores, intoxicación, etc.). teléfonos de emergencia de los centros de atención ciudadana (Unidades de Salud, Cruz Roja, policía Nacional Civil PNC, Bomberos, etc.) más cercano de cada subproyecto. • Colocar señales preventivas, suministrar el equipo de protección personal mínimo y capacitar a los trabajadores para el desarrollo seguro de las actividades de construcción. • El Contratista deberá asegurar que los trabajadores tengan seguro de salud y contra accidentes. • Capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto del Equipo de Protección Personal (EPP) y garantizar su suministro durante el período de obra. • Es responsabilidad de los contratistas reportar lo más pronto posible cualquier accidente o incidente al supervisor y la UIP. En el caso de que ocurra un accidente, incidente o se presente una enfermedad laboral, estos deberán ser investigados y reportados. Una vez identificada la causa del accidente/incidente se deberán tomar medidas de mejora para evitar que la situación vuelva a suceder
2.1.6 – 2.2.6 Accidentes y afectaciones a miembros de la comunidad	<p><u>Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cercar el perímetro de la obra y controlar accesos. • Contar con la debida y correcta rotulación en las diferentes áreas de construcción, como son: excavaciones profundas, colectores para aguas negras, entre otros, con el fin de evitar que trabajadores y personas ajenas a la obra pongan en riesgo su integridad física. • No permitir el uso de espacios por parte de la comunidad que requieran circulación de personas dentro del sitio de obra. • Mantener a la comunidad informada sobre las obras. • Capacitación a los trabajadores sobre la necesidad de demostrar respeto a los sitios sagrados, costumbres, tradiciones, y culturas de la población donde se desarrolla el proyecto.
2.1.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de requerirse la construcción de un campamento temporal para hospedar a sus trabajadores y colaboradores, el contratista deberá describir, en el PGAS-C, las necesidades de influjo de trabajadores, atendiendo todas las medidas de seguridad y servicios básicos. Estas instalaciones deberán también tomar en cuenta los riesgos de abuso, acoso y explotación sexual para la comunidad por el influjo de trabajadores. • Los trabajadores deberán contar con servicios sanitarios provisionales en óptimas condiciones de limpieza y con un sistema que no afecte el medio circundante

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<ul style="list-style-type: none"> • Se deberá disponer de un (1) servicio sanitario por cada diez (10) operarios-de la obra, sean estos sanitarios portátiles alquilados por el ejecutor, con el fin de prevenir la contaminación de los recursos, por desechos humanos y los riesgos a la salud de la población asociados a esta contaminación. • Asignar áreas especiales dentro del sitio de construcción o en las instalaciones provisionales destinadas para la preparación de alimentos, como también comedores para los trabajadores para reducir el riesgo de contaminación de agua y alimentos durante su preparación y consumo. • Se deberá dotar al personal que labora en esta etapa de agua para consumo humano que cumpla con los parámetros establecidos en la legislación nacional aplicable vigente.
2.1.11 Riesgos físicos para los estudiantes por las obras de construcción	<ul style="list-style-type: none"> • El contratista no podrá iniciar las obras a menos de que se haya implementado el Plan de Reubicación Temporal preparado por MINEDUCYT y adjunto a este PGAS, el cual describe el enfoque para garantizar la continuidad educativa mientras duran las obras garantizando la seguridad de los estudiantes. El Contratista deberá llevar a cabo las actividades que le sean asignadas en el Plan de Reubicación Temporal.
6.1.8 Riesgos físicos para la comunidad educativa por las obras de construcción en los casos donde contratistas ingresan al CE antes de estar liberado	<ul style="list-style-type: none"> • El contratista será responsable de sus materiales y equipos en el área de proyecto. Además, deberá asegurar que áreas adyacentes/canales pluviales no sean afectadas por el proceso constructivo.
8. Procedimientos de Calidad de Aire	
<p>2.1.3 Afectación de la calidad de aire por construcción del proyecto</p> <p>2.1.9 Alteración de la calidad de vida por el desarrollo del proyecto</p> <p>2.2.2 Afectación potencial de la salud y seguridad de los trabajadores de construcción y vecinos aledaños al subproyecto.</p>	<p><u>Aplicar las medidas establecidas en los Procedimientos de Calidad de Aire.</u></p> <p>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Calidad de Aire y que son de estricto cumplimiento son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controles y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias del proyecto: Los vehículos, equipos y la maquinaria que se utilizará en las diversas actividades del proyecto deberán contar con una revisión al inicio de su puesta en servicio de tal manera que se garantice su integridad, buen estado y funcionamiento. • Se deberá tener programa de mantenimiento periódico preventivo y correctivo para los equipos, maquinaria y vehículos utilizados en el proyecto que puedan generar emisiones, vibraciones y/o ruido.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
9. Plan de Gestión de Fuerzas de Seguridad	
6.2.1 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad que consideren innecesaria y hasta atentatoria la participación de personas o empresas dedicadas a la seguridad de las obras.	<p>El plan de Gestión de Fuerzas de Seguridad y sus distintas actividades aplica a todas las fases del proyecto siempre y cuando participe personal de seguridad.</p> <p>Las actividades principales se centran en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Presencia de personal de seguridad durante las obras y contratación temporal de mano de obra para las actividades del proyecto</u> <p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular y que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El contratista que contrate este personal deberá tener entre sus criterios de selección: i) confirmar que no ha participado en comportamientos ilegales o abusivos en el pasado, incluyendo explotación y abuso sexual, el acoso sexual, o uso excesivo de la fuerza; (ii) nivel de instrucción y capacitación de la persona, sobre el uso de la fuerza y el comportamiento y conducta apropiados (incluso en relación con explotación y abuso sexual); y (iii) desplegado de manera consistente con la legislación nacional aplicable. • Adicionalmente, el contratista deberá tomar como referencia la Nota de Buena Práctica del Banco Mundial sobre la “Evaluación y Manejo de Riesgos e Impactos en el uso de Personal de Seguridad”.
10. Estrategia de Consulta con Partes Interesadas	
6.1.3 Falta de interés/participación de la comunidad en el proyecto	<p>El contratista preparará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una estrategia de consulta con Partes Interesadas, conforme los principios del Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto⁶ (PPPI), asegurándose que incorpora siempre los procesos consuetudinarios y culturales vinculados a la participación ciudadana de la comunidad, que sea accesible, inclusivo respetuoso e igualitario (con un enfoque de género y abierto a la participación de grupos etarios) y culturalmente apropiado a toda la comunidad. Este PPPI estará alineado y seguirá los procesos establecidos en el proceso de consulta realizado durante la preparación de este PGAS (ver anexos para referencia). • Organizar reuniones mensuales (o con mayor frecuencia si la dinámica y complejidad de la obra lo requiriese) para dar a conocer la obra (alcance y resultados esperados en cada una de las etapas de construcción y posibles afectaciones a la comunidad). Así como la forma mediante la cual la comunidad puede participar de manera directa e indirecta. En dichas reuniones las partes interesadas podrán exponer sus consultas, sus interrogantes, solicitar aclaraciones y mantenerse

⁶ El Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto se puede encontrar en: <https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>informados sobre las diferentes etapas del proyecto. Se deberá evidenciar dichos encuentros a través de listas de asistencia, minutas y fotografías (colectivas y siempre respetando la privacidad individual), las cuales serán contenidas en informes mensuales de avance de proyecto del contratista. Estas reuniones podrían cubrir, según sea necesario, los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inducción sobre las medidas ambientales y sociales que se tomaran durante la construcción de la obra. • Exposición del Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que deberán seguir sus colaboradores para promover al máximo el respeto a los miembros de ambos géneros de la comunidad evitando abusos verbales y/o físicos de cualquier naturaleza. • Comunicación de las medidas de seguridad que se tomaran durante construcción para proteger la comunidad y los empleados del contratista. Medidas que han de estar especificadas en los Procedimientos de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria. • Información sobre el Mecanismo de Quejas y Recomendaciones del proyecto y las maneras mediante las cuales la comunidad puede hacer llegar al contratista, al MOPT, y a MINEDUCYT sus preocupaciones. • Además, el contratista divulgará información relevante por distintos medios, incluyendo rótulos y afiches, radio, redes sociales, WhatsApp, entre otros. Se deberá procurar que la información sea accesible para personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
11. Plan de Acción de Violencia de Género	
6.1.4 Explotación, abuso y acoso sexual.	<p>El plan de acción de violencia de género, deberá ser desarrollado por el contratista, e incluirá los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapeo: Anteriormente se realizó un mapeo de los proveedores de servicios de violencia de género a nivel de país, el cual está incorporado al PPPI del Proyecto. <u>Tomando esa lista como punto de partida, el contratista deberá desarrollar una lista de los actores de respuesta a la violencia de género en los sitios del subproyecto agregando, de ser necesario, grupos locales a la lista existente.</u> La lista de los proveedores de servicios incluye agencias / instalaciones gubernamentales relevantes (como la municipalidad local) y también tiene en cuenta la prestación de servicios en situaciones de emergencia. Los sobrevivientes de violencia de género, incluidos los sobrevivientes de AES/AS, serán referidos a los proveedores de servicios seleccionados en caso de necesidad. Sobre la base de esa evaluación, se preparará una lista más corta de dos o tres proveedores de servicios que trabajan sobre el terreno y que son adecuados para mantener una colaboración cercana. La selección del proveedor de servicios y el papel del proveedor de servicios se decidirán en coordinación con MINEDUCYT.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<ul style="list-style-type: none"> • Código de Conducta. El código de conducta para los trabajadores que define y prohíbe el AES/AS, conforme al PGMO del Proyecto será firmado por todos los trabajadores del contratista. La empresa se asegurará que los códigos de conducta sean firmados y entendidos por todas las partes y que exista capacitación. • Fortalecimiento de capacidad: El Plan de Acción debe fomentar la capacidad y la sensibilización de los contratistas de obra y otros relevantes en la importancia de las cuestiones relacionadas con la violencia de género. Dichas capacitaciones deberán ser realizadas por el contratista para su personal, en coordinación con MINEDUCYT. • Marco de rendición de cuentas y respuesta para hacer frente al AES/AS. El Plan de Acción detallará cómo se manejarán las denuncias de AES/AS, y los procedimientos para reportar las denuncias de AES/AS de manera consistente con el Mecanismo de Quejas del Proyecto descrito en el PPPI, así como una vía para remitir a los sobrevivientes a los proveedores de servicios apropiados y los requisitos de confidencialidad para los casos.
12. Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencias	
<p>2.1.5 - 3.1.2 - 4.1.1 Contaminación de suelo y agua por derrame e infiltración de sustancias peligrosas.</p> <p>Daño a la integridad física de los trabajadores por percances derivados de incendios, inundaciones, deslizamientos o derrumbes.</p>	<p>En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operación.</p> <p>etapa de Formulación y diseño:</p> <p>En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades:</p> <p><i>2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra (construcción de bodega), y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente</i></p> <p>En la etapa de construcción:</p> <p><i>3.1 Adquisición de material de construcción que no cuente con las medidas de certificación de sostenibilidad. 3.2 Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios.</i></p> <p>Operación:</p> <p>4.1 Funcionamiento del Centro Escolar</p>

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p><u>Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencia que son de estricto cumplimiento son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar un procedimiento de respuesta a emergencias que incluya la manera de proceder ante fenómenos climatológicos adversos como terremotos, incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros. Capacitar y supervisar a los trabajadores para aplicar dicho Procedimiento. • Evitar la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, mezcla de concreto, combustibles y grasas en ríos o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán ser envasados y eliminados en el sitio autorizado para este fin. • Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. • Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre. • Capacitar al personal sobre el manejo adecuado de las sustancias líquidas peligrosas usadas en la obra. • Supervisar y capacitar a los trabajadores para la aplicación del procedimiento de gestión integral de residuos líquidos.
13. Procedimiento de Respuesta y Prevención de Enfermedades Infecciosas	
6.1.8 Potencial riesgo de enfermedades del personal obrero y comunidad educativa/vecina, incluyendo COVID-19	<p>El Procedimiento de Prevención y Respuesta a Enfermedades Infecciosas deberá considerar los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de lavamanos y desinfectantes. • Mantener al menos 1.5 m de distancia entre una persona y otra. Uso permanente de tapa bocas. • Colocar señales preventivas, letreros sobre protocolos oficiales MINSAL/OPS/OMS para la prevención de enfermedades infecciosas. • Capacitar y entrenar al personal obrero, en el uso de equipo de protección personal, prevención de enfermedades contagiosas, Higiene y Seguridad Laboral y Normas de Conducta para Trabajadores, • Desarrollar y aplicar un procedimiento de respuesta y prevención de enfermedades infecciosas, y capacitar al personal para su aplicación. <p>Cumplir las normas nacionales y recomendaciones de la OMS vigentes en relación al riesgo de infección por COVID-19.</p>
14. Plan de Gestión Laboral	

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
	<p>En su PGAS-C, el contratista deberá incluir confirmación sobre los siguientes elementos relacionados con la gestión laboral, conforme el PGMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El número de trabajadores a ser contratados para las obras, y de ser posible la desegregación entre mano de obra local (que no requiere alojamiento) y mano de obra que requiere alojamiento en la obra. • Que los trabajadores contarán con contratos de trabajo, consistentes con las normas nacionales y el PGMO, y recibirán información por escrito sobre los términos y condiciones de su empleo, incluyendo horarios de trabajo, compensación, periodos de vacaciones y descanso y otros beneficios. • Que para obras de reparación, reposición o similares que por ser trabajo de obra menor, se aplicarán contratos individuales dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Trabajo de El Salvador y a lo establecido en el PGMO. • Que se garantizará la Salud y Seguridad Ocupacional mediante los Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria. • Que el contratista promoverá el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para trabajadores del Proyecto. • Que el contratista tomará medidas de protección y asistencia apropiada a los trabajadores del proyecto que pudieran ser vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidades, los jóvenes (en edad laboral, de conformidad con el EAS2 y PGMO), la mano de obra local o perteneciente a comunidades indígenas, y los trabajadores migrantes, según corresponda. • Que el contratista impedirá todas las formas de trabajo forzado • El contratista no contratará a ningún menor de 18 años. • Que el contratista apoyará los principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores del proyecto de conformidad con las leyes nacionales. • Que el contratista brindará a todos los trabajadores del proyecto, medios accesibles para plantear inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo, conforme lo requerido por el PGMO y el contrato. • Que el contratista ofrecerá, en la medida de lo posible, oportunidades laborales a las personas que residen en las comunidades y los municipios beneficiados. • Que el contratista, en la medida de lo posible, permitirá la participación de poblaciones vulnerables en el proyecto, incluyendo a mujeres y jóvenes

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
15. Plan de Manejo y Protección de Materiales y Equipos de Construcción	
	<p>El Plan de <u>Plan de Manejo y Protección de Materiales y Equipos de Construcción</u> deberá ser desarrollado por el contratista para establecer los requisitos para la obtención, transporte, protección y resguardo de los materiales y equipos de construcción.</p> <p>El Plan tiene el objetivo de asegurar que la compra del material de construcción y materia prima para el subproyecto sea de procedencia sustentable ambientalmente y que el mismo cuente con las correspondientes certificaciones o etiquetas, donde relevante.</p> <p>El Plan se aplica durante la fase de construcción y cierre de la obra.</p> <p>Los principales aspectos a considerar en el desarrollo del Plan incluyen, pero no se limitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de fuentes y proveedores de materiales con los debidos registros comerciales, licencias y certificaciones. • Identificación de rutas de transporte que minimizan el impacto en los vecinos. • Asegurar que los vehículos transportadores están en buen estado; con sus puertas de descarga herméticamente cerradas para evitar la pérdida de material o escurrimiento; que los contenedores sean apropiados y en buen estado para el transporte seguro de materiales; e que el vehículo esté dotado de lo necesario para dar respuesta a contingencias. • El material de construcción debe transportarse cubierto para evitar dispersión de partículas o accidentes en su traslado. • Los sitios de acopio de materiales deben contar con las condiciones de resguardo y el material debe quedar cubierto. • En caminos de tierra, los vehículos deben circular a velocidad baja, para evitar levantar partículas de polvo. • Si la maquinaria no será utilizada, se recomienda no tenerla encendida, con ello se evita levantamiento de polvo y gasto de combustible. • Capacitar y educar al personal de la obra y contratista sobre medidas de prevención y control de material particulado. • Al final de la obra, asegurar la remoción, reutilización y disposición final segura de material sobrante.

Riesgos	Acciones o Medidas de Mitigación
16. Plan de Capacitación Ambiental y Social	
	<p>El <u>Plan de Capacitación Ambiental y Social</u> deberá ser desarrollado por el contratista y tendrá el objetivo de sensibilizar y concientizar a los trabajadores sobre la importancia de cumplir las medidas preventivas, de mitigación y compensatorias de acuerdo con el PGAS y demás planes y procedimientos.</p> <p>El Plan será desarrollado con base en la identificación de necesidades de capacitación; se implementará durante todo el ciclo del proyecto y el contratista mantendrá un registro de las capacitaciones realizadas, fechas y firmas de participantes.</p> <p>El Plan se impartirá de forma teórica y práctica, incluirá los aspectos de los procedimientos de operación en las diferentes actividades, los diferentes mantenimientos a realizar, uso de las herramientas y materiales; así como los medios de seguridad y protección.</p> <p>Temas a abordar en el Plan incluyen, pero no están limitados a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principales riesgos e impactos ambientales y sociales asociados al subproyecto y abordados en el PGAS-C y planes asociados • Principales riesgos de salud y seguridad ocupacional asociados a los subproyectos, medidas de mitigación y uso correcto de equipo de protección personal • Principales aspectos del Procedimiento de preparación y atención de emergencias (atención de accidentes, incendios y otros) • Norma de conducta de contratista y trabajadores • Prevención de la contaminación de suelo, aire y agua • Señalización y seguridad vial, partes de una vía y seguridad peatonal • Procedimiento de atención de quejas y reclamos • Planes o procedimientos específicos relacionados a la ejecución del subproyecto

4 Mecanismos de comunicación para preocupaciones quejas, sugerencias y respuestas del proyecto y de los trabajadores

4.1 Mecanismo para las comunidades

Tomando como base las orientaciones del EAS10 del Banco Mundial, el Mecanismo de Comunicación para Preocupaciones, Quejas, Sugerencias y Respuestas es: “Un mecanismo de atención de quejas y reclamos es un sistema, proceso o procedimiento accesible e inclusivo que se utiliza para recibir reclamos y sugerencias de mejoras y adoptar medidas oportunas al respecto, y para facilitar la solución de las inquietudes y quejas que surjan en relación con un proyecto. Un mecanismo eficaz de atención de quejas y reclamos proporciona una reparación a las partes afectadas por el proyecto y permite abordar los problemas en una etapa temprana.” (EAS10, pág. 8).

A nivel de los subproyectos de infraestructura educativa se contemplan los siguientes elementos:

1. Las que pueden y deberían ser atendidos por los Contratistas de las obras. Generalmente, estas podrían estar asociadas a la operatividad de las obras en ejecución: generación de polvo, congestionamiento del tráfico por uso de espacios con vehículos que descargan materiales; actitudes del personal del Contratista hacia la comunidad o a personas en específico; riesgos de accidentes; riesgo de contaminación de cursos de agua superficiales y/o acuíferos; alteración del caudal o dirección de la corriente de aguas superficiales y/o subterráneas; riesgo de contaminación del suelo; eliminación de la cobertura vegetal; riesgo de atropello de animales, entre otros.
2. Las que pueden y deben ser atendidas directamente por la UIE-MOPT. La presentación de quejas, reclamos y sugerencias también pueden ser hechas, de manera verbal o escrita, al administrador de contrato o al supervisor de la obra.
3. Las que se remitirán a la UIP-MINEDUCYT para que se procesen institucionalmente en el mecanismo establecido. Ejemplos: incumplimientos en los diseños o en los tiempos de las obras; casos de acoso y violencia sexual y discriminación; ⁱ casos de violencia contra personas de la comunidad; otros. Hay que tener en cuenta que la naturaleza específica de la violencia de género y de la explotación sexual y el acoso y el abuso sexual requiere medidas adaptadas para la denuncia y el tratamiento seguro y ético de dichas denuncias, conforme el Plan de Acción de Violencia de Género y el PPPI del proyecto.

Además de los Contratistas a través de su equipo ambiental y social, también se podrán entregar quejas y reclamos en los centros educativos donde se desarrollan subproyectos, y específicamente, en un buzón ubicado en el centro educativo, (en donde la persona pueda mantener su anonimato si así lo requiere) o puede hacerlo en la Dirección de cada entidad. La Dirección de cada centro educativo revisará las quejas y reclamos colectadas semanalmente y procederá a atender las que correspondan con su nivel y competencia. En otros casos, entregará informe al personal ambiental y social de los Contratistas para su atención inmediata o a la OAC de la Dirección Departamental de Educación a la que pertenezca el centro educativo. Al llegar a esta instancia, seguirá el trámite previsto. El PGAS-C deberá detallar muy claramente

cuáles serían esos canales de atención, incluyendo números de teléfono activos, emails que sean revisados con frecuencia, mensajes de texto, etc.

Las quejas podrán ser anónimas, y se guardará la confidencialidad con terceros sobre la identidad de la persona, la existencia de la queja y el contenido de la queja, a menos de que la persona exprese acuerdo con que se comparta una parte o toda dicha información con el propósito de facilitar la resolución de la queja.

4.2 Mecanismo para los Trabajadores

Todos los tipos de trabajadores vinculados a las actividades del subproyecto tendrán acceso a un mecanismo de atención de quejas y reclamos que garantice procesos transparentes, oportunos, y permita a los trabajadores plantear inquietudes, incluso de forma anónima a una persona que no sea su supervisor inmediato. El contratista deberá garantizar que un mecanismo de quejas propio para trabajadores esté disponible, alineado al mecanismo descrito abajo, operado por MINEDUCYT.

El Mecanismos de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR) de los trabajadores será implementado durante todas las etapas del Proyecto y de manera continua. El mecanismo de quejas y reclamos de los trabajadores relacionados con la ejecución del Proyecto en sus distintas etapas y niveles.

Los especialistas sociales y ambientales de UIP-MINEDUCYT y los de UIE-MOPT (dada su participación en la gestión y administración de contratos para el Componente 3) serán responsables de exigir y orientar a los Contratistas en el funcionamiento y aprovechamiento del MAQR para la mejora permanente del Proyecto y evitar situaciones críticas durante cualquiera de las etapas del mismo. El equipo de UIP-MINEDUCYT orientará a la UIE-MOPT sobre los pormenores del sistema y de sus variadas herramientas y temporalidades. UIE-MOPT se encargará de organizar espacios formativos e informativos dirigidos a los Contratistas y sobre el mecanismo de quejas y reclamos del proyecto. La UIP participará de estas actividades apoyando y verificando la concreción de las mismas.

El Mecanismo de quejas y reclamos se desarrolla a través de varios niveles:

i. Primer nivel del mecanismo

En este nivel, se recibirán las solicitudes de información, quejas y avisos, denuncias, reclamos de los trabajadores, que, para ser respondidas, necesitan intervención de las diferentes instancias del MINEDUCYT y del MOPT.

ii. Segundo nivel del mecanismo

En este nivel, se recibirán las solicitudes de información, quejas y avisos, denuncias y reclamos, que los trabajadores del Proyecto reporten especialmente en la UIE-MOPT.

iii. Tercer nivel del mecanismo

En este tercer nivel se colectan, especialmente, aquellas quejas, reclamos o consultas planteadas por los trabajadores y que pueden ir dirigidos a cualquiera de los actores (UIE-MOPT, UIP-MINEDUCYT, Contratistas, etc.).

Mecanismo AQR para TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA:

En caso de existir un mecanismo de quejas que implique a la representación Sindical de los Trabajadores en las Obras, no se restringe su uso y aplicación, tampoco se sustituye por el MQR del proyecto, sin embargo, podrá hacer uso de este con la libertad que implique.

Además, podrá:

- Avocarse al referente territorial de la Agencia Contratada para la Supervisión de Obra.
- Avocarse a la Dirección Departamental de MINEDUCYT, si el proceso tiene relación con la comunidad educativa y se deriven de alguna acción relacionada al contexto laboral de personal en el Proyecto. Se deberá informar a la UIP.
- Usar los Buzones dispuestos en Centros Escolares, para depositar en sobre cerrado con información escrita sobre el proceso. Esta información será entregada a la Dirección departamental de educación y remitida a la Oficina de la UIP-MINEDUCYT para continuar el proceso respectivo.
- En los subproyectos Gestión Social será el encargado de clasificar las quejas y/o reclamos.

PARA LA REGULACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DESDE MINEDUCYT

1. MINEDUCYT solicitará dentro de los requisitos al contratista elaborar un mecanismo de quejas para sus trabajadores.
2. Supervisión contractual para las actividades enmarcadas en el proyecto (Unidad Gestora del Proyecto).
3. Solicitará al contratista que dé a conocer de forma verbal o por escrito el mecanismo de quejas a todo el personal contratado del proyecto en el marco del proyecto en el primer trimestre del contrato, donde deberá destacar la protección del trabajador contra represalias cuando lo use.

4.3 Medios de comunicación asociados al MAQR de MINEDUCYT y MOPT

Medio de comunicación MINEDUCYT	Datos importantes MINEDUCYT
Call Center	2592-2009, 2592-2045/2030 para la Oficina de Atención Ciudadana (de la Oficina de Información).
Correo electrónico:	salve@mined.gob.sv (de la Oficina de Información).
Redes Sociales del MINEDUCYT	(WhatsApp +503 6008-3286) para la recepción de mensajes y llamadas en horario ininterrumpido

Atención presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC)	Plan Maestro, oficinas centrales del MINEDUCYT y en las 14 Direcciones Departamentales de Educación.
Buzón de sugerencias, quejas y avisos	Ubicados en los centros educativos a nivel nacional.
Atención presencial en el MINEDUCYT	Oficina de Atención Ciudadana, y en las oficinas de Atención Ciudadana/OÍR de las 14 Direcciones Departamentales de Educación a nivel nacional.
Medio de Comunicación MOPT	Datos importantes MOPT
Oficina de Información - OIR / UAIP	
Dirección:	Plantel La Lechuza, Km. 5 1/2 carretera a Santa Tecla, Plantel MOP, San Salvador
Oficial de información	
Teléfono(s):	2528-3218
Horario de atención	Lunes a Viernes de 07:30 a 15:30
mail:	oir@mop.gob.sv

4.4 Plazos de gestión de quejas y reclamos

Plazos de gestión y respuesta: De acuerdo a los plazos máximos establecidos en el Art. 86 LPA, las respuestas serán de 5 días los de mero trámite, 20 días después de solicitados lo que implique informes técnicos, salvo que por su naturaleza se establezca de manera fundamentada la necesidad de ampliación, lo cual no podrá exceder en todo caso de otros veinte días y 15 días después de solicitados, los informes administrativos no técnicos.

5. Arreglos de implementación

A nivel del subproyecto, el contratista será responsable de desarrollar todas las EGPE requeridas por este PGAS, incluyendo las que sean relevantes del PRT. Las EGPE colectivamente componen el PGAS-C. El contratista será responsable de implementar el PGAS-C a lo largo de la obra. Además, el contratista será responsable de obtener los permisos y licencias de acuerdo con lo estipulado en los documentos de

licitación. La empresa supervisora será responsable de verificar el cumplimiento y dar el visto bueno del PGAS-C por parte del contratista. Respetando las responsabilidades y roles del MGAS.

Durante la ejecución del proyecto, un Coordinador y dos especialistas de las áreas ambiental y social y pertenecientes a la UIP, serán responsables de la verificación de los compromisos que en materia se hayan asumido como Estado salvadoreño ante el BM. Este equipo tendrá la colaboración de los especialistas de las direcciones nacionales del MINEDUCYT, y estos a su vez, coordinarán territorialmente (en cada obra a realizar) con los técnicos ambientales y sociales de la UIE MOPT y ellos a las empresas contratistas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) brindara apoyo a MINEDUCYT para la administración y gestión técnica de los contratos correspondientes a los subproyectos de infraestructura educativa del proyecto por medio de un convenio interinstitucional. Dicho convenio establece los lineamientos generales en relación a la participación del MOPT. El MINEDUCYT será la entidad responsable de garantizar el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales del proyecto de acuerdo con lo documentado en el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) y esto no puede delegarse.

En la ejecución del subproyecto, el equipo Ambiental y Social será responsable del monitoreo para garantizar el cumplimiento de este Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y de las EGPE, así como el Plan de Reubicación Temporal (PRT) y Plan de Pueblos Indígenas (PPI) donde corresponda, asegurando de esta manera el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de las medidas ambientales y sociales propuestas en la etapa de diseño.

Responsabilidades del Contratista:

1. Desarrollar todas las Estrategias de Gestión Y Planes de Ejecución (EGPE) para gestionar los riesgos Ambientales y Sociales requeridas por este PGAS. Estas EGPE colectivamente componen el PGAS-C. Conforme los Documentos de Licitación, el Contratista no deberá llevar a cabo la movilización al lugar de las Obras antes de haber obtenido la aprobación del PGAS-C por parte del administrador de su contrato.
2. En caso de que este PGAS incluya un PRT como anexo, el contratista será responsable de llevar a cabo las acciones asignadas al contratista en el PRT.
3. El contratista será responsable de gestionar los permisos y licencias necesarias con las autoridades nacionales competentes, incluyendo licencias ambientales, permisos para disposición de residuos sólidos, escombros, corte de árboles, y otros que sean necesarios.
4. El contratista deberá implementar el PGAS-C y todas las responsabilidades que le sean asignadas en este PGAS y en virtud de su contrato.

5. El contratista deberá reportar de manera mensual al MOPT, a través de la UIE (Unidad de Infraestructura Educativa), el avance de la implementación de las medidas de gestión socioambiental del PGAS-C, y cualquier otra relevante, procurando el cumplimiento a las cláusulas contractuales pertinentes y sus compromisos ambientales y sociales. Posteriormente la UIE informará a la Unidad de implementación de Proyecto (UIP) del MINEDUCYT a través de informes mensuales
6. Además de los informes de avance, el Contratista informará al MOPT, quien una vez informará al MINEDUCYT sobre cualquier acusación, incidente o accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las comunidades afectadas, el público, el Personal del Contratante o Personal del Contratista. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier incidente o accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos adversos significativos o daños a la propiedad privada; o cualquier acusación de EAS y / o ASx. En caso de EAS y / o ASx, mientras se mantiene la confidencialidad según corresponda, únicamente el tipo de denuncia (explotación sexual, abuso sexual o acoso sexual), género y edad de la persona que experimentó el presunto incidente deben incluirse en la información.
7. Asistir a reuniones de coordinación con actores involucrados en la ejecución del subproyecto relacionadas con las actividades del mismo.
8. Participar en la implementación del MAQR del subproyecto, manteniendo canales accesibles a las comunidades locales y otras partes interesadas para recepción de quejas, reclamos, preguntas o inquietudes. Dentro de esta línea informará y coordinará con el MOPT y el MINEDUCYT para brindar respuestas y resoluciones oportunas a la comunidad.
9. Mantener un mecanismo de gestión de quejas para sus trabajadores diseñado para atender las preocupaciones de los trabajadores de manera confidencial, ágil y transparente. No deberá haber represalias por el uso del mecanismo.
10. Al final de la obra, la Contratista debe presentar un Informe Final Ambiental y Social, donde se incorpore la información correspondiente a la implementación del PGAS, incluyendo los registros de implementación de planes y programas, y un informe de cumplimiento de los indicadores ambientales y sociales considerados en las distintas etapas del ciclo del proyecto.

Responsabilidades de la Empresa Supervisora:

1. Garantizar la correcta ejecución de los aspectos ambientales y sociales responsabilidad del contratista contenidos en este PGAS, en el PGAS-C y en el contrato del contratista, durante la ejecución del subproyecto, velando el cumplimiento de los requisitos de los EAS del BM, permisos necesarios y la legislación socioambiental vigente.
2. Realizar la verificación y aprobación de los instrumentos técnicos de seguimiento y monitoreo socioambiental sitio específico, elaborados por las firmas contratista y presentarlos al administrador del contrato dentro de los plazos que establezca el contrato.
3. Reportar de forma mensual al administrador del contrato sobre el avance de la implementación de las medidas de gestión socioambiental, velando que se dé cumplimiento a las cláusulas contractuales pertinentes y los PGAS del subproyecto.
4. Asistir a reuniones de coordinación con los actores involucrados en las actividades del proyecto.

5. La Firma Supervisora deberá revisar y aprobar /dar el visto bueno al PGAS-C; también deberá de confirmar que cada PGAS-C aborda adecuadamente los riesgos e impactos ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional (SSO) y que las medidas de mitigación son las necesarias para el subproyecto, conforme lo requerido por el PGAS y el contrato, y supervisar su cumplimiento durante la realización de la obra. La Firma Supervisora hará el seguimiento para asegurar que el contratista adopte e implemente cada PGAS-C a lo largo del periodo de obras para cada subproyecto.
6. En el caso de que durante la supervisión se evidencien incumplimientos del PGAS-C, la Firma Supervisora deberá de proponer acciones correctivas para garantizar que las obras dan cumplimiento con el MAS del BM, la legislación nacional vigente y lo detallado en el PGAS. A partir de eso, la supervisión deberá incluir la verificación del cumplimiento de la adopción de las medidas correctivas.
7. Apoyar en dar capacitaciones al contratista y sus trabajadores sobre temas de SSO, medio ambiente y gestión social, de acuerdo con los documentos de base del proyecto y los documentos contractuales.
8. Participar en la implementación del mecanismo de quejas y reclamos del proyecto, manteniendo canales accesibles a las comunidades locales y otras partes interesadas para recepción de quejas, reclamos, preguntas o inquietudes, y coordinar con MINEDUCYT y los contratistas para su resolución oportuna.

Responsabilidades del MOPT

1. Recibir y revisar el PGAS-C de cada subproyecto elaborado por el contratista.
2. Realizar visitas técnicas, junto con el MINEDUCYT, a los centros educativos para verificar el avance y calidad de la obra y el cumplimiento del PGAS y PGAS-C.
3. Elaborar informes periódicos/mensuales de seguimiento sobre el desempeño ambiental, social, de salud y seguridad del proyecto, incluyendo la información obtenida de empresas contratistas y de supervisión de obra. Dichos informes serán entregados al Coordinador de la UIP - MINEDUCYT, quien se encargará de presentarlo en forma y contenido aceptables para el Banco, en línea con los requerimientos detallados en el PCAS, MGAS y el Manual Operativo del Proyecto.
4. Identificar y analizar los riesgos e impactos ambientales y sociales y los retos para la ejecución de este PGAS a través de los informes emitidos, y en coordinación con el MINEDUCYT, gestionar la solución para las dificultades observadas, identificar acciones, estrategias y mecanismos de solución con el MINEDUCYT.
5. Monitorear a través de la UIE MOPT el correcto funcionamiento del mecanismo de gestión de quejas del Proyecto, según lo descrito en el PPPI, y asegurar que los informes de avance del Proyecto incluyan información sobre su funcionamiento, incluyendo tipología y número de quejas recibidas y progreso en su resolución.

Responsabilidades de MINEDUCYT-UIP

6. Velar, revisar y avalar que las planificaciones, diseños, desarrollo y ejecución de las actividades del proyecto, contenga y se cumpla todo lo dispuesto en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), el Marco de Pueblos Indígenas (MPI), el Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI), el Plan de Gestión de Mano de Obra (PGMO), el Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), y el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) del proyecto así mismo la aplicación de la legislación Salvadoreña vigente y normativas técnicas en el tema ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO), así como las regulaciones legales en el ámbito sanitario ambiental, social y de SSO, que deben ser consideradas en todas las fases del proyecto.
7. Apoyar la implementación de medidas de manejo ambiental, de SSO y social, orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales identificados, según lo contenido en los instrumentos de gestión ambiental y social del proyecto, y así mejorar el desempeño ambiental del proyecto.
8. Velar por la implementación de los procesos de participación y consulta necesarios, tal cual lo establece el PPPI, y en coordinación con los equipos técnicos de la UIE MOPT y Contratistas; y fungir como enlace principal para la atención de los procesos de comunicación con los grupos de interesados y de acuerdo con los lineamientos y cronogramas establecidos en el PPPI.
9. Asegurar que las consultorías, estudios, desarrollo de capacidad, capacitaciones y cualquier otra actividad de asistencia técnica ejecutada bajo el Proyecto, sea ejecutada de acuerdo con términos de referencias aceptables para el Banco, que incorporen los requerimientos relevantes de los EAS y de los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto.
10. Asegurar que los contratos de los contratistas incorporen los requerimientos ambientales, sociales, y de salud y seguridad ocupacional necesarios, en línea con lo estipulado en el MGAS y PCAS del Proyecto; así como velar por el cumplimiento de dichos requerimientos.
11. Recopilar la información sobre la gestión ambiental y social de los reportes de MOPT, Empresas Supervisoras, y Empresas Contratistas, e incluir la información necesaria en los reportes presentados al Banco, conforme el PCAS del Proyecto.
12. Velar por el correcto funcionamiento del Mecanismo de Quejas, en coordinación cercana con la OIR y otros actores relevantes. Brindar apoyo al contratista, empresa supervisora y MOPT en atender los casos que les sean relevantes.
13. Desarrollar los procedimientos y formatos para el seguimiento, monitoreo y evaluación ambiental y social del Proyecto, según corresponda.
14. Preparar y presentar al Banco informes periódicos de seguimiento sobre el desempeño ambiental, social, de salud y de seguridad (ASSS) del Proyecto, incluyendo, pero no limitado a la implementación del PCAS, el estado de preparación y aplicación de los documentos ambientales y sociales (A&S) requeridos en virtud del PCAS, las actividades de participación de las partes interesadas y el funcionamiento de los mecanismos de reclamación.

6. Monitoreo y seguimiento

A continuación, en la **Tabla 5**, se presenta de manera general el mecanismo de seguimiento ambiental y social que se implementarán en las distintas actividades contempladas en cada uno de los subproyectos.

Tabla 5: Mecanismo de seguimiento ambiental y social para subproyectos

Proceso	Responsables	Competencia
Implementación de las Medidas de Gestión Ambiental y Social	Especialistas Ambiental y Social del Contratista	Velar por el cumplimiento del PGAS, los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto y los EAS del BM
	Especialistas Ambiental y Social de la empresa supervisora	
Procesos de Consulta	Especialistas sociales de MINEDUCYT-UIP	<p>Prevía a la licitación, MINEDUCYT llevará a cabo consultas con la comunidad en cumplimiento del Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto.</p> <p>Los procesos consultivos continuos a nivel de los subproyectos los asumirán los especialistas ambientales y sociales de los Contratistas, conforme lo requerido en este PGAS.</p> <p>La labor consultiva se extenderá a todo el desarrollo del Proyecto, sin embargo, estará acentuada en las etapas de Preparación y diseño y la de Construcción.</p> <p>Los Especialistas de la UIP apoyarán y supervisarán los procesos de consulta en subproyectos.</p> <p>La Empresa Supervisora constatará el cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación a los procesos consultivos.</p>

ANEXOS

Anexo 1 Análisis Ambiental y Social del Subproyecto

1. Nombre y código del Centro Educativo

Escuela de Educación Parvularia Colonia Las Brisas. Código 11722.

2. Ubicación

La Escuela de Educación Parvularia Colonia Las Brisas está ubicada en el casco urbano, en la Urbanización Sierra Morena, Primera Etapa, Final Pasaje 17, 18 y 19, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. La institución se encuentra rodeada por casas de habitación y cuenta con acceso ubicado sobre una calle principal.

Área total de perímetro 897.80 m²

Generalidades:

- Departamento: San Salvador.
- Municipio: Soyapango. El municipio limita al norte con los municipios de Delgado y Tonacatepeque; el este, por Ilopango; al sur, por Santo Tomás y San Marcos; y al oeste, por San Salvador y Delgado.
- Coordenadas: 13.693081°N; -89.146992°O.

Imagen No. 1 Macro localización:

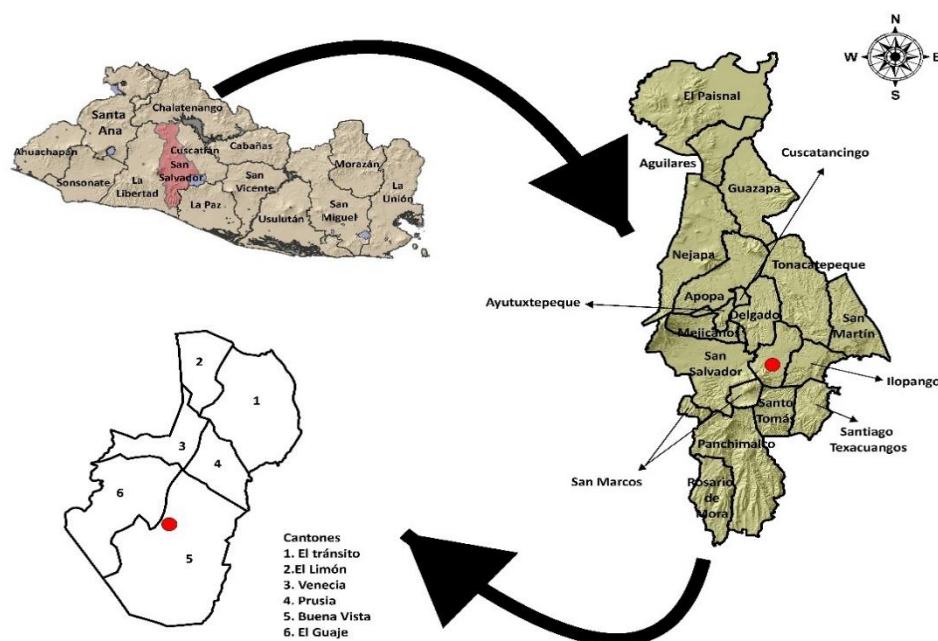


Imagen No. 1 Ubicación



2.1. Descripción del Centro Educativo

En la actualidad, el centro educativo consta de los siguientes módulos:

- Módulo “A” de 3 aulas y administración.
- Módulo “B” de 3 aulas.
- Módulo “C” consta de Servicios Sanitarios, 1 aula provisional y Salón de Usos Múltiples.

Esto hace un total de 6 aulas y 1 aula provisional de atención para niños y niñas. Además, la escuela cuenta con zonas complementarias como: bodegas, área recreativa, área verde, cocina, comedor y área de espera.

Los niveles de atención son los siguientes:

1. Parvularia 5 y 6 años
2. Educación inicial 3 años

Población beneficiada: 181 estudiantes de parvularia 5 y 6 años en el turno matutino, y 198 estudiantes en el turno vespertino; haciendo un total de 379 estudiantes, los cuales ya se encuentran inscritos en el SIGES. De este total 198 son niños y 181 niñas.

2.2. Necesidades del Centro Educativo

A continuación, se detallan las necesidades en infraestructura del centro educativo.

- centro escolar. Suministro e instalación de
- Módulo A: rehabilitación que consta de 3 aulas y demolición de la dirección existente y la construcción de una nueva administración con espacio suficiente para una bodega interna.
- Módulo B: rehabilitación que consta de 3 aulas.

- Demolición de rampa existente y gradas que tienen acceso entre el módulo A y el módulo B, construcción de una nueva rampa manteniendo la conectividad entre ambos módulos.
- Módulo C: Construcción nueva de Módulo de Servicios Sanitarios de 7 unidades.
- Rehabilitación de Aula Provisional como un Aula fija.
- Demolición del Salón de Usos Múltiples y construcción nueva del Salón de Usos Múltiples el cual será abastecido con mesas y sillas para poder ser utilizado como comedor en los horarios establecidos para los niños y niñas del Centro Escolar.
- Construcción nueva de un área de aseo (poceta de aseo y área de resguardo) e higienización.
- Rehabilitación de servicio sanitario para maestros.
- Módulo D: Rehabilitación de la Bodega de Alimentos.
- Demolición de las dos cocinas existente, construcción de una cocina y una tienda escolar.
- Demolición de bodega que se encuentra en el área del salón de usos múltiples y construcción de una nueva que servirá para el almacenamiento de mobiliario.
- Obras Exteriores: reconstrucción de canaleta de aguas lluvias en la parte posterior del Centro Escolar al mismo nivel de la canaleta ya existente.
- Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.
- Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la nueva propuesta.
- Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución más integral para el proyecto.
- Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de acuerdo con las normativas vigentes y especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.
- Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularia, está considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las especificaciones técnicas del proyecto.

CUADRO DE NECESIDADES

N°	ESPACIOS	SITUACION ACTUAL	INTERVENCIÓN
MÓDULO "A" – MÓDULO DE AULAS Y ADMINISTRACIÓN			
1	AULAS PARVULARIA		
	AULA 1	Regular	Rehabilitación de aula, cambio e instalación de cubierta de techos y mejoramiento de acabados

			(piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) Instalación de puerta secundaria.
	AULA 2	Regular	Rehabilitación de aula, cambio e instalación de cubierta de techos y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) Instalación de puerta secundaria.
	AULA 3	Regular	Rehabilitación de aula, cambio e instalación de cubierta de techos y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) Instalación de puerta secundaria.
	DIRECCIÓN	Regular	Se demolerá y se construirá una nueva dirección en el lugar existente con un área mayor.
MÓDULO “B” – MÓDULO DE AULAS DE PARVULARIA			
2	AULAS PARVULARIA		
	AULA 4	Regular	Rehabilitación de aula, cambio e instalación de cubierta de techos y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) Instalación de puerta secundaria.
	AULA 5	Regular	Rehabilitación de aula, cambio e instalación de cubierta de techos y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) Instalación de puerta secundaria.
	AULA 6	Regular	Rehabilitación de aula, cambio e instalación de cubierta de techos y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas metálicas, etc.) Instalación de puerta secundaria.
MÓDULO “C” – MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS			
3	SERVICIOS SANITARIOS		
	SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑOS Y S.S. NIÑAS	Mala	Se construirá nuevo módulo completo de servicios sanitarios.
	SERVICIOS SANITARIOS DE	Mala	Se construirá nuevo módulo de servicios sanitarios para uso de maestros y personas discapacitadas.

	MAESTROS y S.S DISCAPACITADOS		
MÓDULO “D” MÓDULO DE COCINA Y BODEGA			
4	COCINA 1 Y BODEGA		
	COCINA	Mala	Se realizará una ampliación en la cocina existente. Rehabilitación y suministro de la cocina, cambio e instalación de cubierta de techos y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas metálicas, etc.)
	BODEGA DE ALIMENTOS	Regular	Se rehabilitará la bodega, cambio e instalación de cubierta de techos y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas metálicas, etc.)
MÓDULO “C” SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y AULA PROVISIONAL			
5	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM)		
	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM)	Regular	Actualmente compartida con un aula provisional. Se propone la demolición del SUM y la construcción nueva de este, el cual podrá ser usado como área de comedor.
	BODEGA	Regular	Ya que se encuentra dentro del SUM y será demolido. Se propone la construcción de una nueva con mayor área.
	AULA PROVISIONAL	Regular	Se realizará una ampliación y en vez, de la pared cortina se levantará pared de bloque. Rehabilitación de aula, mejoramiento de instalación de techo y mejoramiento de acabados (piso, ventanas, defensas metálicas, etc.)
	TIENDA ESCOLAR	No existe	Construcción de tienda escolar.
ÁREAS COMUNES			
6	COMEDOR		
	ÁREA DE COMEDOR	Regular	Se demolerán los asientos usados como comedor y el comedor será trasladado al SUM.

7	COCINA 2		
	COCINA 2	Mala	Se demolerá el área de cocina para área verde y se construirá una tienda escolar.
8	ÁREA DE ESPERA		
	ÁREA DE ESPERA	Mala	Se demolerán los asientos utilizados como área de espera y se trasladará hacia el frente de la dirección. El área que quedará se usará como área recreativa.
9	RAMPA Y GRADAS DE ACCESO A MODULO B	Regular	Se demolerá la rampa para discapacitados y las gradas de acceso. Se construirá una nueva rampa en el pasillo del módulo B.
OBRAS EXTERIORES			
10	ACCESOS		
	MURO PERIMETRAL		
	CERCO DE MALLA CICLÓN	Regular	Se cambiará la malla protectora existente y se colocará una nueva en los espacios donde no exista.
	CANAleta DE AGUA LLUVIA	Mala	Se demolerá la canaleta de agua lluvia existente en la parte posterior de la escuela y se construirá uno nuevo.
	PORTONES DE ACCESO	Regular	Se realizará una limpieza, tratamiento y se pintarán.
11	ÁREA RECREATIVA		
	ÁREA DE JUEGOS	Mala	Se colocará grama sintética y suministro e instalación de nuevos juegos infantiles. Se desinstalará la estructura metálica existente para SUM y área de comedor.
12	ÁREA VERDE		
	ÁREA VERDE	Bueno	Se demolerá cocina y se reubicará área verde en un espacio más amplio.
13	TANQUE DE AGUA		

	TANQUE DE AGUA	Regular	Se moverá del sitio existente y se demolerá la superficie en el cual estaba montado. Se colocará sobre el muro reforzado.
--	----------------	---------	---


Registro fotográfico actual




Estado actual de las aulas



Estado actual de las aulas

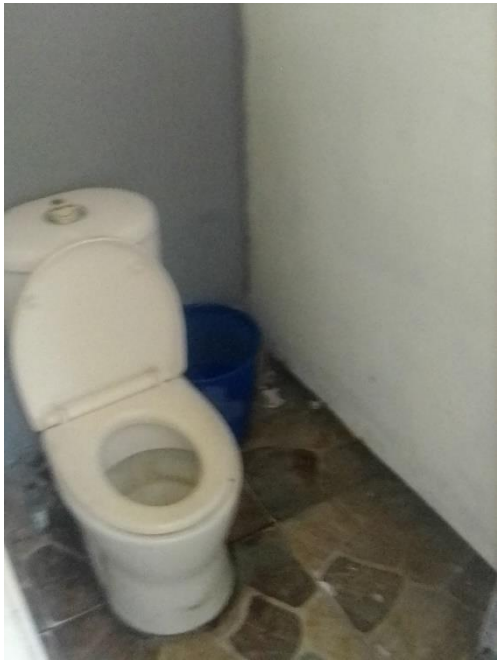

Estado Actual de los servicios sanitarios

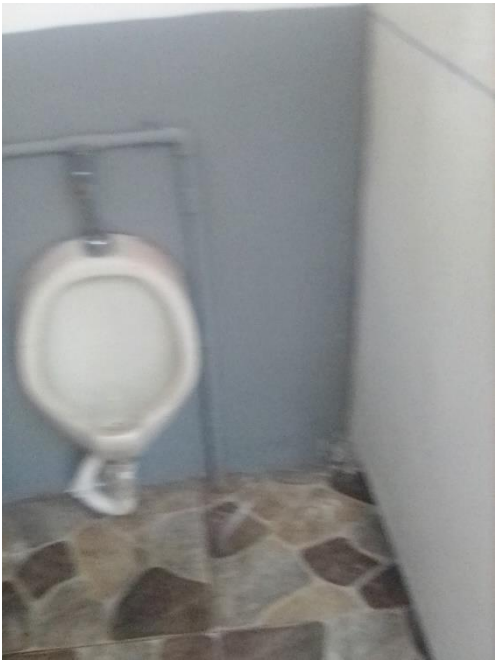

Estado Actual de los servicios sanitarios




Área de juegos infantiles del centro escolar



Salón de usos múltiples del centro escolar

2.3. Plano de ubicación de obras a intervenir

Imagen No. 3 Planta de Distribución Centro Educativo

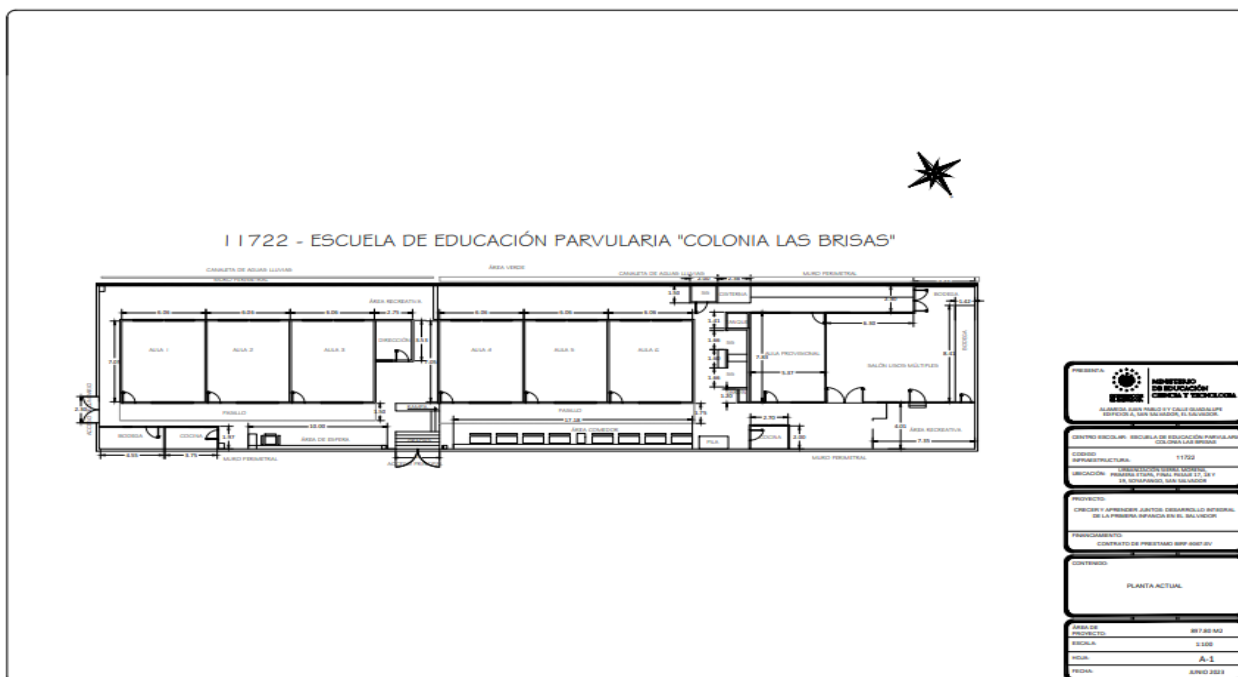

3. Contexto ambiental y socioeconómico del Centro Educativo

3.1. Aspectos Físicos

Soyapango se caracteriza por poseer una temporada de lluvias opresiva y nublada, la temporada seca es húmeda y mayormente despejada y es muy caliente durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 18 °C a 32 °C y rara vez baja a menos de 16 °C o sube a más de 34 °C.

El terreno del Centro Escolar donde presenta pendientes menores a 15°; no se encuentra cercano o dentro de un Área Protegida o a un Área de Conservación, tampoco a ecosistemas sensibles, ni a cárcavas. Los ríos más cercanos son el Río Sumpa a 1.6 Kms y el Río Las Cañas, a 2.2 Kms de distancia aproximadamente.

3.2. Medio Socio-Económico

Soyapango se encuentra ubicado al centro del departamento de San Salvador y pertenece al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Es la segunda ciudad más poblada del AMSS y la tercera de todo el país. Es conocida comúnmente como la "Ciudad Industrial". Soyapango limita al norte con los municipios de Delgado y Tonacatepeque; el este, por Ilopango; al sur, por Santo Tomás y San Marcos; y al oeste, por San Salvador y Delgado.

El municipio de Soyapango cuenta con los servicios básicos de agua potable, aguas negras, energía eléctrica, teléfono, internet, cable, etc. La ciudad cuenta con diferentes empresas como: Empresas ADOC, Empresas LIDO, Productos Diana, Industrias las Cascadas las cuales tienen sus sedes en dicha ciudad, generando un número importante de empleos en el municipio y en los alrededores. Existen alrededor de 42 grandes empresas, que absorben el 36% de la mano de obra local, destacándose los siguientes: productos alimenticios (pastas, café, harinas, boquinas, bebidas, jugos enlatados, etc.), textiles, artículos de cuero, cerillos, pasta dental, mobiliario casero y de oficina, cosméticos, equipos de aire acondicionado, productos farmacéuticos, pinturas, detergentes, lejías, productos avícolas, así como objetos de papel y carbón. Se destacan los grandes centros comerciales, como Plaza Soyapango, Unicentro y Plaza Mundo.

Por otra parte, se pueden encontrar más de 5000 comercios informales que se ganan la vida ocupando las aceras y calles de la ciudad con sus ventas.

Aunque el municipio es eminentemente urbano donde la principal actividad económica es el comercio, en la zona rural se desarrollan actividades agrícolas, especialmente el cultivo de granos básicos y cereales.

Soyapango cuenta con 145 instituciones educativas; 58 públicas y 87 privadas, a nivel básico e intermedio. Y a nivel superior, cuenta con la Universidad Don Bosco, que es de carácter privado.

En su territorio existen 7 centros de salud pública conformados por 2 hospitales, uno de ellos con especialidad Psiquiátrica, 2 centros médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) uno en la colonia Prados de Venecia y otro en la colonia Amatepec, 3 Unidades de Salud ubicadas en la Colonia Guadalupe, Colonia Amatepec y Colonia San Fernando. Asimismo, existen 10 clínicas de asistencia comunal. Además, a nivel privado funcionan alrededor de 500 consultorios médicos, incluyendo los establecidos por algunas iglesias; y la comercialización de medicamentos se realiza en aproximadamente 300 farmacias.

También existen en el municipio oficinas gubernamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Ministerio de Hacienda (MH), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de

la República (FGR), la Dirección General de Gráficos y el Rastro Municipal que pertenece a la Municipalidad de San Salvador.

Es importante destacar que por el municipio de Soyapango pasa una de las vías más transitadas del país como lo es el Bulevar del Ejército, este sirve de comunicación entre el centro de San Salvador y la zona oriental del país, esta carretera pasa por la zona industrial de Soyapango. Otra arteria muy importante que pasa por este municipio es la Autopista Este-Oeste conocida también como Carretera de Oro, que comunica al Municipio de Soyapango al oriente con Ilopango y al occidente con Ciudad Delgado. Siendo una vía rápida de cuatro carriles y conecta con la Carretera Troncal del Norte.

No deja de ser relevante que, Soyapango ha sido desde hace varias décadas un municipio asediado por las pandillas y maras, y que después de más de un año de Régimen de excepción aplicado por el GOES para controlar el territorio y reducir la criminalidad.

Por otra parte, se ha verificado que el municipio no se encuentra entre los listados en el MPPI como con posible presencia de comunidades y se ha realizado también una verificación con las autoridades de MiCultura. No se considera necesaria la consulta específica a Pueblos Indígenas ni preparación de un Plan de Pueblos Indígenas.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tienda escolar; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura afectada (negocios), identificando sus características y condiciones actuales de la infraestructura, verificar si con las obras a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejarán de percibir dichos ingresos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros educativos. En el caso de los 111 centros educativos a intervenir, se encuentran Escuelas de educación Parvularias (conocidas como parvularias puras), Centros escolares (en donde se atiende el nivel de parvularia, primero, segundo y tercer ciclo), Complejos Educativos (donde cuentan con atención a parvulos, primero, segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato); así como Escuelas de Educación especial.

En las visitas realizadas en el grupo 1, que comprende 28 centros educativos, se ha identificado un grupo el cual tendrá un impacto social o pérdida de ingresos económicos en el tiempo de ejecución de los subproyectos. Estos son las estructuras que funcionan como tienda escolar, en donde han sido identificados 7 tiendas escolares en 7 centros educativos. Estos funcionan con administración de los Consejos Directivos Escolares y la persona que se dedica a la venta de alimentos preparados, frituras, dulces y bebidas. En los centros educativos donde se encuentren este tipo de negocios, MINEDUCYT ha establecido un “Plan de Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto.

4. Descripción del Proyecto

4.1. Descripción de las Obras del Proyecto

Departamento	San Salvador
Municipio	Soyapango
Código	11722
C.E	Escuela de Educación Parvularia Colonia Las Brisas
Director	María Cristina Reyes de Cruz
Teléfono	
Aulas	6
Espacios Complementarios	Dirección, cocina, bodega, salón de usos múltiples
Cantidad de estudiantes por turno	181 matutino/198 vespertino
OBRAS EXTERIORES	
Cerco perimetral (construcción de tapiales)	Construcción de tapial perimetral, ver especificaciones técnicas.
Entrada	A intervenir según criterios de Mi Nueva Escuela y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas Discapacitadas y a las Normas Técnicas de Accesibilidad (reemplazo de portón, y techado de vestíbulo).
Parqueo	No aplica
Área verde	No aplica
Cancha	No aplica
ACABADOS	
Cielo falso	Suministro e instalación en todas las aulas y espacios administrativos. (ver especificaciones técnicas)
Pintura	Todo el centro escolar (ver especificaciones técnicas y manual de diseño MNE)
Pisos	Sustitución de piso en 6 aulas (ver especificaciones técnicas)

Puertas	Suministro e instalaciones de puerta metálica en todas las aulas y espacios administrativos. (ver especificaciones técnicas)
Ventanas	Sustituir (Las de todo el centro educativo (ver especificaciones técnicas)
Techo	Suministro e instalación en todas las aulas y espacios administrativos que tengan cubierta de asbesto cemento u otro material diferente a lámina galvanizada. (ver especificaciones técnicas)
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	
AGUA POTABLE	
Bomba de cisterna	No aplica
Flotador	No aplica
Válvulas	No aplica
Limpieza de cisterna	No aplica
Tuberías	Sistema de tuberías en funcionamiento
Cisterna o tanque elevado	Tanque mantenimiento y limpieza
AGUA NEGRAS	
Fosas sépticas	Diseño y construcción (ver especificaciones técnicas)
Pozos de absorción	No aplica
Biodigestor (solo obra civil)	Incluir el espacio en la etapa de diseño que abarque 10-12 m ² en un sector no mayor a 10 metros del área de cocina. Para el piso dentro de los 10 m ² no considerar intervención. Esta actividad se debe llevar en conjunto con quien instalará, especificado en los documentos contractuales.
Campo de riego	No aplica
Tuberías de drenaje	No aplica
Trampa de grasa	A intervenir (construir en cocina)
AGUAS LLUVIAS	

Canales de aguas lluvia	Suministro e instalación de canales en todas las cubiertas de módulos de aulas y áreas administrativas (ver especificaciones técnicas)
Canaletas	Diseño y construcción de red de canaletas en todo el centro escolar.
Bajada de agua lluvia	Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias en todos los módulos de aulas y áreas administrativas.
Cajas tragantes	Limpieza y remoción de sedimentos, sustituir rejillas de protección (ver especificaciones técnicas)
Tuberías	No aplica
Cosecha de agua lluvia	Diseño y construcción de cisterna de captación de aguas lluvia.
SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES	
Lavamanos	Sustitución de todos los artefactos dañados (según Especificaciones Técnicas)
Duchas	No aplica
Inodoros Universales	No aplica
Inodoros Adultos	No aplica
Inodoros Estudiantes	No aplica
Inodoros Parvularia	Desmontar inodoros existentes e instalar inodoros con sus accesorios, según especificaciones técnicas MINEDUCYT
Lava brazos	No aplica
Mingitorios	Sustitución de todos los artefactos (según Especificaciones Técnicas)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
Red eléctrica	A diseñar y sustituir en todo el centro escolar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, considerando 8 tomas por aula, luminarias. Toda propuesta de diseño considera la implementación de criterios de eficiencia energética o sistema de energía renovable.
Paneles solares	Implica construcción de área para ubicar paneles solares sobre techos que abastezcan como mínimo un 20% del consumo total del centro educativo. Dicha alimentación de energía deberá conectarse a la iluminación y ventilación en interiores. Esta actividad se debe

	llevar en conjunto con quien instalará especificado en los documentos contractuales)
CONSTRUCCIÓN	
Aulas	No aplica
Aula Parvularia	No aplica
Cocina	No aplica
Comedor	No aplica
Bodega	No aplica
Servicios sanitarios	Diseño y construcción de baño con accesibilidad universal y baño para adultos.
Acera	A intervenir en áreas internas del centro escolar, para conexión entre módulos. (si no hay conexiones, construirlas)
Rampa	A intervenir en áreas internas del centro escolar, para conexión entre módulos. (si no hay conexiones, construirlas) y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas Discapacitadas y a las Normas Técnicas de Accesibilidad.
Muro de retención	-
Huerto casero	No aplica
COMPLEMENTO	
Señalética	Colocación de señalización horizontal y vertical, en rutas de acceso, punto seguro y salidas de emergencia o lo que indiquen las especificaciones técnicas del MINEDUCYT
COMENTARIOS	En área de juegos, construcción de piso cerámico para exteriores. Incluye instalación de iluminación y cerramiento de techo con pared, ya que en invierno el azote de la lluvia moja toda el área.

Para la fase de operación de los CE, una vez terminada la obra, se deberán definir y aplicar procedimientos o buenas prácticas sobre la gestión de residuos, aguas servidas, aguas lluvias y planes para garantizar el suministro de agua potable en los CE, tomando en cuenta la infraestructura existente y los desafíos y contexto de los CE. Se debería garantizar que existen procedimientos de preparación ante emergencias (como tormentas, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros) y para lo cual se realizan simulacros con las comunidades educativas

4.2. Inversión Estimada y Tiempos:

La inversión estimada para la realización de la obra es de \$-----y se desglosa a continuación:


No.	DESCRIPCIÓN/PARTIDA	TOTAL PARTIDA
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	
	IMPREVISTOS (%)	
	COSTO INDIRECTOS (%)	
	SUB TOTAL 1 (COSTO DIRECTO+IMPREVISTO+COSTO INDIRECTO)	
	IVA (13%)	
	SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + IVA)	
	ARANCELES DE CONSTRUCCIÓN (%) (PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)	
	COSTO TOTAL	

Las actividades deberán durar ----- meses una vez que se movilice el contratista al sitio.

Cronograma de las obras:

4.3. Plano de las Obras de Mejoramiento

Imagen No. 4 Plano de obras de mejoramiento

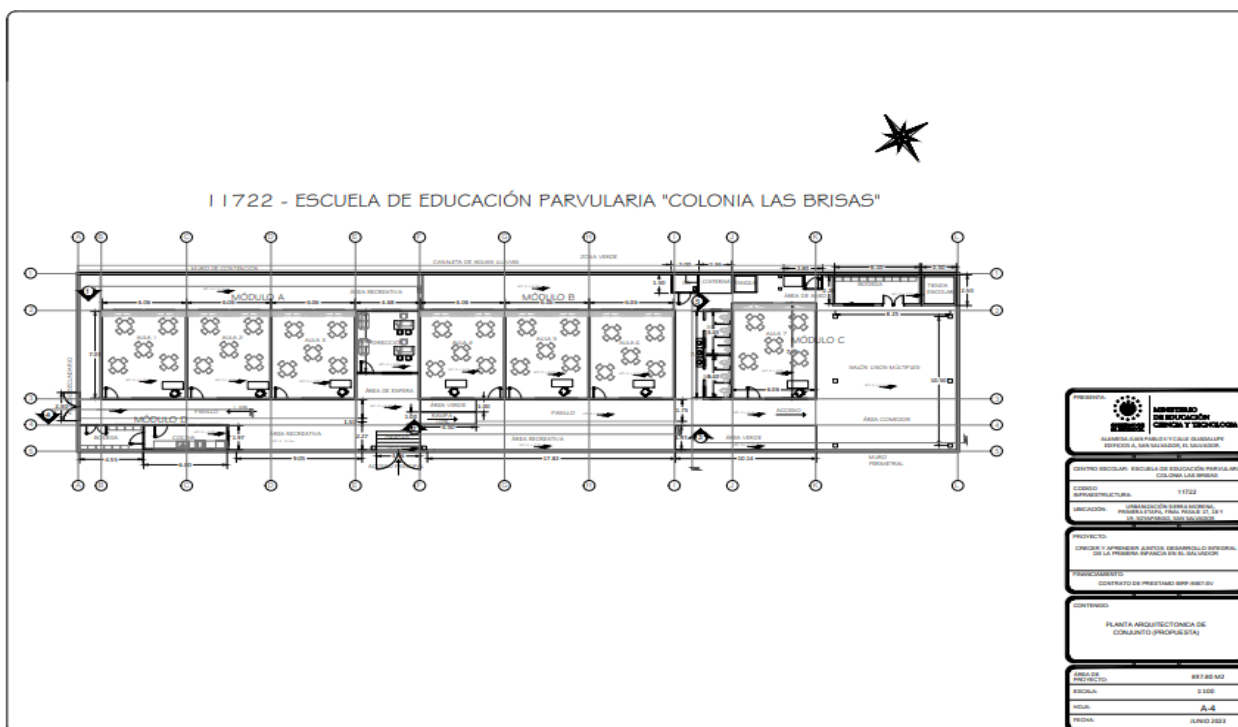

4.4. Fichas de Evaluación Ambiental y Social

Ficha de Evaluación Ambiental y Social General

1. Datos Generales				
Departamento: San Salvador	Municipio: Soyapango		Coordenadas: Latitud: 13.693081°N Longitud -89.146992°O	
CÓDIGO: 11722	Nombre del Centro Escolar: Centro de Educación Parvularia "Colonia Las Brisas"		Área a ser ocupada por la actividad (M ²): 300 m ²	
Tipo de área intervenida:	Urbana	<input checked="" type="checkbox"/>	Rural	<input type="checkbox"/>
Tipo de actividad / obra:	Demolición	<input type="checkbox"/>	Rehabilitación	<input checked="" type="checkbox"/>
	Construcción/reconstrucción	<input checked="" type="checkbox"/>	Operación / manutención	<input type="checkbox"/>

Breve descripción de la(s) actividades(s) / obra(s):				
Rehabilitación de todas las obras exteriores del centro escolar (Pintura general, cerco perimetral, aceras y área verde). Rehabilitación de acabados en general (cambio de cielo falso, cambio de techo, cambio de piso, sustitución de puertas y ventanas). Rehabilitación de batería de sanitarios y sistema eléctrico, sistema de agua potable aguas negras y lluvias.				
Construcción de servicios sanitarios.				
Identificación de potenciales impactos:				
Preevaluación de los impactos y riesgos ambientales	Si	No	Descripción / Comentarios:	Medidas de mitigación:
Está el Centro Escolar dentro, adyacente o cerca de los siguientes:				
Áreas protegidas / bajo régimen de protección / zonas de amortiguamiento		X	De acuerdo al visualizador de Información Geográfica de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el centro escolar no se encuentra cercano a Áreas Protegidas o zonas de amortiguamiento. Ubicado en zona urbana	Ninguna
Áreas de ecosistemas sensibles (incl. estuarios, humedales, bosques)		X	El centro escolar se encuentra en una zona declarada como urbana	Ninguna
Sitios de interés cultural o arqueológico		X	El centro escolar no se encuentra en sitios de interés cultural o arqueológico	Ninguna
Áreas vulnerables a fenómenos naturales / sensibles a los impactos del cambio climático (inundaciones, deslizamientos, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas)	X		Según el Visualizador de Información Geográfica de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el centro escolar no se encuentra cercano a zonas vulnerables a fenómenos naturales o sensibles a los impactos al cambio climático. Sin embargo, al sur del centro escolar se	Considerar protocolos de emergencia en caso de sismos

			encuentra un talud. Tomando en cuenta que los fenómenos naturales cada año aumentan su intensidad, este talud podría representar un riesgo.	
Ríos y arroyos (que distancia)		X	Los ríos más cercanos son el Río Sumpa a 1.6 Kms y el Río Las Cañas, a 2.2 Kms de distancia aproximadamente.	Ninguna
¿Hay especies de fauna o flora raras o en peligro en el área? ¿Cuales?	X		La directora del centro escolar manifestó que iguanas utilizan el techo del centro escolar para termorregularse durante la mañana o la tarde. Estas provienen del área verde ubicada al sur del sitio. La iguana está catalogada como especie amenazada por el MARN.	Charlas de inducción a los trabajadores al momento de iniciar las labores de reconstrucción para concientizar y evitar que las capturen. Incluir en el reglamento interno de los trabajadores un apartado de protección a la fauna silvestre.
¿Las obras podrán aumentar el acceso a áreas protegidas o áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad?		X	No hay Áreas Naturales Protegidas cercanas al centro escolar	Ninguna
¿Las obras requerirán la extracción de materiales (piedra, arena)? Por favor indicar si será necesaria la apertura de nuevas áreas para extracción de materiales y/o si hay Bancos de Materiales cerca del Centro Escolar.	X		Se requerirá extraer material a utilizar en la ejecución del proyecto el cuál será proveniente de bancos de préstamo existentes que cuenten con permiso ambiental vigente	Se deberá tener todos los permisos vigentes de extracción de material pétreo. El contratista debe identificar los bancos de materiales presentes en la zona, así como también, la de verificar que estos cuenten con los permisos respectivos

¿Las obras podrán involucrar movimientos de tierra y/o alterar los patrones de erosión del suelo?	X		Las obras por realizar involucran movimientos de tierra.	<p>Se aplicarán las medidas establecidas en el Programa de Manejo y Protección de Materiales, y Equipos de Construcción.</p> <p>Realizar cobertura vegetal que permita la permeabilidad del lugar.</p>
¿Las obras podrán generar polvo?	X		La actividad generará material particulado, se deberá considerar a los trabajadores el EPP adecuado.	<p>Se aplicarán las medidas establecidas en el Procedimiento de Calidad de Aire.</p> <p>Promover la prevención aplicando los protocolos de emergencia y riesgos dirigidos hacia la comunidad y a los trabajadores de la obra.</p> <p>Realizar humectación en el lugar. Utilizar el EPP adecuado para cada actividad</p>
¿Las obras podrán generar ruido?	X		El uso de maquinaria generará ruido, se deberá considerar medidas de prevención y mitigación, tal como realizar los trabajos en horas diurnas, equipo y maquinaria en buen estado, decibeles adecuados.	<p>Se aplicarán las medidas del Procedimiento de Gestión de Ruidos y Vibraciones.</p> <p>Realizar actividades laborales en horarios comprendidos entre las 06:00 a.m. y las 06:00 p.m., en acuerdo con la comunidad afectada.</p> <p>Establecer horario de trabajo. Utilizar el EPP adecuado para cada actividad.</p>

¿Las obras involucrarán la gestión y eliminación de escombros y/o otros residuos peligrosos resultantes de las actividades de demolición, constructivas o relacionados a pasivos ambientales (fosas sépticas, pozos, letrinas)? ¿Cuales?	X		La actividad generará escombros y residuos propios del descarte de construcción.	Utilizar el protocolo de desalojo de desechos peligrosos. Llevar a sitios de disposición final con la debida autorización.
¿Además de estos, la actividad generará residuos sólidos y líquidos? ¿Cuáles?	X		La actividad, generará desechos sólidos comunes, debido al incremento de personal en la obra. Se deberá contar con depósitos rotulados. Tren de aseo no llega hasta el centro escolar, debido a que las calles de acceso son demasiado angostas por lo que estos son recolectados por personal del lugar y depositados en contenedores ubicados a 100 mts. y 260 mts. de distancias del sitio.	Los desechos sólidos comunes se deberán desalojar por el contratista, quien deberá llevarlos a sitios debidamente autorizados.
¿Las obras podrán introducir riesgos asociados a la afluencia laboral? ¿Cuáles?	x		La actividad no generará riesgos asociados a la afluencia laboral. Se prevé que el personal técnico que viva demasiado lejos de la zona de trabajo se albergue en la casa que se va a rentar como plantel y adicionalmente gran parte del personal de campo es de la zona.	Impartir charlas de Seguridad e Higiene Ocupacional, de uso adecuado de EPP, normas de conducta, etc.
¿Hay otras actividades propuestas cerca de la obra que aumentarían alguno de los impactos ambientales listados anteriormente? ¿Cuáles y cómo?		x	Por el momento no hay obras cercanas que puedan ocasionar impactos ambientales adicionales.	En caso de existir un riesgo no identificado, se deberá actuar para su remediación.
Preevaluación de impactos y riesgos sociales	Si	No	Explicación / Comentarios:	
¿La escuela cuenta con escritura en nombre del MINEDUCYT?		X	Inmueble a nombre del MINEDUCYT, Traspasado	Ver anexo. Documento de

			en calidad de donación por la Alcaldía Municipal de Soyapango	legalidad del terreno a nombre de MINEDUCY.
¿Las obras requerirán la reubicación temporaria del centro educativo a otra ubicación durante las obras? ¿Cuántas personas requerirían de reubicación temporal?	✓		Reubicación temporal de alumnos; matutino 181 niños y vespertino 197, Total de 378 alumnos, 9 docentes, directora	Será activado el Plan de Reubicación Temporal para estudiantes, personal docente y administrativo.
Listar las alternativas / sitios de ubicación temporaria de estudiantes, distancias del centro educativo y capacidad de cada sitio (número de niños).	✓		Los sitios de reubicación temporal se encuentran en proceso de identificación.	Los sitios serán seleccionados considerando los criterios establecidos en el Plan de Reubicación Temporal.
¿La obra causará el desplazamiento físico permanente de personas o familias?		X	No se causa el desplazamiento de personas o familias.	Ninguna.
¿La obra causará afectaciones a cultivos o estructuras propiedad de terceros dentro del terreno de la obra?		X	Las obras propuestas son internas.	Ninguna.
¿Hay afectaciones a familias y/o a sus viviendas?		X	No, la escuela no cuenta con vecinos a los lados.	Ninguna.
¿Hay afectaciones a negocios y/o los medios de vida de personas?		X	No hay negocios internos, ni externos en la cuadra donde se encuentra la escuela.	Ninguna.
¿Hay afectaciones a grupos vulnerables (pueblos indígenas, mujeres, niños, afrodescendientes) y/o sus terrenos?		x	Los estudiantes que serán reubicados temporalmente mientras duren las obras en el CE.	Se aplicarán las medidas contempladas en el Plan de Reubicación Temporal.
¿La actividad requerirá que se establezca campamentos para trabajadores de construcción? ¿De no ser el caso, hay viviendas para alquilar para los trabajadores en el municipio?		X	No se requerirá campamentos para trabajadores.	Ninguna.

¿La actividad requerirá la creación de acceso temporal o caminos de acarreo?		X	<p>No es necesario, porque ya se cuenta con accesos.</p> <p>Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los accesos son angostos. Camiones no pueden ingresar.</p>	<p>Cualquier material deberá dejarse en la calle principal y acarrearase hasta la escuela.</p> <p>Se puede solicitar apoyo de los vecinos y ADESCO de la colonia para el cuido de material.</p>
¿La actividad podrá afectar a los padrones de tránsito local / seguridad vial de comunidades cercanas?	X		<p>Por el transporte de material para las obras, niños y niñas que juega en la calle, movilización en bicicletas o animales en la calle.</p>	<p>Se contará con personal de seguridad y control de tránsito vehicular, en caso de ser necesario.</p> <p>Estacionar los vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa contratista o de entidades vinculadas al proyecto en áreas que no representen obstrucción en las rutas de evacuación y vías de circulación del área de influencia directa.</p>
¿La actividad podrá introducir riesgos de seguridad laboral a los trabajadores comunitarios? ¿Cuáles?		X	No habrá trabajo comunitario.	Ninguna.
¿La actividad podrá introducir riesgos de seguridad a los miembros de la comunidad educativa (niños, padres de familia, maestros)? ¿Cuáles?	X		<p>Riesgos de acoso sexual a mujeres, maestras y niños y niñas.</p> <p>Desórdenes públicos por parte de los trabajadores.</p>	<p>Se implementarán charlas de inducción a todo el personal de campo y oficina del contratista sobre el Código de conducta y las medidas a tomar.</p>

¿La actividad podrá introducir riesgos de enfermedades contagiosas? ¿Cuáles?	X		ITS y enfermedades respiratorias (COVID 19 y otras).	Trabajar en la prevención con la implementación de las medidas de bioseguridad y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Charlas de seguridad e higiene ocupacional y proveer a los trabajadores de mascarillas, alcohol gel y sitios de lavado de manos. se puede hacer en coordinación con los promotores de salud.
¿Hay otras actividades o proyectos propuestos que aumentarían alguno de los impactos sociales listados anteriormente? ¿Cuáles y cómo?		X	Ninguno.	Ninguno.
Diagnóstico de servicios básicos:	Si	No	Explicación / Comentarios:	
¿Se cuenta con suministro de agua en la escuela? Indicar tipo (pozo, captación pluvial, red, etc.) Especificar como se hace el suministro, como se almacena el agua, frecuencia de suministro.	X		El centro educativo cuenta con sistema de abastecimiento de red pública y sistema de tanque elevado. El agua potable cae un día sí y un día no. Cuenta con una cisterna, pero no le funciona la bomba y necesita mejoras.	Mantenimiento preventivo. Compra de bomba para la cisterna y realizar mejoras en la cisterna.
¿Cómo se maneja las aguas servidas? Red de alcantarillado sanitario, sistema de tratamiento interno, otros. Especificar.	x		Sistema de tratamiento interno.	Ninguna.
¿Existen servicios sanitarios en la escuela? Indicar tipo, numero, estado y relación por número de estudiantes.	x		Los estudiantes tienen a disposición 5 servicios sanitarios lavables, los cuales necesitan revisión,	Los sanitarios de los niños y niñas necesitan cambiarse y que se coloquen

			ya que no tienen la suficiente presión para desalojar los desechos. Un mingitorio que no está en buen estado. Y un baño para el personal en buen estado.	otros que funcionen correctamente. Mantenimiento.
¿Cuenta con suministro de energía eléctrica? Indicar tipo de sistema existente.	x		Alumbrado eléctrico suministrado por CAESS	La red eléctrica no se cambia desde que se construyó la escuela.
¿Cómo se hace la gestión de residuos sólidos actualmente en la escuela? ¿Hay Basurero cerca de la escuela?	x		La zona de la escuela cuenta con servicio de tren de aseo municipal, sin embargo, este no llega hasta el centro escolar debido a que las calles de acceso son angostas, por lo que el personal del centro recolecta los desechos y los deposita en contenedores ubicados a 100 mts. y 260 mts. de distancias de la escuela.	Mejoramiento en la recolección de la basura para que no se hagan promontorios y generen focos de contaminación.
¿Cuenta con otro tipo de servicios? Por favor especificar.	x		La escuela cuenta con programa de alimentos y el programa círculo de familia.	PASE
Categorización ambiental y social según el MGAS del Proyecto:				
¿Cuál es el nivel de riesgo de la actividad propuesta?	Bajo / Moderado	Substantial	Alto	
	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Comentarios/justificación: La categorización del centro escolar se ha determinado por medio de la información obtenida a través del Visualizador de Información Geográfica de Evaluación Ambiental (VIGEA) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, herramienta que facilita el proceso de Evaluación Ambiental de las Actividades, obras o proyectos, y que contiene una base de datos de diferentes tipos de capas a nivel nacional, como son riesgos ambientales, áreas protegidas, áreas de conservación, sitios arqueológicos, ríos, poblados principales, etc.			
¿Cuál es el tipo de	Diagnóstico Preliminar	PGAS	EIA& PGAS	

evaluación ambiental y social recomendado?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentarios/justificación: Las obras a realizarse en el Centro Escolar requieren de la aplicación de diferentes protocolos para la disminución de los riesgos ambientales y sociales del personal tanto de la escuela como de los trabajadores, así como también de las personas que habitan en los alrededores del sitio a intervenir		
Organizaciones con presencia local y personas claves que podrán ser contactadas durante actividades futuras de consulta:			
Organización / persona:	Área de interés / actividad:	Contacto:	
	Directora de la escuela		
1. Comentarios adicionales:			
Evaluación realizada por los especialistas:			
Nombre: GODOFREDO LOPEZ		Fecha: 08 diciembre 2022	
Responsabilidad / Título: Técnico del MOP		Firma:	
Evaluación verificada por:			
Nombre: Flor de María Escobar		Fecha:	
Responsabilidad / Título: Especialista Ambiental/BIRF		Firma:	
Nombre: Juana Francisca Flores		Fecha:	
Responsabilidad / Título: Especialista Social/BIRF		Firma:	

Ficha Social Complementaria

	Si	No	Descripción / Comentarios:	Medidas de mitigación:
Riesgos sociales				
• Existen personas viviendo en el CE	<input type="checkbox"/>	✓		
• Existe población indígena (Estudiantes) o en los alrededores del CE	<input type="checkbox"/>	✓		
• Existen negocios dentro del CE	<input type="checkbox"/>	✓		
• Niños vulnerables	✓	<input type="checkbox"/>	<p>Autistas: 2 niños y 2 niñas.</p> <p>Retardo mental: 1 niña.</p> <p>Problemas auditivos: 2 niños y 1 niña.</p> <p>Cantidad por sexo: 4 niños y 4 niñas.</p>	Se han considerado las vulnerabilidades en el diseño de la obra y en el Plan de Reubicación Temporal.
Acceso al CE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vías de acceso al CE	✓	<input type="checkbox"/>	<p>Carretera asfaltada primaria.</p> <p>Los niños se movilizan a pie, en pick up, buses y mototaxis.</p>	
Lugares de donde provienen los niños	✓	<input type="checkbox"/>	<p>Cantones: agua Zarca, Sitio Viejo. Caserío Buenos Aires, Colonia Helen 1, 2 y 3, Comunidad Miranda y Colonia La Palma.</p>	

Servicios básicos con los que cuenta el CE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Agua potable	✓	<input type="checkbox"/>	Todos los días.	ANDA.
Servicios sanitarios	✓	<input type="checkbox"/>	10 de niños, 1 urinario, y un sanitario de adultos.	Todos funcionan.
Energía eléctrica	✓	<input type="checkbox"/>		
Recolección de basura	✓	<input type="checkbox"/>	Hay basureros en el CE. 2 veces a la semana por la Alcaldía Municipal.	
Servicio de internet	✓	<input type="checkbox"/>		
Teléfono fijo	<input type="checkbox"/>	✓		
Programa de alimentos	✓	<input type="checkbox"/>	Cocinan con gas.	
Otros	✓	<input type="checkbox"/>	Villa familiar comunitaria.	Educación inicial, niños y niñas de 0 a 3 años de edad (población de 100 niños y niñas).
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Otros riesgos	<input type="checkbox"/>	✓		
Venta de bebidas alcohólicas cerca del CE	<input type="checkbox"/>	✓		
Prostíbulos	<input type="checkbox"/>	✓		
Trata de personas	<input type="checkbox"/>	✓		
Venta de drogas	<input type="checkbox"/>	✓		
Existen ventas alrededor del CE	✓	<input type="checkbox"/>	Se encuentran negocios y viviendas.	

Organización				
Cuentan con CDE	✓	<input type="checkbox"/>	6 propietarios mujeres y 6 suplentes mujeres.	
Informar a la directora sobre Consulta Informativa	✓			
Comentarios adicionales:				

Ficha Ambiental Complementaria

Nombre de CE:	Escuela de Educación Parvularia Colonial Las Brisas	Dirección:	Urbanización Sierra Morena I final de pasajes 17, 18 y 19.
Código de CE:	11722	Municipio:	Soyapango
<p>1 Árboles y Arbustos</p> <p>1.1 Especifique la cantidad de árboles con diámetro de altura al pecho (DAP) mayor o igual a 20 cm en el área del proyecto</p> <p>No existentes</p> <p>1.2 ¿Qué cantidad de árboles con DAP mayor o igual a 20 cm, talará en la ejecución del proyecto?</p> <p>0</p> <p>1.3 Especifique la cantidad de árboles con diámetro de altura al pecho (DAP) mayor o igual a 50 cm en el área del proyecto.</p> <p>No existentes</p> <p>1.4 Especifique la cantidad de árboles a talar con DAP mayor o igual a 50 cm</p> <p>0</p>			

1.5 Especifique la cantidad de arbustos existentes en el área del proyecto

No existentes

1.6 Especifique la cantidad de arbustos a talar

No aplica

1.7 ¿Se ha observado la existencia de flora o fauna amenazada o en peligro de extinción? Verificar listado:
<https://goo.gl/yyWEYV>

No se observan

Observaciones / Comentarios

La escuela no presenta árboles o arbustos dentro del área, a excepción de algunas plantas ornamentales. La directora manifiesta que en el lugar se asolean iguanas, las cuales provienen de una zona con vegetación contigua al centro escolar

2 Existen pasivos ambientales

Ubicación en Centro Educativo

Llantas

SI

☐

NO

X

Fosas sépticas en desuso

SI

☐

NO

X

Letrinas

SI

☐

NO

X

Tuberías

SI

☐

NO

X

Cubierta de techo

SI

☐

NO

X

Otros

Observaciones / Comentarios

3 Manejo de desechos sólidos (basura)

Tren de Aseo municipal

SI

☒

NO

☐

Tren de Aseo privado

SI

☐

NO

X

Zona de contenedores

☒☐

Compostaje	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Quema	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Si, existe tren de aseo, que días pasa recolectando los desechos sólidos. Dos veces por semana

Observaciones / Comentarios

Tren de aseo no llega hasta el centro escolar, debido a que las calles de acceso son demasiado angostas por lo que estos son recolectados por personal del lugar y depositados en contenedores ubicados a 100 mts. y 260 mts. de distancias del sitio.

4 Existen Riesgos Ambientales

Talud	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Quebrada / Rio	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesibilidad	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Otros	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones / Comentarios

Al sur del centro escolar se encuentra un talud. Tomando en cuenta que los fenómenos naturales cada año aumentan su intensidad, este talud podría representar un riesgo, en la etapa de construcción se debiera evaluar si afecta al Centro Escolar y si es necesario, el contratista deberá incluirlo en el PGAS-C La zona donde se ubica el Centro Escolar está identificada por el MARN de riesgo por Flujos Piroclásticos provenientes del Volcán de San Salvador.

5 Fosa séptica o Biodigestor

Se cuenta con Fosa séptica o Biodigestor

SI ☐ NO ☒

Mantenimiento SI ☐ NO ☐

Periodicidad

Observaciones / Comentarios

6 Trampa de Grasa

Se cuenta con Trampa de Grasa	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimiento	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Periodicidad	<input type="text"/>			
Observaciones / Comentarios				

7 Manejo de Sistema Hidráulico

a) Agua Potable

Tubería	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Pozo	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Compra pipa	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Es agua apta de consumo humano	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Se han realizado análisis al agua	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Otro	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Observaciones / Comentarios

b) Aguas Negras

Red publica	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Fosa séptica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Biodigestor	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Otro	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones / Comentarios

c) Aguas Grises

Red publica	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Fosa séptica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones / Comentarios

Biodigestor	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otro	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
d) Aguas Lluvias					Observaciones / Comentarios
Alcantarilla publica	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Cuerpo receptor (rio, quebrada, lago)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observaciones / Comentarios					
10	Valoraciones puntuales: Anotar todo aquello que se considere vulnerabilidad Ambiental, y no previstas en la ficha, criterio de personal técnico Ambiental que levante la ficha.				
	1. Se observa un talud al sur de la propiedad, , pero ya no representa riesgo porque ya se estabilizo y se construyó nuevo muro.				
	2.				
	3				
	4				
	5				

4.5. Evaluación del Terreno

La propiedad del terreno donde funciona la escuela de educación parvularia Colonia Las Brisas del municipio de Soyapango, en el departamento de San Salvador, se encuentra en comodato, de acuerdo con la escritura le pertenece a la Alcaldía Municipal de Soyapango. La evidencia de la documentación se encuentra en el anexo “Documentos de Legalidad de Terreno a Nombre de MINEDUCYT”

4.6. Permisos y nivel de riesgo socio ambiental

A la fecha el MINEDUCYT está realizando la gestión ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN, el trámite de la obtención del Dictamen técnico para el Anteproyecto, si en caso existiera

medidas de mitigación, prevención o atenuación el Contratista deberá hacerlas cumplir de acuerdo al Dictamen en la etapa que le corresponda.

Tabla de permiso y factibilidades

Permiso	Entidad	Responsable	Status	Número de permiso/referencia/factibilidad
Resolución Ambiental	MARN	MINEDUCYT	Realizado	MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023*
Tala de árboles (donde aplique)	Contratista / Municipalidad	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
Permiso de recolección de Desechos Solidos	Contratista / Municipalidad	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
Permiso de recolección de Desechos peligrosos (donde aplique)	Contratista / Municipalidad	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
Permiso de Sitio de Disposición Final (donde aplique)	Contratista	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
Permiso de Banco de Préstamo (donde aplique)	Contratista	Contratista / MINEDUCYT	Se tramitará en la Etapa de ejecución, antes de iniciar las obras	
[Otros]				

*Resolución Ambiental MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES

MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023
Teléfono: 2952-2122

San Salvador, 9 de junio de 2023.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de Permiso Ambiental.

Arquitecto
Herbert Alexander Armas Guerrero
Apoderado Especial Administrativo
Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Presente

Respetable arquitecto Armas Guerrero:

En atención a nota recibida en fecha 31 de mayo de 2023, con referencia DIE7HMRR7508/2023, en la cual solicita a este Ministerio emitir Permiso Ambiental, para el proyecto 7945 "Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador", en esta ocasión se presenta el Paquete 1, que consiste en 28 centros educativos, sus obras de mejora consisten en el mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas.

Habiendo revisado cada uno de los centros educativos; los cuales fueron adjuntados con su nota, tenemos a bien comunicarle que se considerará que el impacto potencial de los mismos será bajo y, conforme el Art. 22, inciso segundo del Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente (D.O. No.17, D.O. No.73, Tomo 347, 12/04/2000), no deben presentar documentación ambiental a este Ministerio los siguientes proyectos:

1. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "MARÍA SALAZAR VIUDA DE MAGAÑA", Código 10008, municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán.
2. ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE AHUACHAPÁN, Código 10047, municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán.
3. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "PRESBITERO MATÍAS ROMERO", Código 10196, municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana.
4. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE EL CONGO, Código 10286, municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
5. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "PROFESORA MARÍA ELVIRA SIFONTES" Código 10477, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.

Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, El Salvador,
Teléfono: (503) 2132-6276. Correo electrónico: medioambiente@marn.gob.sv, Sitio web: www.marn.gob.sv



MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023

6. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "DE ACAJUTLA", Código 10570, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate.
7. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "SAN RAFAEL", Código 10456, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.
8. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "YOLANDA RAMÍREZ DE DÍAZ", Código 10480, municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana.
9. ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ILOBASCO, Código 12155, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas.
10. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "GABRIELA MISTRAL", Código 12189, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas.
11. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA CANTÓN LOURDES, Código 11040, municipio de Colón, departamento de La Libertad.
12. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA CASERÍO LAS ARBOLEDAS, CANTÓN LOURDES, Código 68016, municipio de Colón, departamento de La Libertad.
13. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "JARDINES DE LA SABANA", Código 11112, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
14. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA EL ROSARIO, Código 11929, municipio de El Rosario, departamento de La Paz.
15. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA JULITA ALFONSO, Código 12034, municipio de San Rafael Obrajuelo, departamento de La Paz.
16. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE POPOTLÁN, Código 11322, municipio de Apopa, departamento de San Salvador.
17. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "PROFESORA BERTA ARLINA MOLINA", Código 11346, municipio de Apopa, departamento de San Salvador.
18. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO", Código 11502, municipio de San Martín, departamento de San Salvador.
19. COMPLEJO EDUCATIVO "DISTRITO ITALIA", Código 11741, municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador.
20. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "HUGO LINDO", Código 11357, municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador.
21. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "COLONIA SANTA LUCÍA", Código 11398, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.
22. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "COLONIA LAS BRISAS", Código 11722, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador.
23. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "SAN FRANCISCO GOTERA", Código 13264, municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán.
24. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "PROFESORA GRACIELA FLORES VIUDA DE GRIMALDI", Código 13077, municipio de San Miguel, departamento de San Miguel.
25. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "DE PUERTO EL TRIUNFO", Código 12656, municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután.
26. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "DE USULUTÁN", Código 12767, municipio de Usulután, departamento de Usulután.

Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: (503) 2132-6276. Correo electrónico: medioambiente@marn.gob.sv, Sitio web: www.marn.gob.sv



MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023

27. ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "ZACAMIL", Código 11429, municipio de Santiago de Mejicanos, departamento de San Salvador.
28. CENTRO ESCOLAR "JUANA LOPEZ", Código 11594, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Arg. Carlos Andrés Schonenberg Llach
Director General de Evaluación y
Cumplimiento Ambiental

MR/PC/GEA


MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023

ANEXO 1.

Listado de criterios que debe cumplir el proyecto: "Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador", para aplicar como actividad, obra o proyecto de impacto potencial BAJO, conforme el Art. 22 del Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente.

Sobre los criterios asociados a la conservación ambiental

- El sitio se encuentra fuera de un área natural protegida.
- El sitio se encuentra fuera de las áreas de manglar delimitadas por el MARN.
- El sitio del proyecto se encuentra en zonas donde la actividad es Permitida o Permitida con restricción. Se debe consultar los mapas de zonificación ambiental disponibles en el VIGEA.
- El proyecto se realiza fuera de la delimitación de humedales costeros y continentales (lagos y lagunas).
- El sitio se encuentra fuera de las siguientes delimitaciones:
 1. Bosque Caducifolios;
 2. Bosque Mixto;
 3. Bosque mixto semi caducifolios;
 4. Bosque Siempre Verdes;
 5. Bosques de Coníferas;
 6. Bosques de Galería (a orillas de ríos y quebradas);
 7. Café;
 8. Plantaciones de bosques monoespecíficos;
 9. Praderas Pantanosas;
 10. Sistemas Agroforestales;
 11. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua;
 12. Vegetación Arbustiva Costera;
 13. Zonas Ecotonaes.
- El sitio está ubicado a una distancia mayor de 500 metros del límite de un Área Natural Protegida o un bosque de mangle.
- El proyecto debe estar fuera de las zonas núcleo y/o de los corredores de conexión establecidos en los Planes de Manejo Sostenible de sitios RAMSAR o de Reserva de la Biosfera.
- El sitio del proyecto debe estar en un área con recarga baja (Menor a 200mm/año).
- El proyecto no afecta especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción, identificadas en el Acuerdo No.74 (MARN, 2015) u otro vigente.
- El proyecto no implicará la tala de árboles. Las actividades de poda y mantenimiento son permitidas.
- El proyecto se encuentra dentro de zonas con cobertura arbórea baja o media.

Sobre los criterios asociados a la condición del lugar

- El sitio se encuentra en sitios con susceptibilidad de inundación baja o moderada.
- El sitio se ubica en zonas con pendientes de 30 grados o menor. Puede estar en sitios susceptibles a deslizamientos, siempre que se adopten medidas de protección.
- El sitio debe estar fuera de las áreas que el MARN ha determinado que están sujetas a sufrir los efectos de flujos de escombros.
- El sitio debe estar ubicado a más de 50 metros de una quebrada (usualmente asociada a zonas de protección y restauración) *.

Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, colonia y calle Las Mercedes, edificios MARN, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: (503) 2132-6276. Correo electrónico: medioambiente@marn.gob.sv, Sitio web: www.marn.gob.sv



MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023

- El sitio debe estar a 100 metros de un río terciario*.
- El sitio debe estar a 250 metros o más de un río primario y/o secundario*.
- La restricción de separación o retiro de áreas de protección en ríos y quebradas (señalado arriba como **) solo aplica para construcción de edificaciones. No aplica para edificaciones existentes.
- El sitio debe estar fuera de áreas susceptibles a inundación por amenazas oceanográficas.

Sobre los criterios asociados a la etapa de construcción

- El proyecto tendrá un área menor a 10,000 metros cuadrados.
- La actividad no incluye el uso de explosivos.



4.7. Utilización de recursos naturales durante la fase operacional

Realizar esos cálculos y completar esta tabla será responsabilidad del contratista la actualización de esta información como parte del PMAS-C.

Tipo	Procedencia	U/M	Consumo Estimado	
			Construcción	Operación
Agua				
Energía eléctrica				
Forestales				
Otros (gas, leña natural)				

4.8. Acciones y medidas para la recuperación de pasivos ambientales

En el centro escolar no se encuentran pasivos ambientales que requieran recuperación, por lo tanto, no aplican acciones en este apartado.

En el centro escolar se procederá con la rehabilitación de los siguientes pasivos ambientales que podrían generarse a partir de las actividades del proyecto (ver fotos). Aunque estos no son generados por las actividades del proyecto, podrían considerarse como desechos del proceso de desmontaje/demolición. Las medidas de mitigación a aplicar durante la planificación y ejecución de las actividades de remediación se presentan en la siguiente tabla.

De ser el caso, en la Etapa de ejecución, el Contratista podrá añadir al listado de pasivos ambientales a recuperar con base en sus observaciones en el terreno y reflejar la información correspondiente al PGAS-C.

Tabla

No	Recuperación de pasivos ambientales	Actividades de mitigación
1		
2		

4.9. Reposición del Recurso Forestal

Para este centro escolar, dentro del proyecto propuesto y con base en las necesidades de rehabilitación observadas, no será necesaria la tala de ningún árbol de la zona, puesto que no hay árboles ubicados dentro del centro escolar, por lo tanto, no está contemplada la reposición del recurso forestal.

De ser el caso que se determina la necesidad de talar árboles en los alrededores del centro escolar, entonces el Contratista obtendrá el permiso de tala adicional y realizará la reforestación de acuerdo con los requisitos del MARN. También definirá la responsabilidad por garantizar la sostenibilidad de las actividades de reforestación.

4.10. Continuidad de las actividades educativas

En la Consulta Informativa se contó con la asistencia de la directora, personal docente y padres de familia que son los representantes del Consejo Directivo Escolar (CDE), quienes manifiestan estar de acuerdo con la implementación del Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa de los estudiantes; es por ello que las clases se realicen de manera presencial a través de la modalidad flexible que los directores de los CE en coordinación con el Director departamental decidan implementar.

En la consulta informativa, se les explicó a los asistentes sobre la implementación del Plan de Reubicación Temporal, se procedió a la lectura del acta y luego la directora y miembros del CDE procedieron a la firma del acta de reubicación temporal. Se adjunta acta y lista de firmas.

La identificación y análisis preliminar del sitio se realizó en coordinación con la comunidad educativa, garantizando condiciones de acceso universal y que cuenten con el mínimo de condiciones para el desarrollo de las actividades académicas y que faciliten la continuidad de las actividades educativas. Al momento se tienen identificado 1 sitio: Centro Escolar Colonia Las Brisas.

4.11. Procesos de participación de las partes interesadas.

Consulta informativa

Esta se realizó en las instalaciones de la Departamental de Educación de San Salvador, el día miércoles 19 de abril de 2023 a las 11:00 am. Se contó con la participación de 10 personas: 7 mujeres y 3 hombres. Entre ellos la directora de la escuela, docentes y madres de familia miembros del CDE. Esta se realizó de acuerdo con la siguiente agenda:

- Registro de participantes
- Bienvenida de parte de la directora del CE
- Presentación de personal técnico
- Presentación de obras a ejecutar
- Preguntas y respuestas
- Lectura y firma de acta informativa
- Lectura y firma de acta de reubicación temporal
- Refrigerio
- Agradecimientos

Desarrollo: presentación de las obras o actividades que contempla el proyecto de mejoramiento de la escuela, la cual fue desarrollada por personal de infraestructura del MINEDUCYT. Posteriormente se dio a conocer el mecanismo de quejas y reclamos, proporcionándoseles teléfonos y correos electrónicos para tal fin. Lectura y firma de acta de consulta informativa; lectura y firma de acta de Plan e Reubicación Temporal. Preguntas y respuestas

Algunas de las interrogantes que surgieron fueron las siguientes:

- ¿Cuándo iniciará la construcción?
- ¿Se debe buscar en este momento un lugar para alquilar y sacar las cosas de la escuela por la construcción?
- ¿Puede el MINEDUCYT cancelar alquiler por una vivienda?

Se dio respuesta a las preguntas explicando que la construcción está prevista para el último trimestre del año. Sobre la búsqueda de lugares para la reubicación, se les explicó que en este momento lo que se ha solicitado es que hagan un sondeo de tres lugares que reúnan condiciones para albergar a los estudiantes y personal docente. Sobre el pago del alquiler se dijo que el MINEDUCYT si va apoyar el alquiler del lugar donde se reubiquen los estudiantes y personal docente.

Las personas participantes también realizaron algunas sugerencias a la propuesta de construcción:

- Revisar el detalle del salón de usos múltiples para readecuarlo de sentido que no quede la pared vista.
- Quitar las gradas que se encuentran cerca de la dirección.

Sobre las sugerencias, el personal de infraestructura manifestó que tomarían en cuenta en el diseño propuesto.

Las personas participantes quedaron satisfechas con las respuestas y aprobaron las obras presentadas a realizar en el centro educativo.

A continuación, se presenta registro fotográfico del desarrollo de la consulta:



de las me

GENERIC

No.	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	U	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1	Generación de desechos sólidos producto de la etapa de pre-construcción.	Limpiar, recolectar y almacenar los escombros y residuos presentes en el sitio de obra y sus inmediaciones.				
2		Almacenar en sitios designados y adaptados para residuos, dentro de la obra, hasta ser transportados para su disposición final en sitios autorizados.				
3		Depositar los materiales no reciclables, residuos y desechos únicamente en el sitio autorizado, cuidando que no afecten los cuerpos de agua o vegetación presente en el sitio y evitar terrenos potencialmente inundables o cercanos a acuíferos superficiales.				
4		Gestionar y obtener los permisos y autorizaciones necesarias para el manejo y disposición final de los escombros, otorgados por la Alcaldía para este tipo de residuos, especialmente con residuos peligrosos.				
5		Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral que incluya aspectos de manejo, almacenamiento y disposición final de residuos de construcción que puedan contener materiales peligrosos (incluyendo asbestos, pintura, solventes, otros hidrocarburos); capacitar al personal participante en la obra para su aplicación y proporcionar el equipo de protección personal necesario. Este procedimiento deberá indicar la prohibición de quemar los desechos y residuos de la obra.				
6	Generación de desechos sólidos productos de la etapa de ejecución.	Identificar materiales reciclables de los residuos sólidos generados en la demolición de estructuras y sobrantes de materiales de construcción, entregar el material reutilizable a la delegación municipal o por las vías comerciales pertinentes, en función del tipo de residuo.				
		Asignar y utilizar un espacio en el sitio de obra para almacenar temporalmente la basura, debidamente señalizado y delimitado, para su				

No.	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	U	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
		posterior transporte al sitio de disposición final autorizado. Proveer depósitos.				
7		Realizar el almacenamiento temporal y la disposición final de todos los tipos de desechos únicamente en sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua.				
9		Trasladar material de desecho usando carpas que eviten la dispersión de los mismos.				
10		Supervisar a los transportes participantes en la obra y capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos y del Plan de manejo de tráfico vehicular				
11		Identificar la existencia de asbestos previamente a las actividades de demolición y evitar la mezcla de residuos de demolición con asbestos, que deberán ser almacenados y manejados como residuos peligrosos. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal adicional correspondiente (protección ocular y respiratoria).				
12	Generación de desechos peligrosos en la obra.	Desarrollar y aplicar un Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos que incluya específicamente la gestión de residuos peligrosos (residuos químicos y asbestos); y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. Proporcionar el equipo de protección personal necesario.				
13		Gestionar y almacenar temporalmente de forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que contienen materiales peligrosos (como asbesto o hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el medio ambiente ni para la salud y seguridad de los trabajadores.				
14	Generación de aguas	Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este				

No.	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	U	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
	residuales. (Excretas)	servicio en cuanto haya presencia de trabajadores en el sitio.				
15		Eliminar el agua de desechos de construcción a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible). Colocar contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolación de fluidos.				
16		Aplicar el procedimiento de atención y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames / vertidos para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua.				
17		Colocar la señalización de riesgos necesaria y los rótulos que indiquen el contenido de cada contenedor o recipiente a utilizar.				
18		Desarrollar y aplicar un Procedimiento de Seguridad y Salud Ocupacional, que incluya seguridad en el almacenamiento de materiales dentro de la obra. Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicación del procedimiento.				
19	Daño a la calidad del sitio de la obra en términos de salud y seguridad.	Asignar áreas específicas con delimitación y señalización, dentro del sitio de obra, y cubrir los materiales almacenados para prevenir la dispersión de sus residuos, así como la posibilidad de derrames sobre suelo desnudo.				
20		Las obras deberán contar con instalaciones provisionales o bodega para el almacenamiento adecuado de materiales de construcción como agregados, cemento, tuberías, madera, hierro, etc.				
21	Reducción de la calidad del aire en el sitio de la obra y terrenos cercanos.	Rociar agua en superficies secas donde se realizan excavaciones y movimiento de materiales, y en vías de circulación, para reducir la emisión de polvos por movimiento de materiales y por la erosión inducida por el viento.				
22		Proporcionar equipo de protección respiratoria a los trabajadores y capacitación para su uso				

No.	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	U	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
		adecuado durante actividades generadoras de polvo.				
23	Infiltración de residuos líquidos.	Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento.				
24		Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre				
25		Evitar la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, mezcla de concreto, combustibles y grasas en ríos o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán ser envasados y eliminados en el sitio autorizado para este fin.				
26		Dar mantenimiento continuo a los drenajes, aguas estancadas y barriles que contengan agua en el sitio de obra, para evitar la proliferación de vectores.				
27	Transferencia de contaminantes a partir de residuos de materiales de obra no utilizados.	Recuperar las zonas utilizadas para la mezcla de concreto, para reducir afectaciones al medio natural y paisajístico en la zona de obra				
28		Remover y transportar los materiales no utilizados durante la construcción y excedente de material (concreto, pintura, madera, tubería, etc.) a lugares previamente definidos para su almacenamiento o disposición final.				
29		Al finalizar la obra, se deberá limpiar y remover del terreno todo el equipo de construcción, material sobrante, desechos e instalaciones temporales.				

No.	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	U	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
30		Recuperar las zonas utilizadas como instalaciones provisionales, temporal, almacenamiento de material, sanitarios móviles (cada Sanitario portátil, se deberá dejar deposito con agua y jabón para manos), entre otros.				
31		Conformar, nivelar y revegetar las áreas verdes que fueron afectadas durante la ejecución de las obras.				
32	Manejo inadecuado de desechos peligrosos en la obra. PASIVOS AMBIENTALES	Desarrollar y aplicar un procedimiento para limpieza de letrinas y limpieza de suelos contaminados por letrinas rotas, que evite la transferencia de contaminantes hacia las aguas subterráneas y los suelos aledaños.				
33		Capacitar al personal participante en la obra para la aplicación de los procedimientos mencionados y proporcionar el equipo de protección personal necesario.				
TOTAL						

PRESUPUESTO GENÉRICO MEDIDAS SOCIALES

No.	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	U	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1	Explotación, abuso y acoso sexual.	Establecer y requerir que todo el personal del contratista que trabaje en el proyecto firme un Código de Ética (Código de conducta) para adecuarlo al comportamiento de los trabajadores con la comunidad, con base en el PGMO, y especialmente con relación al acoso sexual a niñas, niños y adolescentes u otras prácticas que pongan en riesgo el Proyecto, la imagen de este y la de las empresas Contratistas.				

No.	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	U	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
2		Capacitar, supervisar y aplicar sanciones a los trabajadores que incumplan el Código de Ética establecido desde el inicio del Proyecto.				
6	Daño a la integridad física de los trabajadores	Desarrollar un procedimiento de respuesta a emergencias que incluya la manera de proceder ante fenómenos climatológicos adversos como terremotos, incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros. Capacitar y supervisar a los trabajadores para aplicar dicho Procedimiento				
		Realizar charlas sobre la manera de proceder ante las amenazas naturales y/o antrópicas (respuesta ante fenómenos climatológicos adversos como terremotos, incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros).				
7		Desarrollar y aplicar Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencias, para cada uno de los subproyectos. Este procedimiento deberá considerar los posibles tipos de emergencias que podrán ocurrir en el sitio de obra específico.				
9		Capacitar al personal para la aplicación del Procedimiento de Respuesta a Emergencias				
10		Mantener un botiquín de primeros auxilios (según los requerimientos de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) dentro de la obra, para la atención de los trabajadores ante cortaduras, quemaduras o malestares generales.				
11		Planificar las actividades de la obra y anticipar efectos nocivos como los encharcamientos y la proliferación de vectores que suele estar asociada.				

No.	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	U	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
12		Capacitar a los trabajadores con relación al cuidado de su salud y el control de vectores en los frentes de trabajo.				
13		Proporcionar a los trabajadores de la obra equipo de seguridad para protegerlos de posibles accidentes. Equipos de protección personal, de acuerdo con el tipo de trabajo y riesgo asociado, como: mascarillas, guantes, protección auditiva, protector facial, entre otros, de acuerdo con el PGMO y según lo requerido por la normativa nacional.				
		Capacitar sobre el uso adecuado de equipo de protección para los trabajadores.				
14	Potenciales enfermedades del personal obrero y comunidad, incluyendo COVID 19.	Desarrollar y aplicar un procedimiento de respuesta y prevención de enfermedades infecciosas, y capacitar al personal para su aplicación.				
15		Asegurar la provisión de los insumos necesarios para la aplicación del procedimiento, como agua y jabón para el lavado de manos, alcohol en gel o equivalente, cubrebocas, sustancias sanitizantes para la limpieza de utensilios e instalaciones, etc.				
19	Evitar daños a terceros.	Tener disponible un sistema de gestión de quejas para poder gestionar cualquier preocupación que surja a nivel de la comunidad durante el ciclo del proyecto. Oficina de atención de quejas.				
20		Poner en prácticas medidas técnicas para evitar daños a terceros (viviendas de vecinos, medios de trabajo, campos deportivos, cementerios, patrimonios culturales), tales como ruido, polvo y otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. Y establecer medidas para reparar cualquier daño causado.				

No.	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	U	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
23	Interrupción del ciclo escolar	Desarrollar un Plan de Reubicación Temporal conforme el MRI del proyecto para organizar en consulta con la comunidad educativa el traslado de los estudiantes a sitios temporales donde podrán continuar cursando el ciclo escolar.				
24		Realizar la verificación de sitios de reubicación temporal (asegurando que los medios de transporte/distancia a los sitios de reubicación temporal son similares en costeo y tiempo), cuando la Dirección de Operaciones realice la entrega de sitio a la empresa. Asimismo, acompañar a la Comunidad Educativa en la Firma de Recepción del Centro Escolar para organizar el regreso a las instalaciones mejoradas.				
TOTAL						

Anexo 3 - Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT

LIBRO 30 1991 No. 22

198

TESTIMONIO
DE LA
ESCRITURA PUBLICA
DE
DONACION DE INMUEBLE

OTORGADA POR
COE, S.A. DE C.V.

A FAVOR DE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANAGO.

ANTE LOS OFICIOS DEL NOTARIO
Dr. Amílcar Orellana Hernández
SAN SALVADOR

EL SALVADOR, C. A.

TELEFONOS: { 240270
240371
240907


74-330

152

№ 0106201



Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros
MORENA GUADALUPE DIAZ MOLINA
ARQUITECTO
 Registro No. A-1197
 H.O.P. V.M.V.D.G. EL SALVADOR, C.A.



1 NUMERO VEINTIDOS.- En la ciudad de San Salvador, a las once horas del día dieci-
 2 siete de Julio de mil novecientos noventa y uno.- Ante mí, AMILCAR ORELLANA HER-
 3 NANDEZ, Notario, de este domicilio, comparece el señor SAMUEL ALVARO GUEVARA BAI-
 4 RES, de cuarenta y nueve años de edad, Ingeniero Civil, de este domicilio, a quien
 5 conozco, con Cédula de Identidad Personal número uno-uno-ciento cincuenta y siete
 6 mil cuatrocientos treinta y siete, actuando en nombre y representación en su cali-
 7 dad de Presidente de "COMPARIA EDIFICADORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE",
 8 que podrá abreviarse "COE, S.A. de C.V.", del domicilio de Mejicanos, con Tarjeta
 9 de Identificación Tributaria número cero seis uno cuatro guión dos tres cero cua-
 10 tro siete seis guión cero cero uno guión ocho, de cuya personería DOY FE de ser
 11 legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) la escritura pública de Cons-
 12 titución de dicha Sociedad, otorgada en esta ciudad a las dieciseis horas y quin-
 13 ce minutos del día veintitres de abril de mil novecientos setenta y seis, ante -
 14 los oficios de la Notario Delmy del Carmen Rodríguez, inscrita en el Registro de
 15 Comercio bajo el número SEIS del Libro CIENTO CINCO de Registro de Sociedades, en
 16 la que consta que su denominación es tal como se ha dicho, que su naturaleza es
 17 anónima de capital variable, que su plazo es indefinido a partir de la fecha de
 18 su inscripción en el Registro respectivo, que es de nacionalidad salvadoreña, que
 19 la representación judicial y extrajudicial y el uso de la firma social, correspon-
 20 de al Presidente de la Junta Directiva, quien está autorizado para otorgar actos
 21 como el presente y que los miembros de la Junta Directiva ejercerán sus funciones
 22
 23
 24

100 - 10 Dirección de Servicios Jurídicos

Nº 0106202

T.R. 0106388



1 por el término de cinco años; b) la escritura pública en que se acordó el cambio
 2 de domicilio de dicha sociedad, otorgada en esta ciudad, a las nueve horas y trece
 3 ta minutos del día treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y tres, an-
 4 te los oficios del Notario Guillermo Antonio Guevara Alfaro, inscrita en el Regis-
 5 tro de Comercio bajo el número TREINTA Y CINCO del Libro CUATROCIENTOS VEINTINUE-
 6 VE de Registro de Sociedades, en la que consta que el domicilio principal de la
 7 Sociedad es el de Mejicanos, pero que podrá abrir sucursales, oficinas y dependen-
 8 cias en cualquier otro lugar de la República o en el extranjero; y c) Certifica-
 9 ción del punto de Acta de la Sesión de Junta General celebrada por los socios el
 10 dieciseis de abril del corriente año, inscrita en el Registro de Comercio, bajo el
 11 número VEINTIUNO del Libro SETECIENTOS OCHENTA de Registro de Sociedades, en la
 12 que consta que por unanimidad fue electo Presidente el otorgante para un período
 13 de cinco años, a partir del dieciseis de abril del año actual. Y ME DICE: Que se-
 14 gún testimonio de escritura pública inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz
 15 e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, bajo el número DIECIOCHO del Libro
 16 TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES, de Propiedad, del departamento de San Salvador,
 17 su representada es dueña y actual poseedora del resto de un inmueble situado en
 18 el lugar denominado Joya de Chávez, jurisdicción de Soyapango, distrito y depar-
 19 tamento de San Salvador, habiendo tenido el inmueble general, una superficie de
 20 Ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos punto veinticinco metros cuadra-
 21 dos, equivalentes a Ciento diecinueve mil trescientas ochenta y nueve punto die-
 22 cisiete varas cuadradas, en el cual se desarrolló la Lotificación Sierra Morena,
 23 y por haberse vendido muchos lotes de la Urbanización Sierra Morena que se desa-
 24 rrolló en el inmueble antes citado, el resto que aún le queda a su representada,

Reparto Nacional de Arquitectura e Ingeniería
 MORENA GUADALUPE DIAZ MOLINA
 ARQUITECTA
 H. P. VALLEJO, S. SALVADOR, C.A.

154

y que se destinará a lote para zona verde y escuela de la citada Urbanización,

se describe así: Partiendo del esquinero Nor-Oeste de la Urbanización Sierra Morena Uno, que se encuentra ubicado sobre el Cordón de la calle Industrial Agrícola Venecia y Prusia, S.A. Este punto de partida está frente al lote ochocientos noventa y dos del Polígono Treinta de la Urbanización y a la orilla de una canal de descarga de aguas lluvias que ha construido al oriente de la colonia Las Brisas. Partiendo del esquinero Nor-Oeste de la Urbanización Sierra Morena Uno, con un rumbo Sur sesenta y siete grados veintitres punto siete minutos Este y una distancia de trescientos cinco punto cero cero metros, se llega a un punto donde con una deflexión a la derecha de noventa grados y con un rumbo Sur veintidos grados treinta y seis punto tres minutos Oeste y una distancia de noventa y nueve punto cero cero metros, se llega al esquinero Nor-Este o punto número Uno del terreno que se va a describir: AL ORIENTE, Partiendo del punto número Uno o esquinero Nor-Este del lote que se describe, con un rumbo Sur veintidos grados treinta y seis punto tres minutos Oeste y una distancia de treinta y dos punto cero cero metros, se llega al punto número Dos, lindando en este tramo con los lotes números ciento sesenta y cinco del Polígono número trece y números doscientos veintiseis, doscientos veintisiete y doscientos veintiocho del polígono número catorce con un área de estacionamiento vehicular de por medio, partiendo del punto número Dos con un rumbo Sur sesenta y siete grados veintitres punto siete minutos Este y una distancia de trece metros, se llega al punto número Tres, lindando en este tramo con la zona de estacionamiento vehicular de la urbanización, al final y en su costado sur, partiendo del punto número Tres, con un rumbo Sur veintidos grados treinta y seis punto tres minutos Oeste y una distancia de diez

Nº 0106203



T.R. 0106389



CIENTO TRES

metros se llega al punto número cuatro o esquinero Sur-Este del lote que se describe, lindando en este tramo con los lotes números doscientos veintinueve y doscientos treinta del polígono número catorce y con el pasaje número Trece de por medio de cinco metros de ancho; AL SUR, partiendo del punto número cuatro o esquinero Sur-Este, con un rumbo Norte sesenta y siete grados veintitres punto siete minutos Oeste y una distancia de doscientos cuarenta metros, se llega al punto número cinco o esquinero Sur-Oeste del lote que se describe, lindando en este tramo con el terreno de la zona verde que será donado por la empresa IBIS, S.A. DE C.V., para esta urbanización; AL OESTE, Partiendo del punto número cinco o esquinero Sur-Oeste, con un rumbo Norte veintiocho grados cero nueve punto dos minutos Oeste y una distancia de nueve metros, se llega al punto número seis, partiendo del punto número seis con un rumbo Norte treinta y un grados diecinueve punto cuatro minutos Oeste y una distancia de ocho metros noventa y tres centímetros se llega al punto número siete, partiendo del punto número siete con un rumbo Norte treinta y un grados cero ocho punto ocho minutos Oeste y una distancia de nueve metros se llega al punto número ocho, partiendo del punto número ocho con un rumbo Norte treinta grados cero cero punto un minuto Oeste y una distancia de once metros noventa y tres centímetros, se llega al punto número nueve, partiendo del punto número nueve con un rumbo norte veintinueve grados cincuenta y cinco punto seis minutos Oeste y una distancia de nueve metros veintinueve centímetros se llega al punto número diez, partiendo del punto número diez con un rumbo Norte veintisiete grados veintitres punto tres minutos Oeste y una distancia de cuatro metros veinte centímetros se llega al punto número Once o esquinero Nor-Oeste del terreno que se describe, lindando en todos estos tramos con cerco de púas de por medio

Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros
 MORENA GUADALUPE DIAZ MOLINA
 ARQUITECTO
 No. 1113
 San Salvador, El Salvador, C.A.

155

con terrenos propiedad de don Benjamín Escalón Núñez; Y AL NORTE, partiendo del
 punto número Once o esquinero Nor-Oeste, con un rumbo Sur sesenta y siete grados
 veintitres punto siete minutos Este y una distancia de veintiseis metros se lle-
 ga al punto número doce, lindando en este tramo con viviendas números novecientos
 veintiocho, novecientos veintinueve, novecientos treinta, novecientos treinta y
 uno y novecientos treinta y dos del polígono Treinta y Dos de la Urbanización, con
 el Pasaje número veintidos de dos punto cincuenta metros de ancho de por medio.-
 Partiendo del punto número doce y con un rumbo Norte veintidos grados treinta y
 seis punto tres minutos Este, y una distancia de ocho punto cincuenta metros se
 llega al punto número trece, lindando en este tramo con el lote número novecien-
 tos treinta y dos, final del pasaje número diecinueve de cinco punto cero cero -
 metros de ancho de por medio. Partiendo del punto número trece y con un rumbo Sur
 sesenta y siete grados veintitres punto siete minutos Este y una distancia de --
 doscientos treinta y ocho punto cero cero metros se llega al punto número uno o
 esquinero Nor-Este del lote que se describe, punto de partida de la presente des-
 cripción, lindando en este tramo con los rumbos Sur de los polígonos números vein-
 titres al veintinueve de la Urbanización, pasaje de acceso de por medio de cinco
 punto cero cero metros de ancho. Este terreno está afectado por una servidumbre
 de paso hasta el terreno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantari-
 llados, donde se construyó un tanque para agua potable, esta servidumbre es cono-
 cida en la Urbanización como acceso Senda vehicular y tiene una longitud de cua-
 renta punto cero cero metros de largo por cinco punto cero cero metros de ancho.
 El terreno así descrito tiene una extensión superficial de DIEZ MIL DOSCIENTOS
 PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS, equivalentes a CATORCE MIL QUINIENTAS NOVENTA.

T.R. 0106390



CUARENTA CENTAVOS



CIENTO CUATRO

que es de Doscientos punto cero cero metros cuadrados. Que con el lote donado --
antes descrito, el área total del inmueble ha quedado reducida a cero. Que de ma-
nera pura, simple, gratuita e irrevocable dona a la Alcaldía Municipal de la ciu-
dad de Soyapango, el lote de terreno ultimamente descrito, haciéndole en conse-
cuencia tradición del dominio, posesión y demás derechos que sobre dicho lote le
corresponden a su representada. Presente desde el inicio de esta escritura el se-
ñor GUSTAVO ADOLFO DURAN, de cuarenta y siete años de edad, Empleado, del domici-
lio de Soyapango, a quien conozco, con Cédula de Identidad Personal número uno-
cuatro-cero doce mil seiscientos uno, actuando en su calidad de Síndico Municipal
de la Alcaldía de Soyapango, con Tarjeta de Identificación Tributaria número ce-
ro seis uno siete guión cero uno cero seis uno uno guión cero cero uno guión ce-
ro, y en consecuencia como representante legal de la misma, DICE: Que acepta para
su representada la DONACION que por medio de este instrumento se le hace, dándose
por recibido del dominio, posesión y demás derechos que se le transfieren a su
representada. El señor Samuel Alvaro Guevara Baires, en el carácter en que actúa,
continúa diciendo: Que se da por notificado expresamente de la aceptación que por
medio de su representante hace la Donataria de la presente donación, que el lote
donado lo estima en CIENTO VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE COLONES CON TRES -
CENTAVOS, que la donataria no puede tener parentesco alguno con la sociedad donan-
te, y que en caso de arrendarse el lote donado produciría una renta anual de DIEZ
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO COLONES VEINTICINCO CENTAVOS. Ambos contratantes
agregan: Que la Sociedad donante está solvente de impuestos, y que la donataria -
por ser una Corporación Municipal está exenta de los mismos. No se agregará el re-

Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros
DIORNA GUADALUPE DIAZ MILA
ARQUITECTO
 Registrado No. A. 1107
 N.O.P. V.M.V.D.U. EL SALVADOR, C.A.

cibo en que conste haberse pagado el impuesto de transferencia de Bienes Raíces.

que cause este contrato porque la donataria está exenta de pago, haciendo constar el suscrito Notario que da fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor GUSTAVO ADOLFO DURAN, por haber tenido a la vista: a) Credencial expedida por el Consejo Central de Elecciones, a los diecisiete días del mes de abril del corriente año, firmada por los miembros de dicho Organismo, señores Jaime Francisco Romero Ventura, José Ricardo Perdomo, José Rutilio Aguilera C. y por el Secretario del mismo señor Justo Abarca Montesi, en la que consta -- que de acuerdo al escrutinio final de las elecciones celebradas el diez de marzo del corriente año, correspondientes al Consejo Municipal de Soyapango, el señor GUSTAVO ADOLFO DURAN, resultó electo Síndico Municipal de la ciudad de Soyapango; y b) Certificación expedida por el señor Alcalde Municipal José Vásquez Corena y el Secretario Municipal señor Clemente Saturnino Cuéllar R., en la Alcaldía Municipal de Soyapango, el día veintinueve de mayo del corriente año, en la que consta el punto de Acta número Dos de la Sesión Ordinaria celebrada por la Municipalidad de Soyapango, a las ocho horas y treinta minutos del día quince de mayo de mil novecientos noventa y uno, en la que se autorizó al compareciente para aceptar la presente donación y firmar la escritura correspondiente, certificación que se agregará a los anexos de mi Protocolo. Expliqué a los comparecientes los efectos legales de esta escritura y les advertí antes de su otorgamiento que para la inscripción de su testimonio en el Registro respectivo es necesario agregarle las solvencias fiscales correspondientes. Y leído que les hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto ininterrumpido, a presencia de los señores -- y de mi conocimiento --

--- SANTOS, de diecinueve años de edad, estu-

Nº 0106205

CIENTO CINCO



TD 0106301



CUARENTA CENTAVOS



1 diante; y MANUEL DE JESUS MARTINEZ LONIS, de treinta y nueve años de edad, Trac-
 2 torista; ambos de este domicilio, portadores de sus respectivas Cédulas de Iden-
 3 tidad Personal números uno-uno-doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cin-
 4 cuenta y uno, y uno-uno-ciento noventa mil noventa y nueve, testigos que han es-
 5 tado presentes desde el inicio de esta escritura, manifestaron que está redacta-
 6 do conforme a su voluntad, lo ratifican y firmamos juntamente con los testigos.
 7 DOY FE.-Enmendados:Que con el lote donado antes descrito el área total del inmue-
 8 ble ha quedado reducida a cero.-Valen- Más enmendados:diecisiete-partiendo-punto-
 9 Valen.-

10 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 11 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 12 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 13 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]
 Registro Nacional de Arrendatarios e Inquilinos
 MORENA GUADALUPE DIAZ L.
 ARQUITECTA
 R. D. P. No. 111
 W.D.P. V.M.V.D.U. EL SALVADOR, C.A.


SO ANTE MI, del folio del folio ciento uno vuelto al folio ciento cinco frente -
del LIBRO TREINTA DE MI PROTOCOLO que vence el tres de junio de mil novecientos
noventa y dos y para ser entregado a LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOYAPANGO, extien-
do, firmo y sello el presente testimonio, en la ciudad de San Salvador, a los die-
ciocho días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno.- Enmendado: noven-
ta-Vale.-

Reporte Nacional de Proyectos e Ingenieros
GORENA GUADALUPE DIAZ GARCIA
ARQUITECTO
T. 100.000 No. 111-1
M.P. V.B.V.O.U. EL SALVADOR, C.A.

УГ. АМИСОГ УГЕНАНО ПЕРМОНОВ

IBIS, S. A. DE C. V. *[Signature]*

RECIBIDO 2 AGO. 1991



SAN SALVADOR, 10. DE AGOSTO DE 1991

ALCALDIA MUNICIPAL
SOYAPANGO

ATENCIÓN: SR. GUSTAVO ADOLFO DURÁN
SINDICO MUNICIPAL

LE SALUDAMOS RESPETUOSAMENTE DESEANDOLE ÉXITOS EN SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
AL MISMO TIEMPO LE ENVIAMOS LA ESCRITURA ORIGINAL DE LA DONACIÓN DE LA -
ZONA VERDE DE LA URBANIZACIÓN SIERRA MORENA I, DE LA EMPRESA IBIS, S.A. -
DE C.V.

ESPERAMOS QUE CON ÉSTA DONACIÓN NUESTRA EMPRESA CONTRIBUIRÁ A DARLE MAYOR
REALCE AL ORNATO DE ESA ZONA.-

ATENTAMENTE,

POR: IBIS, S.A. DE C.V.

[Signature]
LIC. JOSÉ-DAGOBERTO HERNÁNDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO.-

4 – Información complementaria de Consulta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PROYECTO:

“CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”

MEMORIA DE CONSULTA INFORMATIVA

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA COLONIA LAS BRISAS

MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

CÓDIGO: 11722

SAN SALVADOR, MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2023

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto del proyecto: “Crecer y aprender juntos: desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador”, se implementaron las consultas informativas como parte del proceso metodológico que se lleva a cabo con el objetivo de contar con la participación de la comunidad educativa de escuelas de educación parvularia, centros escolares y educación especial en el país.

Es así que se desarrolló la consulta informativa el día miércoles 19 de abril de 2023 en la Departamental de Educación de San Salvador a las 11:00 a.m. de la mañana con el objetivo general de informar sobre los alcances del proyecto a desarrollar en la escuela.

Se realizó una exposición gráfica e ilustrativa de las mejoras que el proyecto realizará en la escuela. Así mismo se explicó el mecanismo de quejas y reclamos, plan de reubicación temporal, lectura y firma de acta de aceptación de obras a realizar y espacio para preguntas y dudas de los asistentes.

2. OBJETIVO GENERAL

- Informar sobre los alcances del proyecto y mecanismo de quejas y reclamos, y plan de reubicación temporal.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar de manera gráfica e ilustrativa las mejoras que se realizarán en la escuela.
- Explicar el mecanismo de quejas y reclamos que funcionara durante el proyecto a las personas participantes en la consulta.
- Aprobación de las obras a realizar en el centro educativo
- Aceptación de implementación de plan de plan de reubicación temporal
- Aclarar las dudas y preguntas sobre el proyecto de parte de las personas participantes en la consulta.

3. METODOLOGÍA

3.1. PARTICIPANTES IDENTIFICADOS PARA CONVOCATORIA A LA CONSULTA INFORMATIVA

En este apartado se desarrollan los diferentes procesos estratégicos llevados a cabo para la consulta informativa, lo que permitió planificar de forma acertada los diferentes momentos en los cuales se ha dividido dicha actividad, para lograr los objetivos propuestos.

La consulta informativa se centró en la presentación de los alcances que el proyecto contempla como mejorar de la escuela, dirigido a la comunidad educativa: padres y madres de familia, profesores y profesoras y director/a de la escuela. Los cuales se detallan a continuación:

Tabla 1. Listado de personas de la comunidad educativa convocadas

NÚMERO	CARGO
1	Directora
2	CDE
3	CDE
4	Docente

5	CDE
6	Gestora de PI Departamental de Educación de San Salvador

Fuente: elaboración propia con información de campo

Previo a la realización de la convocatoria de la consulta informativa, se estableció comunicación a través de llamada telefónica con la directora de la escuela con el objetivo de informar de la realización de la actividad para que se realizará la convocatoria de la comunidad educativa, especialmente madres/padres de familia y miembros del Concejo Directivo Escolar (CDE). Se acordó que se realizara la Consulta en la Departamental de Educación de San Salvador, el día miércoles 19 de abril

Una vez acordada la fecha, hora, y el lugar se procedió a la elaboración del material de apoyo para la consulta, así como coordinar los preparativos de la logística para la actividad como, por ejemplo: equipo de técnicos, transporte, refrigerios, entre otros.

Cabe señalar que se explicó sobre algunas medidas de bioseguridad a tomarse en cuenta durante el desarrollo de la consulta informativa: desinfección de manos y uso de mascarilla.

3.2 NIVEL DE PARTICIPACIÓN OBTENIDO

La consulta informativa inició a las 11:00 horas. Se contó con representantes CDE, madres de familia, profesoras y directora de la escuela. A continuación, se describe el proceso que permitió facilitar la socialización de los alcances del proyecto con las personas asistentes.

En la Tablas 2 se presenta la desagregación de participantes, por género.

Tabla 2. Asistencia a consulta informativa

PARTICIPANTES	CANTIDAD	PORCENTAJE
Hombres	3	30%
Mujeres	7	70%
Total	10	100

Fuente: elaboración propia a partir de las listas de asistencia.

La consulta informativa contó con una participación de diez personas, todas mujeres, profesoras y madres de familia.

Hay que destacar que la participación de las personas representantes del CDE le dieron veracidad, credibilidad y legalidad al proceso desarrollado por el equipo técnico del MINEDUCYT que asistió para facilitar la consulta.

En esta oportunidad se tuvo la representación de 3 profesoras, 6 madres de familia y la directora de la escuela.

3.3. PROCESO DE DESARROLLO DE CONSULTA INFORMATIVA

La agenda desarrollada en la consulta informativa se describe a continuación

1. Inscripción de participantes
2. Palabras de bienvenida de parte de la directora
3. Presentación de personal técnico MINEDUCYT
4. Presentación de actividades de obra a realizar
5. Mecanismo de quejas
6. Espacio para preguntas
7. Lectura y firma de acta informativa
8. Lectura y firma de acta de reubicación temporal
9. Refrigerio
10. Agradecimientos

3.3.1. Palabras de bienvenida

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Profesora María Cristina Reyes de Cruz directora de la escuela, quien agradeció a las personas participantes la asistencia y explicó brevemente que el objetivo de la consulta informativa era presentar las obras de mejora a desarrollar en la escuela.

3.3.2. Propósito y desarrollo de la consulta informativa

Como ya se explicó el propósito principal de la consulta informativa fue explicar los alcances del proyecto a desarrollar en el centro educativo. La exposición estuvo a cargo de la Arquitecto Alejandra Pérez, y en ella se explicó de manera amplia las diferentes mejoras que se realizarán en la escuela. Ver Figura 1.

3.3.3. Exposición de las actividades que contempla el proyecto

De manera general la exposición se dividió de la siguiente manera:

- i. Presentación de mapa de zonificación y detalles de las actividades constructivas
- ii. Explicación de mecanismo de quejas y reclamos

Cada uno de los apartados anteriores se explicaron utilizando un lenguaje comprensible, de tal manera que se facilitará la comprensión de las actividades que se han contemplado en el proyecto. Las cuales se mencionan a continuación:

- Construcción de salón de usos múltiples
- Construcción de aula de 3 metros.
- Construcción de cocina y bodega
- Cambio total de sanitarios
- Rehabilitación de toda la fachada
- Readecuación de tanque de agua

Del mecanismo de quejas y reclamos se explicó lo siguiente sobre las instancias donde podrán abocarse en cualquier situación que se presente durante la ejecución del proyecto:

- En este momento serán recibidas en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del MINEDUCYT. Ubicada en Nivel 1 del Edificio A1 del Plan Maestro (Centro de Gobierno), a los siguientes teléfonos: 25922009, 25922045 y 25922030.

Y al correo salve@mined.gob.sv y en las delegaciones o enlaces en las 14 Direcciones departamentales de Educación del país.

- Oficina de Información (OIR) del Ministerio de Obras Públicas y Transporte al siguiente teléfono: 25283218 o a la dirección electrónica oir@mop.gob.sv.
- Y cuando inicien las obras, podrán hacerlo con el Contratista, quien pondrá a disposición sus mecanismos de atención de quejas o solicitudes de información

3.3.4. Espacio para preguntas

Durante el desarrollo de la presentación de las actividades del proyecto, de acuerdo con la dinámica establecida, las personas participantes, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y aclarar todas las dudas que iban surgiendo. Dicha dinámica, permitió establecer una conversación horizontal entre el equipo técnico UIP – DIAE del MINEDUCYT y las personas, la cual resultó ser muy enriquecedora, puesto que se contestó y aclararon todas las dudas que surgieron.

Algunas de las interrogantes que surgieron fueron las siguientes:

- ¿Cuándo iniciará la construcción?
- ¿Se debe buscar en este momento un lugar para alquilar y sacar las cosas de la escuela por la construcción?
- ¿Puede el MINEDUCYT cancelar alquiler por una vivienda?

Se les dio respuesta a las preguntas explicando que la construcción está prevista para el último trimestre del año. Sobre la búsqueda de lugares para la reubicación, se les explicó que en este momento lo que se ha solicitado es que hagan un sondeo de tres lugares que reúnan condiciones para albergar a los estudiantes y personal docente. Sobre el pago del alquiler se dijo que el MINEDUCYT si va apoyar el alquiler del lugar donde se reubiquen los estudiantes y personal docente.

Las personas participantes también realizaron algunas sugerencias a la propuesta de construcción:

- Revisar el detalle del salón de usos múltiples para readecuarlo de sentido que no quede la pared vista.
- Quitar las gradas que se encuentran cerca de la dirección

Sobre las sugerencias, el personal de infraestructura manifestó que tomarían en cuenta en el diseño propuesto.

Las personas participantes quedaron satisfechas con las respuestas y aprobaron las obras presentadas a realizar en el centro educativo.

LISTADO DE PARTICIPANTES A CONSULTA INFORMATIVA

  				
LISTADO DE PARTICIPANTES				
ACTIVIDAD CONSULTA INFORMATIVA: REVISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN				
LUGAR: Oficina Ejecutiva de la Alcaldía de San Juan				
FECHA: Martes 14 de Abril de 2022				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	SEXO	LUGAR DE PARTICIPACIÓN	SEÑALA
1	María Celia Díaz de Cárdenas	F	San Juan de los Ríos	
2	Thelma Linares Ríos	F	San Juan de los Ríos	
3	María Linares Ríos	F	San Juan de los Ríos	
4	Don Manuel Linares Ríos	M	San Juan de los Ríos	
5	Carla Linares Ríos	F	San Juan de los Ríos	
6	Don Linares Ríos	M	San Juan de los Ríos	
7	Don Linares Ríos	M	San Juan de los Ríos	
8	Don Linares Ríos	M	San Juan de los Ríos	
9	Don Linares Ríos	M	San Juan de los Ríos	
10	Don Linares Ríos	M	San Juan de los Ríos	
11	Don Linares Ríos	M	San Juan de los Ríos	
12	Don Linares Ríos	M	San Juan de los Ríos	



Ministère de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Ministère de l'Éducation, du Sport et de la Jeunesse
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique

LISTE DES MEMBRES

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES : Services de S. (Séminaires, Cours, etc.)

Centre d'Éducation Supérieure de l'Université de la Nouvelle

Université (CÉSUS) - 1980-1981

N°	NOM ET PRÉNOM	SEXE	COULEUR DE CHEVEUX	COULEUR
1	André Desjardins	M	Noir/Noir (1980)	André
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

AGENDA DE LA CONSULTA INFORMATIVA


AGENDA DE LA CONSULTA INFORMATIVA

Fecha: Miércoles 19 de abril 2023

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Dirección Departamental de Educación San Salvador

- 1- Inscripción de participantes
- 2- Palabras de bienvenida de parte de la directora o director d la institución
- 3- Presentación de personal técnico UIP_DIAE MINEDUCYT
- 4- presentación de actividades de obra a realizar
- 5- Mecanismo de Quejas
- 6- Espacio de preguntas
- 7- Refrigerio
- 8- Agradecimiento



DECLARATION OF INTEREST

I, the undersigned, declare that I have no financial or other interest in the outcome of the research project.

I have read and understand the Declaration of Interest form and have signed it.

Signed: [Signature]



No.	NAME OF STUDENT	DATE	DECLARATION OF INTEREST	SIGNATURE	DATE
1	[Signature]				
2	[Signature]				
3	[Signature]				
4	[Signature]				
5	[Signature]				
6	[Signature]				
7	[Signature]				
8	[Signature]				
9	[Signature]				
10	[Signature]				



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ



Anexo 5 – Plan de Reubicación Temporal

PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA COLONIA LAS BRISAS CÓDIGO 11722

1. Necesidades de reubicación temporal

La descripción de las necesidades de reubicación temporal, son condicionantes de la selección, ya que nos orientan acerca de las características con las que deben contar los sitios. A continuación, los aspectos básicos a detallar.

La Escuela de Educación Parvularia Colonia Las Brisas cuenta con una población estudiantil, de acuerdo con la matrícula del año 2023, de 379 estudiantes: 198 niños y 181 niñas. Una planta docente de 13 maestros y maestras, 3 personas de mantenimiento, lo que hace un total de 395 personas a reubicar.

En la siguiente tabla se detalla los niveles educativos y cantidad de estudiantes por sexo que se atienden actualmente en la escuela.

Tabla 1 Cantidad de estudiantes desagregados por sexo

Niveles educativos	Sexo		
Grado	Masculino	Femenino	Total
Inicial 3	10	10	20
Sección A	12	12	24
Parvularia 4 años matutino	25	25	50
Sección A	36	26	62
Parvularia 5 años matutino	23	30	53
Sección A	27	30	57
Parvularia 6 años matutino	29	29	58
Sección A	29	33	62
Parvularia 4 años vespertino	19	20	39
Sección B	19	20	39
Parvularia 5 años vespertino	50	46	96
Sección B	50	46	96
Parvularia 6 años vespertino	30	32	62

Sección B	30	32	62
MATUTINO			181
VESPERTINO			197
Total			378
Cantidad de maestros, personal administrativo y de apoyo	9 docentes, directora		

En la tabla 2 se detalla cada uno de los espacios con los que actualmente cuenta la escuela, cabe mencionar que estos serán remodelados y adecuados a las condiciones de los niños y niñas con discapacidad que asisten a la escuela, lo cual obliga a que se busquen alternativas de sitios para la reubicación temporal.

Tabla 2 Espacios con los que cuenta el CE

Espacios	Cantidad
Aulas	Módulo “A” de 3 aulas y administración. Módulo “B” de 3 aulas. Módulo “C” consta de Servicios Sanitarios, 1 aula provisional y Salón de Usos Múltiples.
Cocina y comedor	1
Dirección	1
Bodega	1
Servicios sanitarios	6
Cancha	1
Área recreativa	1
Área verde	1
Área de espera	1

En la tabla 3 se mencionan los principales medios de transporte utilizados por los estudiantes y docentes que asisten a la escuela. La escuela se encuentra en una zona urbana o lo que facilita la movilidad de las personas y el acceso a los medios de transporte, por lo que muchos llegan caminado.

Tabla 3 Medios de transporte que utilizan los estudiantes

Transporte de movilización utilizado
Buses
Transporte privado

2. Los principios mínimos que deberán cumplirse en la planificación de la reubicación temporal

- La protección de la integridad y el interés superior de la niñez.
- Participación de las partes interesadas incluyendo directores, padres de familia, autoridades municipales y de orden público y la comunidad educativa en general, en la toma de decisiones y la implementación de la reubicación temporal, concretado en un acuerdo de reubicación y aceptación del PRT, la selección coordinada del sitio y cambios en horarios, modalidad de estudio y cualquier otro aspecto que conlleve cambios por la nueva situación. (Se tiene acta de reubicación temporal firmada por autoridades del centro educativo)
- Seguridad de los estudiantes y personal del CE, en el trayecto, el entorno y en el interior del sitio de reubicación, incluyendo en el acceso a servicios de alimentación, baños, entre otros. (se considerará en las readecuaciones en el sitio de reubicación seleccionado)
- Acceso universal (se considerará en las readecuaciones del sitio seleccionado)
- Continuidad de los servicios que se tenían en el CE incluyendo condiciones mínimas para que el personal pueda cumplir sus labores (Este aspecto será en coordinación con directora y director departamental)
- Que no genere un incremento significativo en tiempo y costos para los padres de familia. (se cuenta con 3 alternativas de reubicación, al momento de realizar las visitas a dichos sitios, se seleccionará la que cumpla las condiciones más idóneas para la población estudiantil)

3. Identificación Preliminar de Sitios y Ficha de Diagnóstico Rápido

La identificación y análisis preliminar de sitios se realizará en coordinación con la comunidad educativa. Si no existen sitios identificados, identificar (opciones de sitios y las medidas que se deberían tomar para adecuarlos). Por ejemplo, contratos de alquiler, adecuaciones de infraestructura, acuerdos con entidades públicas o privadas, como se ejemplifica en la siguiente ficha.

El proceso de selección de terrenos o edificaciones incluye Diagnóstico Rápido que incluya, los datos que se sugieren a continuación, para conocer la situación de viabilidad del terreno para el uso que se espera.

Para la reubicación de temporal de los estudiantes y personal docente de la Escuela de Educación Parvularia Colonia Las Brisas se han identificado preliminarmente el siguiente lugar: Centro Escolar Colonia Las Brisas. En la siguiente tabla se hace una descripción del sitio:

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DEL SITIO #: 1

Identificación del sitio:	Centro Escolar Colonia Las Brisas			
Responsable de las instalaciones (propietario, administrador)	Nombre: Eliezar Brisas Teléfono: 22973424			
Características básicas del sitio	SI	NO	Requiere mejoras u otras medidas	Observaciones y requisitos para adaptaciones o mejoras
Ubicado en un sector seguro	✓			El centro escolar se encuentra a unos 300 metros de la escuela parvularia.
Las instalaciones están libres de conflictos de tenencia	✓			El centro escolar le pertenece al MINEDUCYT.
Requiere un contrato de alquiler u otro arreglo formal	✓			Se hablará con el director departamental y el director del centro escolar para un acuerdo en cuanto al uso de las instalaciones.
El sitio es accesible durante los periodos de lluvia y sequía.	✓			El sitio es accesible.
El sitio presenta condiciones físicas seguras para uso de los estudiantes.	✓			Al tratarse de un centro escolar reúne las condiciones necesarias para la atención de estudiantes.
El sitio es fácilmente accesible para los estudiantes, de manera que llegar no signifique un esfuerzo adicional significativo al que hacían con el sitio anterior.	✓			El centro escolar se encuentra en la misma zona donde se encuentra la escuela, por lo que no se incurrirá en otros gastos de transporte.
Instalaciones suficientemente amplias para albergar a todos los estudiantes	✓			El centro escolar permite albergar a todos los estudiantes y personal docente y administrativo.
Instalaciones ventiladas y con luz natural	✓			El centro escolar cuenta con ventilación e iluminación natural.
Cuenta con agua potable	✓			El centro escolar cuenta con agua potable.
Cuenta con energía eléctrica	✓			El centro escolar cuenta con energía eléctrica.
Estructura en buen estado	✓			El centro escolar se encuentra en buen estado.

				Sin embargo, la pintura del local necesita una renovación.
Hay servicios sanitarios	✓			Los servicios sanitarios se encuentran en buen estado.
Las instalaciones están libres de problemas de inundaciones	✓			El centro escolar está libre de problemas de inundaciones.

4. Identificación preliminar de trámites necesarios:

En caso de que el sitio a reubicarse requiera de remodelaciones, se debe identificar si se necesita gestionar permisos y otros trámites, tales como: permisos ambientales y permisos de construcción y operación (de la municipalidad, de ser requerido), autorización para uso del terreno e identificación de impactos en el uso del terreno, pago de alquiler, salud y seguridad ocupacional y de la comunidad (seguridad durante la construcción), gestión adecuada de desechos sólidos, buen manejo de los residuos líquidos, otros permisos aplicables (uso y vertimiento de agua, desbroce o tala de árboles, entre otros).

Si este local fuera seleccionado, no se presenta ningún problema de permisos ya que es una sala de eventos que cuenta con todos los permisos necesarios. Además, en las visitas de identificación In situ que se realicen se podrán identificar otros aspectos que en este momento no se tienen contemplados.

El MINEDUCYT es responsable de los trámites correspondientes como titular del subproyecto, así como el pago de multas, impuestos y trámites.

5. Responsabilidades para el desarrollo del PRT

Acción	Responsable (s)
Confirmación de las necesidades de continuidad educativa	Directora del CE y director departamental
Identificación y evaluación de sitios y necesidades para cada sitio.	Directora del CE y director departamental
Consulta y participación de la comunidad y autoridades municipales	En la consulta informativa realizada en el CE, se les explico la necesidad de reubicación de estudiantes, docentes y personal administrativo y se levantó un acta de aceptación de los participantes en que las clases continúen de manera presencial y sean reubicados.
Desarrollo del documento del PRT	En este momento no se cuentan con todos los insumos e los sitios de reubicación, pero las readecuaciones serán responsabilidad del contratista (ya se cuenta con un monto estimado para la readecuación, arrendamiento y pago de servicios básicos)
Aprobación del documento del PRT	El MINEDUCYT aprobará el documento del PRT

Acompañamiento en la reubicación temporal	El MINEDUCYT dará acompañamiento en todas las actividades de readecuación.
Monitoreo	MINEDUCYT, dará seguimiento y monitoreo al proceso
Acompañamiento en la transición a espacios permanentes	MINEDUCYT brindara acompañamiento del regreso al CE

6. Cronograma para el desarrollo del PRT.

Un cronograma para el desarrollo del plan – Deberá estar alineado al cronograma de la obra para asegurar que sea finalizado, aprobado por MINEDUCYT con base en los requisitos de este PGAS e implementado (arreglos a sitios temporales realizados, espacios listos para recibir estudiantes y empezar actividades) antes del inicio de cualquier actividad que afecte el uso seguro de los espacios.

Actividad	Cronograma
Consulta inicial a los Directores, personal docente y padres de familia sobre el PRT	Previo a la licitación
Identificación de los sitios con potencial de acuerdo a la descripción de necesidades y los criterios de la guía	Previo a la licitación
Identificación preliminar de costos	Previo a la licitación
Selección final de los sitios en coordinación con las partes interesadas	
Desarrollo del documento del PRT	Antes de la orden de inicio al contratista
Aprobación del PRT por parte de MINEDUCYT	Antes de la orden de inicio al contratista
Firma de acuerdo, contrato u otro con propietario o administrador del sitio	Antes del inicio de las obras del subproyecto
Trámites de permisos, licencias, etc.	Antes del inicio de las obras del subproyecto
Ejecución de mejoras o remodelaciones	Conforme el cronograma del PRT específico. Antes del inicio de las obras del subproyecto
Traslado de equipos y materiales	Conforme el cronograma del PRT específico. Antes del inicio de las obras del subproyecto
Funcionamiento del ciclo escolar en sitio reubicado	Conforme el cronograma del PRT específico y las necesidades educativas. Durante la ejecución de la obra
Traslado de equipos y materiales al CE rehabilitado del subproyecto	Conforme el cronograma del PRT específico y las necesidades educativas. Durante la ejecución de la obra
Traslado de los estudiantes y personal al CE del subproyecto	Conforme el cronograma del PRT específico y las necesidades educativas. Durante la ejecución de la obra

7. Identificación preliminar de costos

La directora y director departamental han identificado un sitio posible de reubicación: Centro Escolar Colonia Las Brisas.

En este momento se tienen montos generales para el desarrollo de las actividades que conlleva el plan de reubicación temporal, los cuales se detallan a continuación:

- 1- Monto de \$8,500, para la readecuación del sitio seleccionado: como por ejemplo divisiones internas, accesos universales, servicios sanitarios provisionales, depósitos para desechos sólidos entre otros.
- 2- Monto de \$ 3,000; para arrendamiento y servicios básicos (pago de energía eléctrica, agua potable, etc.)

8. Planificación para el retorno a la estructura rehabilitada

Para el retorno de los estudiantes a los sitios permanentes, MINEDUCYT en coordinación con el director del plantel y otros actores clave según sea necesario, garantizará los siguientes principios para el retorno a las estructuras permanentes:

- Que el acceso a los sitios nuevos o rehabilitados no requieran la circulación de los estudiantes por la zona de la obra, incluso para acceder a los baños o cualquier otro espacio previsiblemente necesario.
- Que exista una evaluación de los espacios de clases y de circulación de los estudiantes para asegurar que estén libres de peligros para los estudiantes.
- Garantizar que los accesos a la obra se encuentren debidamente cerrados y monitoreados, en caso de que el regreso se realice en fases.
- Que los espacios nuevos en los cuales los estudiantes reciban clases estén libres de polvo, ruido y vibraciones.
- Que todos los permisos necesarios e inspecciones, por ejemplo: eléctricas, de bomberos, etc. se hayan realizado para las estructuras nuevas antes de que los estudiantes retornen a ellas.

Anexo 6 - Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista

En el Manual de Procedimientos de Gestión de mano de obra (PGMO), se encuentran establecidas todas las medidas que se deben de implementar en todos los subproyectos a ejecutar. Es una guía que permite la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales, específicamente el Estándar 2, el cual se denomina “Trabajo y Condiciones Laborales” ampliado en el Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial (BM), reconociendo en dicho documento, la importancia de la creación del empleo decente, inclusivo e igualitario, que equipare oportunidades para todo tipo de grupos y poblacionales, buscando el incremento de la productividad desde la inversión para estimular la economía de las familias que se encuentran dentro y fuera del área del proyecto. Pero promoviendo las relaciones laborales, en la que no se pueden contratar niños menores de edad y armonizando las relaciones entre el empleado y el empleador.

El Ministerio de Educación y Tecnología Educativa por medio de la Unidad Implementadora de Proyectos las empresas implementadoras que participen en las actividades de construcción se comprometan a:

- Promover la Salud y Seguridad Ocupacional
- Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para trabajadores del Proyecto.
- Proteger a todos los trabajadores del Proyecto, incluidos los trabajadores vulnerables como: mujeres, personas con discapacidades, niñez e incluso trabajadores migrantes.
- Impedir todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil
- Brindar a todos los trabajadores del proyecto, medios accesibles para plantear inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo.

Además, se incluye el Normativo de Conducta, mediante el cual todos los trabajadores que sean contratados al momento de la ejecución de las obras puedan firmar y comprometerse a que se deberán de regir por este.

Es importante también que al momento de la contratación de la mano de obra se consideren los riesgos relacionados a Discriminación racial, étnica, lingüística, orientación sexual y violencia de género, entre otros, Trabajo forzado, Trabajo infantil, Violencia de género, Acoso, abuso y explotación sexual, Desigualdad de Oportunidades y Riesgo de Exclusión, Vulneración a la Libertad Sindical, Desnaturalización de contrato, Riesgo de violencia por pandillas, Uso, consumo, venta o posesión de drogas, Riesgo de Inseguridad Social, Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional durante las Obras Civiles de Construcción. Todos estos aspectos, se detallan en el PGM. Además, se incluye un mecanismo de atención de quejas y reclamos para los trabajadores, en la ejecución de los proyectos; con el objetivo de garantizar procesos transparentes y oportunos, y que permita que los trabajadores manifiesten sus inquietudes sobre los contratos, las medidas de seguridad, entre otras. (Ver Anexo 6 del PGM, CÓDIGOS DE CONDUCTA ESTÁNDAR PARA TRABAJADORES DIRECTOS Y DEL CONTRATISTA)

A continuación, se incluye modelo de Normas de Conducta para cumplimiento por los contratistas y todos los trabajadores.

Somos el Contratista, [ingrese el nombre del Contratista]. Hemos firmado un contrato con [ingrese el nombre del Contratante] para [ingrese la descripción de las Obras]. Estas Obras se llevarán a cabo en [ingrese el Lugar de las Obras y a otros lugares donde se ejecutarán las Obras]. Nuestro Contrato requiere que adoptemos medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales relacionados con las Obras, incluidos los riesgos de explotación sexual y agresión y violencia de género.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos ambientales y sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal, trabajadores y otros empleados en el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se llevan a cabo. También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos ayude en la ejecución de las Obras. Todas esas personas se denominan "Personal del Contratista" y están sujetas a estas Normas de Conducta.

Estas Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del Contratista. Son de estricto cumplimiento y están dirigidas al personal laboral involucrado en la ejecución de las obras (contratista, subcontratistas, obreros). Estas normas se establecen con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia Ambiental, Social, Salud y Seguridad Laboral, bajo el marco de la legislación nacional/ regional y acorde a los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerará el comportamiento inseguro, ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear problemas o inquietudes sin temor a represalias.

Las Normas serán socializadas y serán del entero conocimiento del personal que labora para la empresa contratista. Los trabajadores deberán ser capacitados y advertidos sobre las sanciones al incurrir en alguna falta a las presentes normas.

El contrato de trabajo a realizarse bilateralmente entre el MINED y la Empresa adjudicada deberá hacer referencia al conocimiento de las Normas de Conducta para los Trabajadores (NCT), para que, a la firma de este, se den por entendidos de que conocen las Normas y que su aplicación y cumplimiento es contractual para cada individuo perteneciente a la empresa.

CONDUCTA REQUERIDA

El Personal contratado por el contratista para trabajar en el proyecto deberá:

- 1. Desempeñar sus funciones de manera competente y diligente;*
- 2. Cumplir con este Código de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del personal de otro contratista y de cualquier otra persona;*
- 3. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:*
 - a) asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud;*
 - b) respetar todas las instrucciones de trabajo, la señalización en la obra y usar el equipo de protección personal requerido;*
 - c) utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos;*
y
 - d) seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.*
- 4. Informar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguras o saludables y retirarse de una situación laboral que él / ella razonablemente cree que presenta un peligro inminente y grave para su vida o salud;*
- 5. Tomar medidas de higiene y de prevención de enfermedades. Evitar la acumulación de charcos de agua y tapar recipientes que almacenen agua.*
- 6. Adoptar medidas de ahorro de recursos como: el agua y la energía, así como evitar la pérdida de materiales por falta de protección o por derroche de los mismos.*

7. *Estar enterado de que el uso de sustancias ilegales en el interior de la obra es inadmisibile. Igualmente, el consumo de alcohol u otras sustancias que alteren el comportamiento de las personas. Así mismo se dejará en claro que está prohibido el ingreso de armas de fuego y/o corto punzantes a la obra.*
8. *Manejar que el robo de materiales, equipos o cualquier cosa dentro de la obra, será seriamente sancionado, este tipo de comportamiento es inaceptable. Se debe hacer un llamado a mantener valores y buenas costumbres en el equipo de trabajo. Igualmente, acciones de vandalismo por parte de la comunidad deben ser denunciados ante las autoridades correspondientes, a fin de mantener el orden y bien andanza de la obra.*
9. *No deberá realizar conexiones temporales a la red eléctrica del alojamiento de trabajadores y/o bodega, ni ninguna otra parte de la obra, sin que estas estén debidamente autorizadas.*
10. *Mantener el respeto hacia las personas, su cultura, su idioma, su origen de nacimiento, género, discapacidad, sus creencias religiosas o políticas. Las actitudes de discriminación entre los trabajadores deben ser motivo de llamado de atención.*
11. *Mantener comunicación con la comunidad, mostrando respeto en todo momento y atendiendo las inquietudes o consultas que esta tenga, sin discriminar a la población por su condición, nivel educativo o su nivel económico. Deberán tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos específicos como mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o niños.*
12. *Mantener en todo momento respeto para dirigirse a la población en general, y en especial, a las niñas y niños, mujeres y ancianos de la comunidad. Evitando expresar palabras soeces, gestos con referencia sexual, piropos y/o toqueteos.*
13. *No participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza sexual con el personal de otras instituciones o del MINEDUCYT.*
14. *No participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento de abuso de posición vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales, que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o político de la explotación sexual de otro.*
15. *No participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusión física real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas.*

16. *No participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, excepto en caso de matrimonio preexistente.*
17. *Completar cursos de capacitación relevantes que se brindarán en relación con los aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, y Explotación y Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASx);*
18. *Deberán tener especial cuidado en la comunicación con las comunidades indígenas y afrodescendientes, respetando a las autoridades locales o líderes comunales, la cultura, idioma y formas de vida. Se debe tener especial cuidado en respetar objetos y sitios sagrados, templos u otros de índole religiosos, evitar tomar fotografías sin autorización, evitar dañar bosques, ríos o sitios protegidos por las comunidades.*
19. *Estar enterados que las actitudes de violencia en la obra o sitios de alojamiento de personal serán sancionadas. Manejar que se les podrá destituir de su cargo en caso de mal comportamiento como: propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género, actividades ilegales o criminales.*
20. *No permitir el acceso de menores de edad a las obras. Igualmente, No permitir el acceso de personal no autorizado en la obra. Las visitas deberán ser aprobadas por los supervisores de obra, los visitantes deberán portar cascos, chalecos y zapatos cerrados para poder acceder a la obra.*
21. *Mantener la limpieza en los servicios sanitarios. No se permitirá realizar evacuaciones fisiológicas, fuera de las instalaciones sanitarias proporcionadas por la empresa.*
22. *Deberá proteger y hacer uso adecuado de la propiedad, no quemar basura o cazar animales silvestres, no derramar sustancias contaminantes, no cortar árboles que estén fuera del permiso forestal, no dañar áreas que no serán intervenidas por el proyecto.*
23. *Denunciar el no cumplimiento del Código de Conducta, ya que no se tomarán represalias en este sentido. El incumplimiento deberá ser reportado al Ingeniero Residente o Equivalente de la empresa contratista, el cual procederá a verificar la denuncia para aplicar las acciones correctivas necesarias.*

CONSECUENCIAS DE VIOLAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA

Cualquier violación de este Código de Conducta por parte del Personal del Contratista puede resultar en consecuencias graves, hasta e incluyendo la terminación y posible remisión a las autoridades legales.

Las Normas deben ser monitoreadas y su cumplimiento deberá ser reportado por el Ingeniero Residente de la Empresa Contratista, a la Gerencia del proyecto de la empresa contratista, al Supervisor de Obras Residente-MINEDUCYT y a la Gerencia del proyecto por parte del MINEDUCYT.

El Contratista deberá asegurar:

- Que cada trabajador reciba una copia de este Código de Conducta.
- Que al trabajador se le capacite en la aplicación de este Código de Conducta.
- Que el trabajador reconozca que el cumplimiento del Código de Conducta es obligatorio y que es un requisito para obtener el trabajo.

Que el trabajador reconozca que el incumplimiento del Código de Conducta puede causar su despido o inclusive acusación ante autoridades legales.

¹ PGAS C Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista
